


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

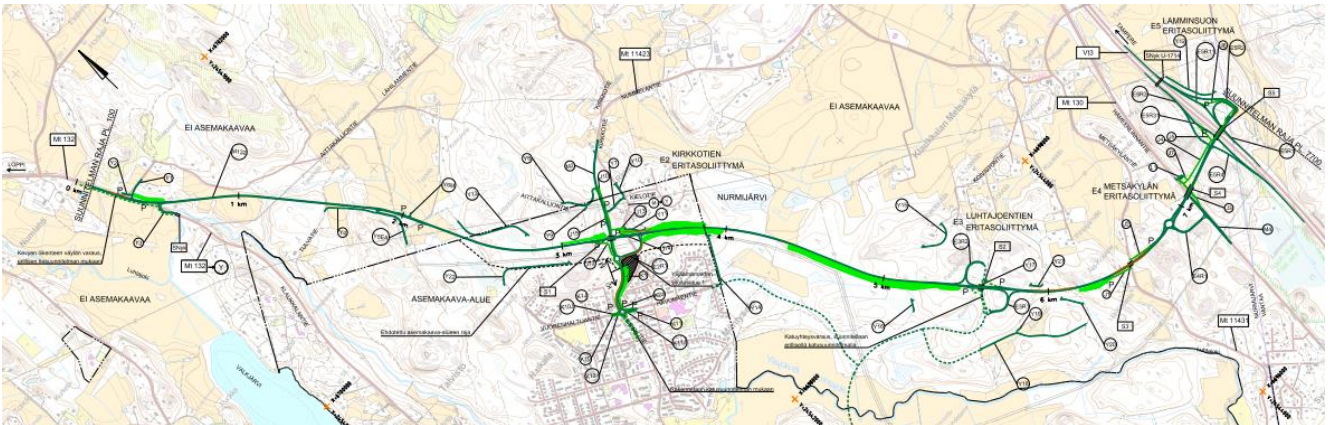

Kuukausiraportti nro 3/2018
Tarkastelujakso: 1.7.2018 - 31.7.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

3.8.2018

1 Hankkeen yleiskatsaus

STk-urakka on laskennassa. Lisäkirje 3 lähetetty tarjoajille 5.7.2018.

Pohjavesiputkien seurantamittauksia on suoritettu heinäkuussa. Seurantamittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

2 Aikataulu

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe käynnistyy lokakuussa ja päätty marraskuussa 2018. Rakennustyöt päästään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Kilpailutuksen ja urakan suunniteltu aikataulu:

- Tarjouksien sisäänjätö on 3.9.2018.
- Kehitysyöpajat tarjoajille järjestetään 4.9.2018 Pasilassa.
- Hankintapäätös 14.9.2018 mennessä.
- Kehitysvaihe loka-marraskuu 2018
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuun 2018

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen.

3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.7.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	999 516,00 €	312 356,97 €	1 311 872,97 €
	Toteutuneet kustannukset	336 987,38 €	105 646,05 €	442 633,43 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 42 M€.

3.8.2018

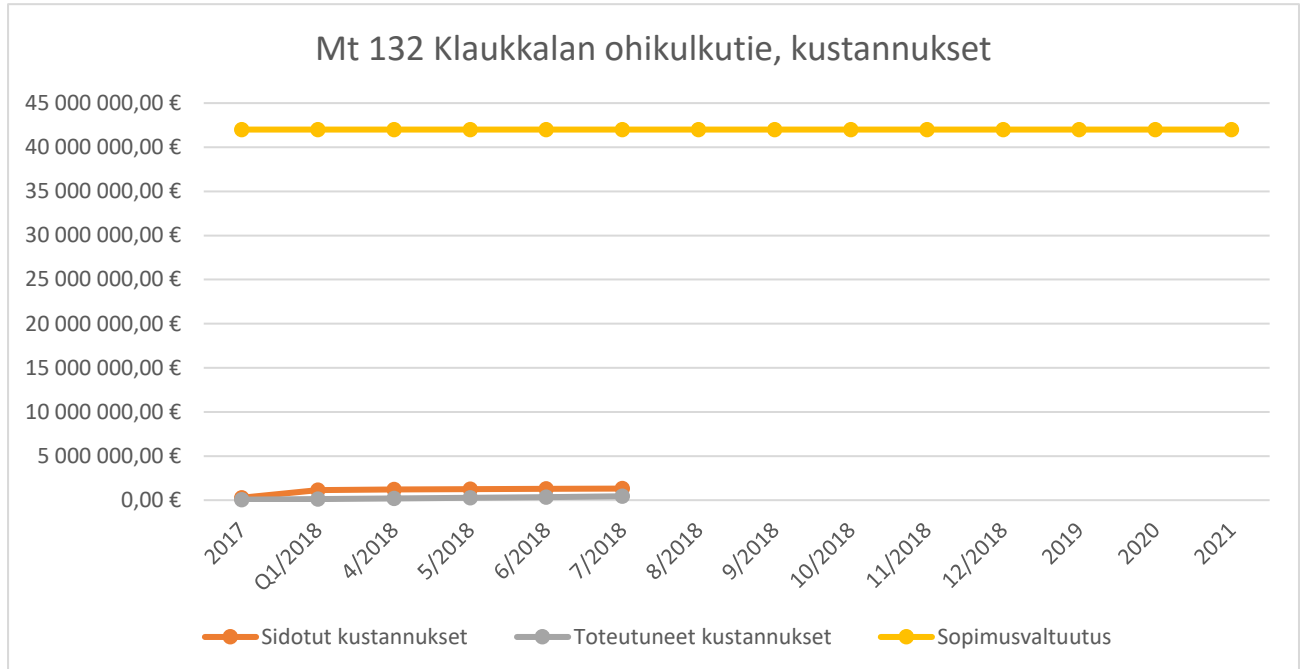

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 7/2018

4 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
