


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

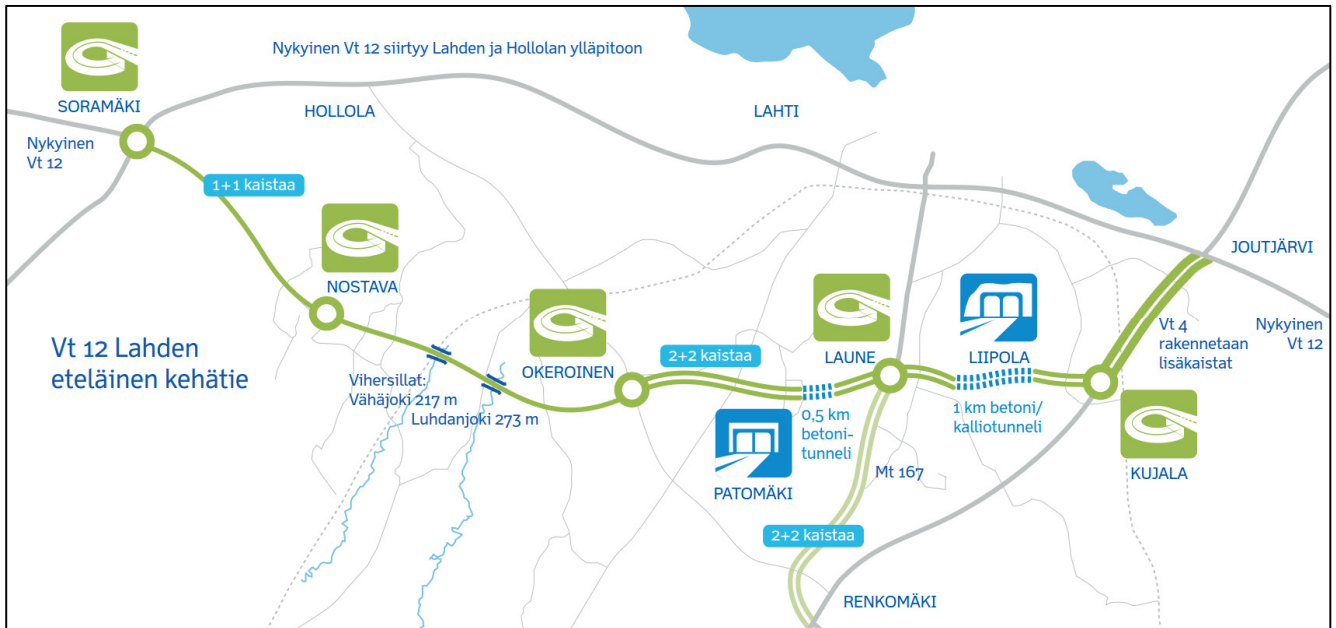

Kuukausiraportti nro 8/2017
Tarkastelujakso: 1.8.2017 - 31.8.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

4.9.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Vt12 Letke, osa 1A ST, lisäkirje 3 lähetetty 18.8.2017
- Vt12 Letke, osa 1A ST, lisäkirje 4 lähetetty 22.8.2017
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, Big Roomin rakentaminen ja KAS-vaiheen käynnistäminen
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, sillan S24 paalutus-työt
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, sillan S1 kiertotie otettu käyttöön 31.8.2017

Tulevat tapahtumat:

- Vt12 Letke, osa 1A ST, lisäkirje 5 lähetetään viikolla 36
- Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjousaikaa jatkettu 19.10.2017 klo 13.00 asti

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus

Tilaaaja: Työpanos 2 henkilötyökuukautta (htkk)
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4 htkk

Hankeosa 1A Urakoitsijat:	Henkilöstövahvuus
Hankeosa 1B Urakoitsijat:	Henkilöstövahvuus
Taratest Oy	7 henkilöä
VALTARI: Skanska Pöyry	10 htkk 40 htkk
Hankeosa 2: Urakoitsijat:	Resurssivahvuus
Suomen Maastorakentajat Oy	34 henkilöä, joista Lahden seudulta 16 henkilöä

Hankeosa 1A ST-Hollola

ST-urakka on kilpailutuksessa. Lisäkirje 3 on lähetetty 18.8.2017 ja lisäkirje 4 on lähetetty 22.8.2017.

4.9.2017

Urakkalaskenta aikaa on päätetty jatkaa ja ennakoilmoitus tarjousajan jatkamisesta on annettu 28.8.2017. Tarjousten jättämisen uusi määräaika on 19.10.2017 klo 13.00 mennessä.

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Täydentävien pohjatutkimusten työt maastossa ovat valmistuneet 31.8.2017. Pohjatutkimustyöt jatkuvat VALTARI:n pohjatutkimusohjelmalla.

Allianssin Big Roomin rakentaminen ja KAS-vaiheen käynnistäminen.

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituksen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat mm. siltojen S1, S3 ja S9 valmistelevat työt, johtosiirrot ja S24 paalutus-työt.

Kiertotie K1 otettu käyttöön 31.8.2017.



Kuva 1. Kiertotie K1

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjousaikaa on jatkettu 19.10.2017 asti.

4.9.2017


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.8.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	20 051 080,52 €	7 017 878,18 €	779 764,24 €	27 848 722,94 €
Toteutuneet kustannukset	1 952 325,85 €	668 665,81 €	75 011,72 €	2 696 003,38 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

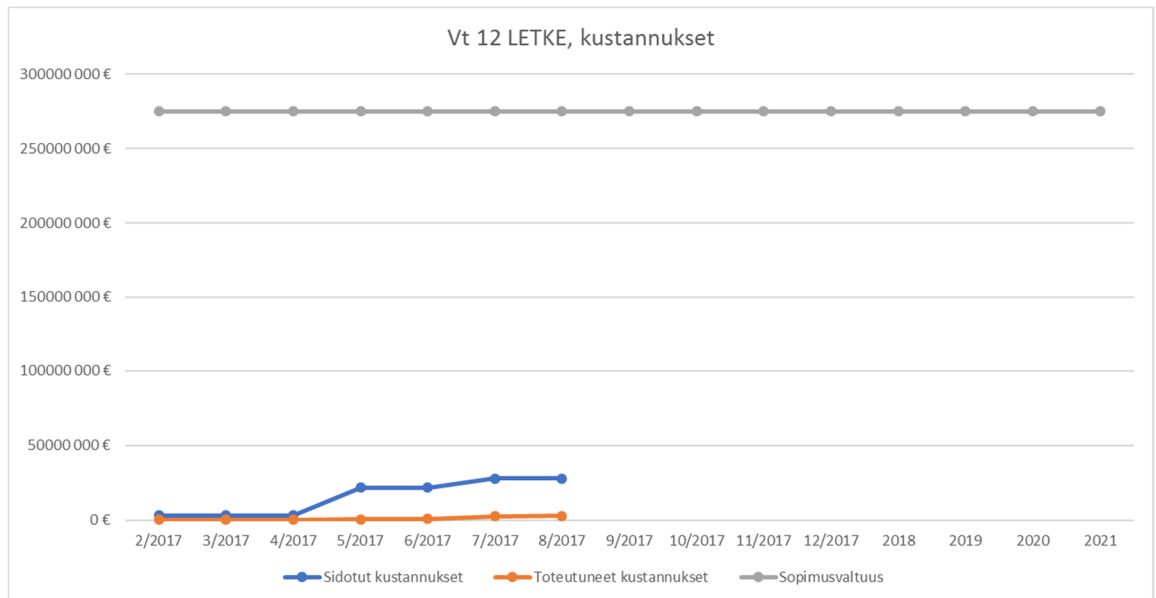

Kuva 2. Hankkeen kustannukset 8/2017

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>
