


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

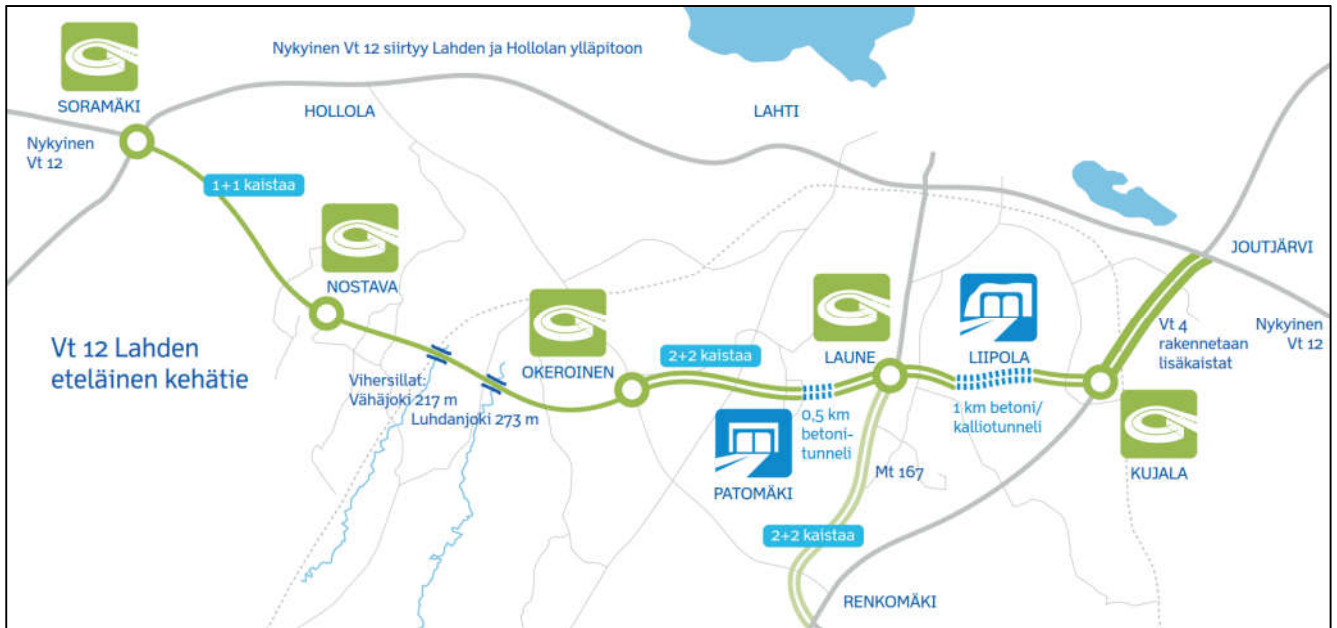

Kuukausiraportti nro 9/2017

Tarkastelujakso: 1.9.2017 - 30.9.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Hyväksynyt: Liikennevirasto

3.10.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, Big Roomin valmistuminen ja KAS-vaiheen töiden aloitus
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, siltojen S1 Hankaankadun risteyssilta, S3 Kangasmäen alikulkukäytävä, S9 Orimattilankadun alikulkukäytävä ja S24 Launeen risteyssilta työt käynnissä
- Vt12 Letke, Osa 1A ST, puuston poisto käynnissä

Tulevat tapahtumat:

- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, em. siltojen S1, S3, S9 ja S24 työt jatkuvat
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patometsänkatu vesihuoltotyöt
- Vt12 Letke, Osa 1A ST, tarjousaika päättyy 19.10.2017

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus:

Rakennuttaja	7 henkilötyökuukautta (httk)
Hankeosa 1A	
Hankeosa 1B	47 htkk
Hankeosa 2	31 htkk

Hankeosa 1A ST-Hollola

Puuston poisto on käynnissä.
ST-urakka on kilpailutuksessa ja tarjoukset tulevat sisään 19.10.2017.

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Allianssin Big Room on valmistunut ja KAS-vaiheen työt ovat käynnissä. Valtarin Kick-Off tilaisuus järjestettiin Lahden Big Roomissa, jonne kokoon-tui noin 80 Valtarilaista.

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituksen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat mm. siltojen S1, S3, S9 ja S24 työt.

Ansiokatu/Patometsänkatu vesihuoltotöiden vuoksi käytössä on kavenne-tut ajokaistat.

3.10.2017



Kuva 1. S3 peruslaattojen valu

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjousaikaa on jatkettu 19.10.2017 asti.

4 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 30.9.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	21 780 790,76 €	7 623 276,77 €	847 030,75 €	30 251 098,27 €
Toteutuneet kustannukset	3 347 300,96 €	1 325 747,09 €	147 719,06 €	4 820 767,11 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

3.10.2017

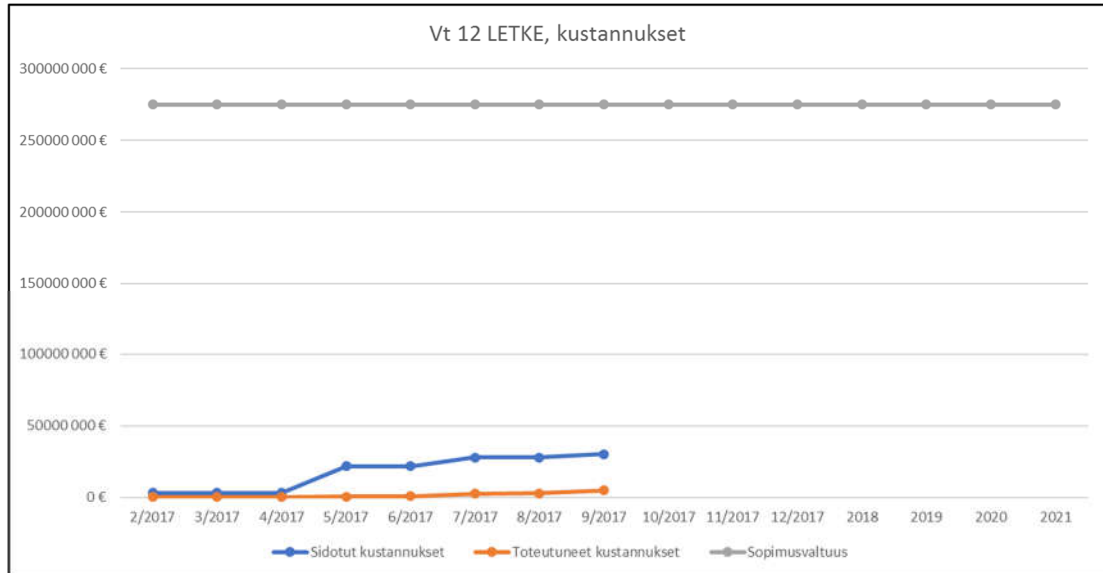

Kuva 2. Hankkeen kustannukset 9/2017

5 Muut asiat

Ilmakuvaus alueesta on tehty 6.9.2017 ja video löytyy linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_DgTPsPUk&feature=youtu.be

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>
