




9.8.2023


Väylävirasto Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO Rakennussuunnitelma

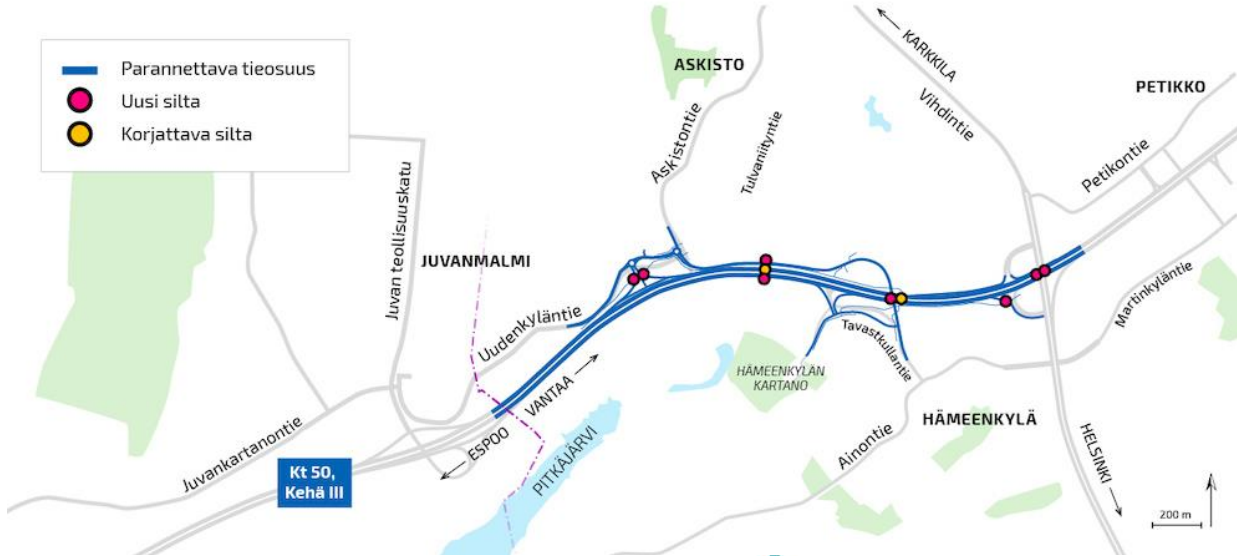

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA Rakennussuunnitelma

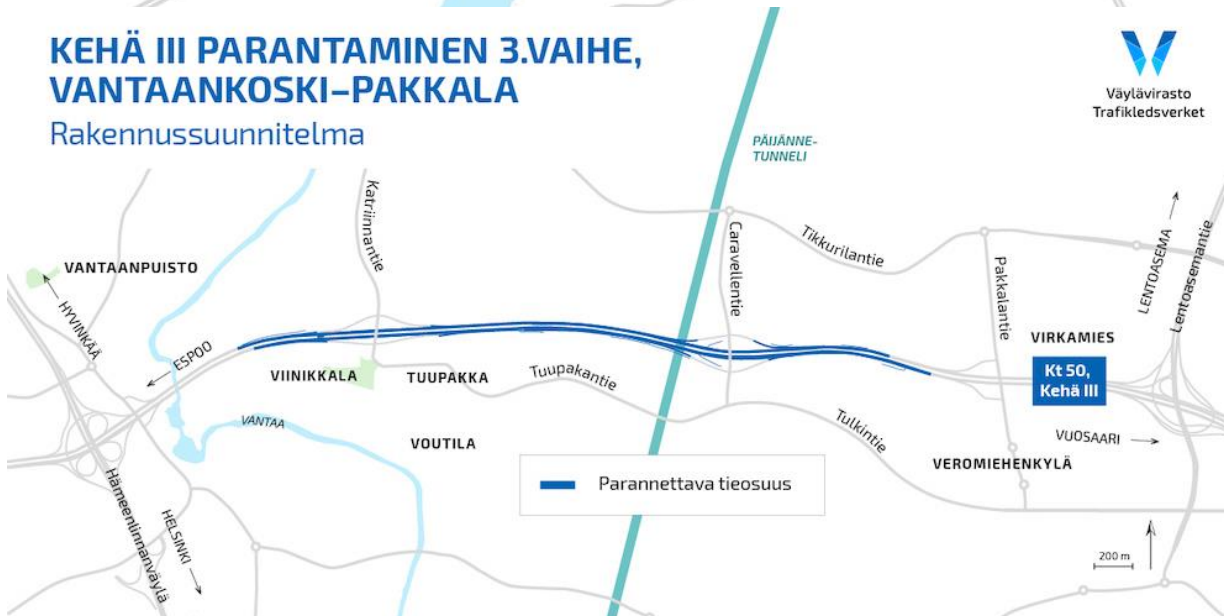

Kuukausiraportti nro 7/2023
Tarkastelujakso: 1.7.2023 – 31.7.2023
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



**Väylävirasto
Trafikledsverket**

9.8.2023

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisällys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



9.8.2023

Väylävirasto

Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 8.8.2023)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	99
Sillat (S101-S111)	100
ST S112	99
Korjattava silta U-950	95
Korjattava silta U-1468	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	99
HSY	100
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	100
Liikenteenhallinta	100
HSY	100

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo heinäkuulta: 99,27 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,07 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia heinäkuussa. Tapaturmataajuus heinäkuun 2023 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Heinäkuussa ELY-keskuksen sillan U-950 korjaus on valmistunut ja kiertotie sillan kohdalta on poistettu. Nyt kaikki Askiston kohdan sillat ovat liikenteellä. Meluseinän viimeiset lohkot sillan U-950 kohdalla on asennettu. Lisäksi esimerkiksi sillan S107 betonipintoja on hiekkapuhallettu ja sillan S104 alapuolista vesistöä on puhdistettu rakennusjätteistä. Muillakin Askiston kohdan silloilla on tehty viimeistelyitä.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Väylävirasto
Trafikledsverket

9.8.2023

Raportti 4 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020



Kuva 1. Sillan U-950 kansi eristetty. Silta on päällystetty ja avattu kokonaisuudessaan liikenteelle viikolla 28.



Kuva 2. Valmis meluseinä.



Kuva 3. Yleiskuva Lintutorninsillalta länteen.



9.8.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Askiston alueen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Heinäkuussa on muun muassa tehty viimeiset päällystykset ja loput Kehä III:n ajoratamerkinnyt. Lisäksi alueella on tehty maaisemointia ja istutuksia, viimeisiä kaapelointeja sekä asennettu portaalien opastetauluja.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä väylätöitä.



Kuva 4. Linja-autopysäkki ja kevyen liikenteen väylä K7J asfaltoitu.



Kuva 5. Viimeiset ajoratamerkinnyt tehty Kehä III:lle.



9.8.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Uudet katuyhteydet, sillat ja rampit on otettu käyttöön 22.6.2023. Hankkeen avajaisia vietetään 30.8.2023.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 8.8.2023 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset						
Sidotut kustannukset	29 029 614,12 €	8 845 466,07 €	482 369,55 €	148 624,40 €	911 443,80 €	39 417 517,94 €
Toteutuneet kustannukset	27 254 674,74 €	8 386 670,91 €	482 369,55 €	148 624,40 €	911 443,80 €	37 183 783,40 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 39,550 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksusuudet.

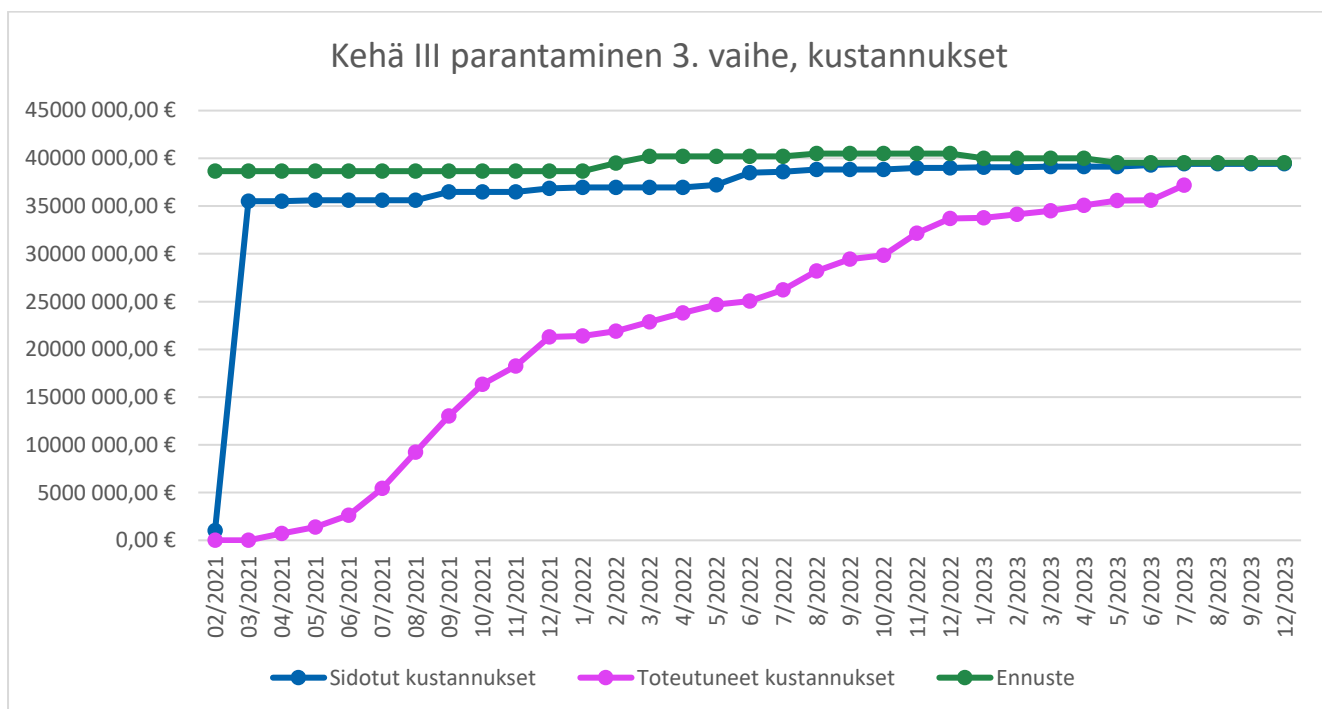

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 7/2023.



9.8.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Heinäkuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus Askiston sillasta
- Facebook-postaus Sänkiniityn sillan korjauksen valmistumisesta
- Facebook-postaus uudesta Askistentien katuyhteydestä
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta
