



5.5.2021

Väylävirasto
Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

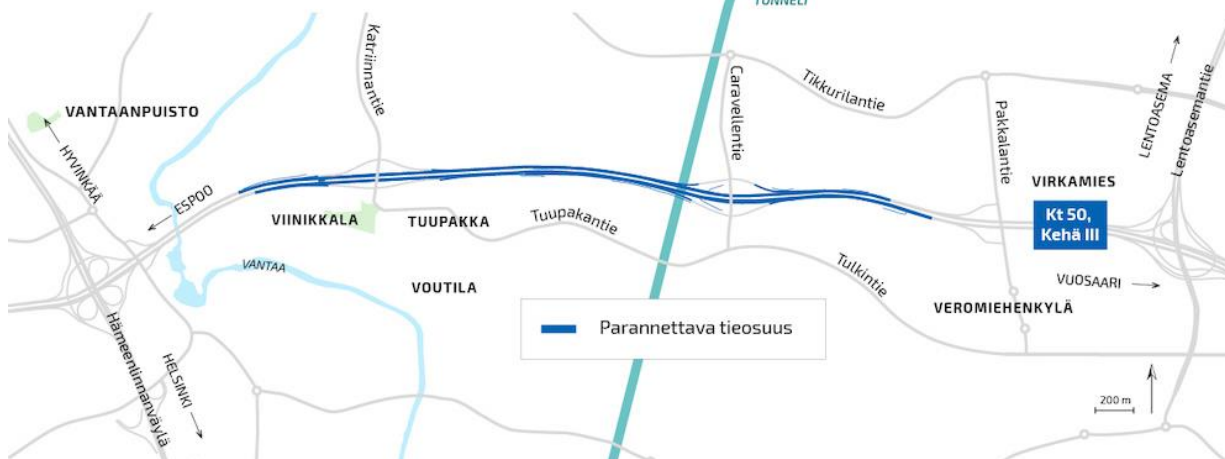
KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO

Rakennussuunnitelma

Väylävirasto
Trafikledsverket

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA

Rakennussuunnitelma

Väylävirasto
Trafikledsverket

Kuukausirapotti nro 4/2021
Tarkastelujakso: 1.4.2021 - 30.4.2021
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



Väylävirasto
Trafikledsverket

5.5.2021

Raportti 2 (5)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisällys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
Siltatyöt.....	3
Väylätyöt.....	4
3 Aikataulu.....	4
4 Kustannukset	4
5 Muut asiat.....	5



5.5.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 30.4.2021)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	1
Sillat (S101-S111)	1
ST S112	0
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	0
Louhintatyöt	0
Maanrakennustyöt	1
Päällysteet	0
Liikenteenhallinta	0
HSY	0
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	1
Louhintatyöt	1
Maanrakennustyöt	1
Päällysteet	0
Liikenteenhallinta	0
HSY	0

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo huhtikuulta: 96,42 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,05 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia huhtikuussa.

Avaintulosalueen ensimmäinen tarkastelujakso on aikavälillä 1.3.2021-31.12.2021.

Tapaturmataajuus huhtikuun 2021 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Siltatyöt

S111 liikennejärjestelyt on tehty ja asfaltinpoisto aloitettu. S101 ja S102 porapaalutus on valmis, ja kaivutyö käynnissä. S106 laatan paalutuspeti on valmis ja S105 paalutuspeti työt ovat käynnissä.



5.5.2021

Väylätyöt

Tällä hetkellä olevien väylätöiden vaiheet:

- Väylä K1: maaleikkuu ja kalliopintojen puhdistus plv. 900-1050 sekä maaleikkuu plv. 1200-1280.
- Väylä K2: maaleikkuu ja paalulaatan esiinkaivu plv. 260-400, stabilointityöt plv 800-900.
- Kiertoliittymä K2: painopenkan teko.
- Tie T6: rummun esikaivu.
- Ramppi E1R1: maaleikkuu.
- Kt 50 Askisto: maaleikkuu ja täyttötyöt plv 9700-9940, maaleikkuu ja kalliopintojen puhdistus plv. 10100-10300.
- Ramppi E2R11: maaleikkuu plv. 100-200 ja 300-400 sekä täyttötyöt plv 100-200.
- Väylä K3: maaleikkuu, paalutuspedin toteutus plv. 300-400, stabilointityöt plv 180-200.
- Kt 50 VaPa: maaleikkuu, suodatinkangas asennus, täyttötyöt, kallion rikotus ja louhintatyöt plv 5600-7200. VaPa osuuden painopenkat valmiit.
- Ramppi E5R2: louhintatyöt
- Väylä K502J: maaleikkuu ja täyttötyöt.

3 Aikataulu

Hankeosa 2 Vantaankoski-Pakkala valmistuu 30.11.2021 mennessä.

Hankeosa 1 Askisto valmistuu 30.11.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.4.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

		Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset	Sidotut kustannukset	26 453 817,17 €	8 239 232,00 €	279 000,00 €	96 441,00 €	450 000,00 €	35 518 490,17 €
	Toteutuneet kustannukset	444 521,16 €	284 727,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	729 248,16 €

Koko hankkeen määräraha on 38,656M€ ja ennuste on 38,656M€.



5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIIParantaminen3vaihe/>

Julkaistut tiedotteet:

- Mediatiedote Kehä III parantaminen: Hämeenkyllän läntisen risteyssillan rakentaminen Vihdintiellä alkaa 28.4.2021
- Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Tuupakassa 21.4.2021
- Vihdintien läntisen sillan uusimista aletaan valmistella viikolla 16, 19.4.2021
- Vantaan kaupungin asukaslehdessä lyhyt juttu hankkeesta
- 4/2021 Vantaan uutiskirjeissä nosto hankkeesta
