





11.8.2021

## Väylävirasto Trafikledsverket

### Sisälllys

1 Hankkeen yleiskatsaus .....	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne .....	3
2.1 Siltatyöt .....	3
2.2 Väylätyöt .....	5
3 Aikataulu .....	6
4 Kustannukset .....	6
5 Muut asiat .....	6



11.8.2021

# Väylävirasto Trafikledsverket

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 31.7.2021)

	Valmiusaste (%)
<b>Hankeosa 1: Askisto</b>	<b>22</b>
Sillat (S101-S111)	33
ST S112	0
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	0
Louhintatyöt	58
Maanrakennustyöt	30
Päällysteet	2
Liikenteenhallinta	0
HSY	0
<b>Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala</b>	<b>50</b>
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	70
Päällysteet	33
Liikenteenhallinta	0
HSY	48

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo heinäkuulta: 98,06 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 98,03 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia heinäkuussa. Tapaturmataajuus heinäkuun 2021 lopussa on 0.

Avaintulosalueen ensimmäinen tarkastelujakso on aikavälillä 1.3.2021-31.12.2021.

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### 2.1 Siltatyöt

#### Askisto

S111 tuentatyöt ovat käynnissä. Silloilla S101, S102 ja S108 kannen raudoitustyöt ovat käynnissä. S106 paalulaatta on betonoitu 7.7.2021 ja osa tukien paalutus-, muotti- ja raudoitustöistä on valmistunut. ELY-keskuksen rahoittamia korjattavia siltoja ei ole vielä aloitettu.

#### Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole siltatöitä.



**Kuva 1. Sillan S102 raudoituksen teko käynnissä.**



**Kuva 2. Sillan S106 T5 ja T6 muotti- ja raudoitustyöt käynnissä.**



**Kuva 3. Sillan S108 raudoitustyöt käynnissä.**



11.8.2021

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 2.2 Väylätyöt

#### Askisto

Käynnissä tukimuurin paalutus, stabilointitöitä, massanvaihto- ja kevennysrakennetyöt sekä voimalinjojen perustustyöt. Kaasuputken siirto valmistunut. Salaojan, kaapeliputkistusten ja valaisinjalustojen asennus käynnissä. Kehä III:lla on käytössä kaksi kiertotietä; Vihdintien puretun sillan kohdalla ja Kehä III:lla Hämeenkylässä kartanon kohdalla.

#### Vantaankoski-Pakkala

Käynnissä maaleikkaus- ja päällystystöitä sekä vesihuollon rakentamista. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan sekä valaisinjalustoja asennetaan. Painumakorjaukset käynnissä. Lisäkaistojen maaleikkaus ja tien rakennekerrosten teko käynnissä koko hankeosa-alueella.



**Kuva 4. Askistossa paalutus käynnissä.**



**Kuva 5. Vantaankoski-Pakkalassa painumakorjaukset länteen päin käynnissä. Itäsuunnan kaistojen painumakorjaus valmistunut.**





11.8.2021

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 3 Aikataulu

Hankeosa 2 Vantaankoski-Pakkala työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 30.11.2021 mennessä.


Hankeosa 1 Askisto työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

### 4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.7.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

		Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset	Sidotut kustannukset	26 344 527,00 €	8 239 232,00 €	279 000,00 €	96 441,00 €	658 000,00 €	35 617 200,00 €
	Toteutuneet kustannukset	4 259 298,23 €	1 169 917,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 429 215,69 €

Koko hankkeen määräraha on 38,656M€ ja ennuste on 38,656M€.

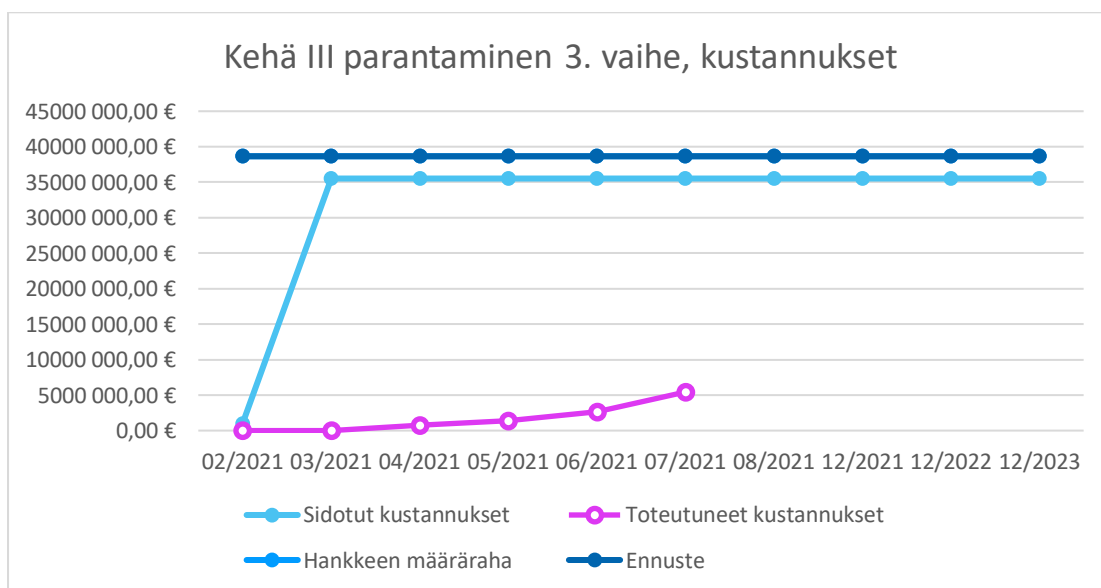

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 07/2021.

### 5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Julkaistut tiedotteet:

- Kehä III: tiedotteet Askiston ja Hämeenkyllän kouluille
