




3.12.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO Rakennussuunnitelma

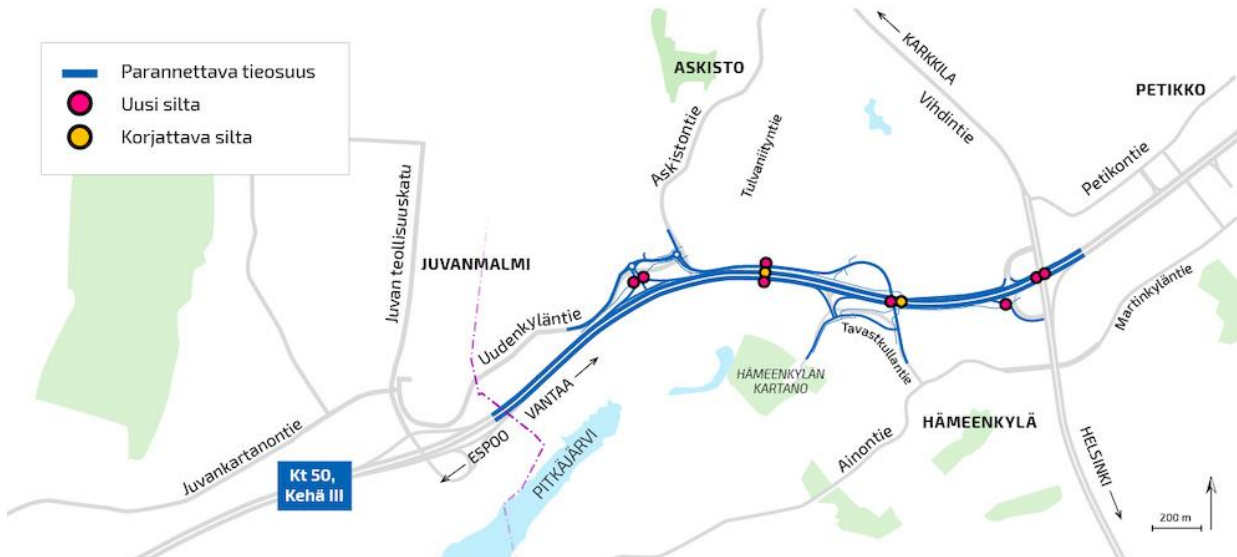

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA Rakennussuunnitelma



Kuukausiraportti nro 11/2021
Tarkastelujakso: 1.11.2021 - 30.11.2021
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



Väylävirasto
Trafikledsverket

3.12.2021

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisälllys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



3.12.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 3.12.2021)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	45
Sillat (S101-S111)	60
ST S112	0
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	0
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	42
Päällysteet	15
Liikenteenhallinta	10
HSY	5
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	98
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	95
HSY	63

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo marraskuulta: 97,57 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,63 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia marraskuussa. Tapaturmataajuus marraskuun 2021 lopussa on 0.

Avaintulosalueen ensimmäinen tarkastelujakso on aikavälillä 1.3.2021-31.12.2021.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Siltojen S101 ja S102 siirtymälaatat on valettu ja bitumisivelty. Sillan S106 telinettä ja kannen muotteja rakennetaan, ja liikennejärjestelyjä on päivitetty sillan kohdalla. Silta S108 on valmistunut ja sillalle on tehty tulo- ja poistumispenkereet. Sillan S111 T1 paalu-laatta on valettu ja sen yläpuolisia rakennekerroksia tehdään. Muotti- ja telinetyöt ovat käynnissä ja T3 paalutus on valmistunut. Kehä III:n kiertotie sillan S111 kohdalla on poistettu. S111 pohjoispuolella T6 peruslaatta on valettu ja teline- ja muottityöt ovat käynnissä. ELY-keskuksen rahoittamia korjattavia siltoja ei ole vielä aloitettu.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Kuva 1. Sillan S102 siirtymälaatta valettu.



Kuva 2. Sillan S106 teline- ja muottityöt käynnissä.



Kuva 3. Sillan S111 teline- ja muottityöt käynnissä liikenneaukon kohdalla.



3.12.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Askiston ramppien ja väylien rakennekerrosten teko ja valaisinjalustojen asennukset ovat käynnissä. Väylällä K2 useita tukimuurin ja paalulaatan lohkoja on valettu ja paalulaatan yläpuoliset rakennekerrokset on tehty. Myös paalutus on käynnissä väylällä K2. Väylällä K3 tehdään rakennekerroksia ja siirtymäläaatta on valettu. Rampin E1R2 lisästabilointi on valmistunut ja Askiston laatan yläpuoliset rakennekerrokset on levitetty. Kehä III:lla on käytössä kiertotie Hämeenkyän kartanon kohdalla. Lisäksi Askiston liittymä on suljettu ja ajo Askistoon tapahtuu Juvanmalmin tai Vihdintien kautta.

Vantaankoski-Pakkala

Bussipysäkit ja kevyen liikenteen väylä tukimuurin vierestä on päällystetty. Kaidetyöt ja ajoratamaalaukset ovat valmistuneet. Nuolitien kohdalla vesihuollon rakentaminen on käynnissä.



Kuva 4. Paalutus käynnissä Askistossa väylällä K2.



Kuva 5. Askistossa rampin E1R3 / väylän K2 kohdalla paalulaatan valu ja tukimuurin rakentaminen käynnissä.



3.12.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt HSY:n töitä lukuun ottamatta valmistuvat 31.12.2021 mennessä.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 2.12.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset						
Sidotut kustannukset	26 985 610,14 €	8 337 456,58 €	414 989,00 €	96 441,00 €	658 000,00 €	36 492 496,72 €
Toteutuneet kustannukset	13 876 577,51 €	4 124 425,93 €	135 989,00 €	21 777,00 €	104 000,00 €	18 262 769,44 €

Koko hankkeen määräraha on 38,656 M€ ja ennuste on 38,656 M€.

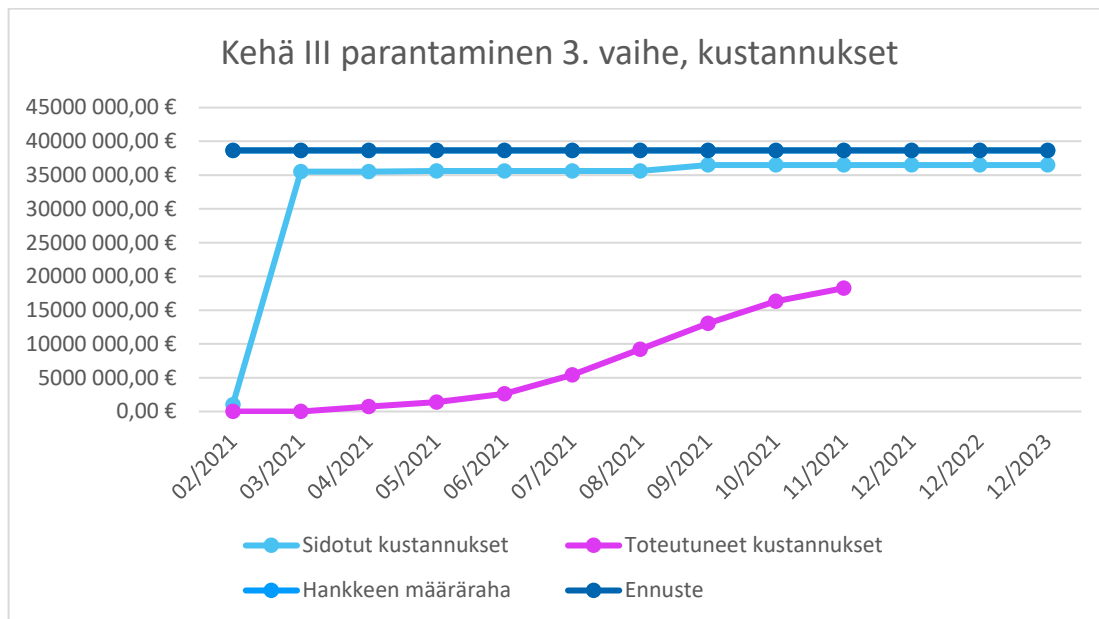

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 11/2021.



3.12.2021

Väylävirasto Trafikledsverket

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Marraskuussa julkaistut tiedotteet ja uutiset:

- Kehä III:n parannushankkeessa ylijäämämaterialit saavat uuden elämän
- Ilmakuvavideo Vantaankoski-Pakkalasta
- Facebook-päivitys Askiston siltatöistä
