



7.1.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

#### KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO Rakennussuunnitelma



#### KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA Rakennussuunnitelma



**Kuukausiraportti nro 12/2021**  
**Tarkastelujakso: 1.12.2021 - 31.12.2021**  
**Laatinut: Welado Oy**  
**Hyväksynyt: Väylävirasto**



Väylävirasto  
Trafikledsverket

7.1.2022

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

**Sisälllys**

1 Hankkeen yleiskatsaus .....	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne .....	3
2.1 Siltatyöt .....	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu .....	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat .....	7



7.1.2022

# Väylävirasto Trafikledsverket

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 5.1.2022)

	Valmiusaste (%)
<b>Hankeosa 1: Askisto</b>	<b>48</b>
Sillat (S101-S111)	63
ST S112	0
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	0
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	45
Päällysteet	20
Liikenteenhallinta	15
HSY	10
<b>Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala</b>	<b>99</b>
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	100
HSY	70

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo joulukuulta: 97,47 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,55 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia joulukuussa. Tapaturmataajuus joulukuun 2021 lopussa on 0.

Avaintulosalueen ensimmäinen tarkastelujakso on aikavälillä 1.3.2021-31.12.2021.

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### 2.1 Siltatyöt

#### Askisto

Sillat S101 ja S102 ovat valmistuneet. Sillan S106 kannen telineet ja muotit ovat valmiit ja raudoituksen aloittamista valmistellaan. Työt on aloitettu sillan S107 kohdalla. Sillan siipimuurit on purettu ja tartuntapintoja on siistitty. S111 tukien rakentaminen on käynnissä: T6 maatuki on valettu ja T3 muotteja ja raudoitusta tehdään. Kannen telinetyöt ovat myös käynnissä. ELY-keskuksen rahoittamia korjattavia siltoja ei ole vielä aloitettu.

#### Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



**Kuva 1. Sillan S106 telineet ja muotit valmistuneet.**



**Kuva 2. Sillan S107 vanhat siipimuurit purettu.**



**Kuva 3. Sillan S111 tukien rakentaminen ja kannen muuttotyöt käynnissä.**



7.1.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 2.2 Väylätyöt

#### Askisto

Pumppaamokaivannon valmistelevia töitä on tehty sillan S102 vieressä. Väylällä K2 siirtymälaatat ja useita tukimuurin lohkoja on valettu. Paalulaatan S105 rauditus on käynnissä. Myös paalutusta on valmistunut ja sähkö- ja operaattoriputkia on asennettu väylällä K2. Väylällä K3 on tehty rakennekerroksia ja pumppaamo on asennettu. Kehä III:lla on käytössä kiertotie Hämeenkyän kartanon kohdalla. Liikenne on siirretty kulkemaan Askiston laatan päälle. Lisäksi Askiston liittymä on suljettu ja ajo Askistoon tapahtuu Juvanmalmin tai Vihdintien kautta.

#### Vantaankoski-Pakkala

Nuolitien kohdalla vesihuollon rakentaminen on käynnissä. Hankeosan muut työt ovat valmistuneet.



Kuva 4. Askiston tukimuurin rakentaminen käynnissä väylällä K2.



Kuva 5. Vantaankoski-Pakkalassa vesihuollon alitusporaus ja putken sujutus suoritettu.



7.1.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet lukuun ottamatta HSY:n töitä.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

### 4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 5.1.2022 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
<b>Yhteiset</b>						
<b>Sidotut kustannukset</b>	27 258 931,58 €	8 363 427,49 €	480 270,55 €	96 441,00 €	659 954,00 €	36 859 024,62 €
<b>Toteutuneet kustannukset</b>	16 022 827,09 €	4 895 197,08 €	201 270,55 €	40 443,00 €	154 000,00 €	21 313 737,72 €

Koko hankkeen määräraha on 38,656 M€ ja ennuste on 38,656 M€.

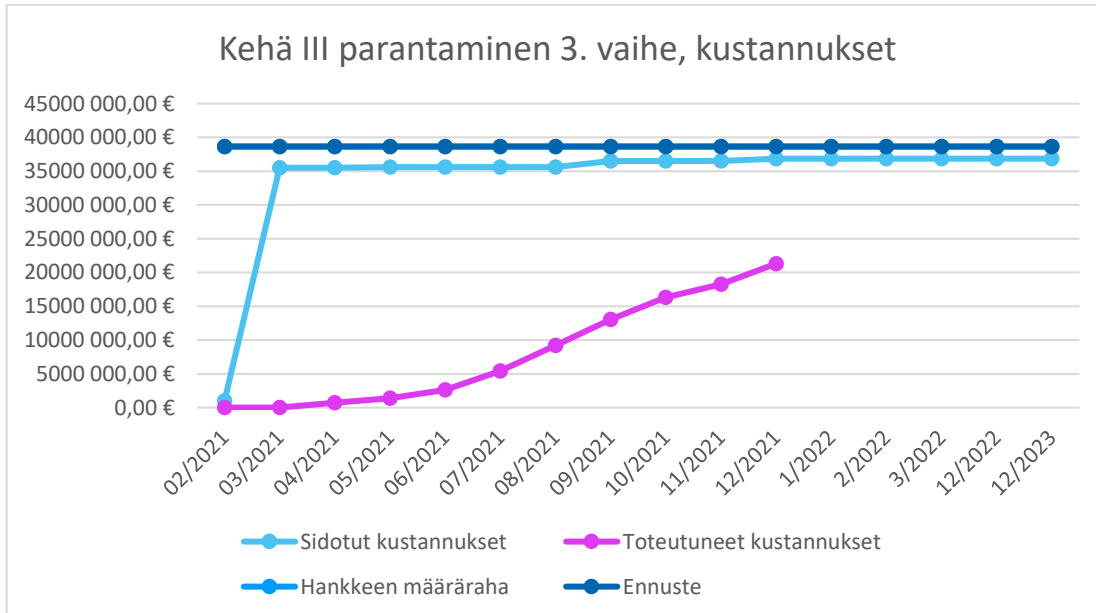

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 12/2021.



# Väylävirasto Trafikledsverket

7.1.2022

Raportti 7 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

## 5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Joulukuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus Askiston siltatöistä
- Facebook-postaus Askiston hankeosan työtilanteesta
- Facebook-postaus muuttuneista kevyen liikenteen reiteistä Tuupakan ja Kalliosolan välillä
