




2.12.2022


Väylävirasto Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO Rakennussuunnitelma

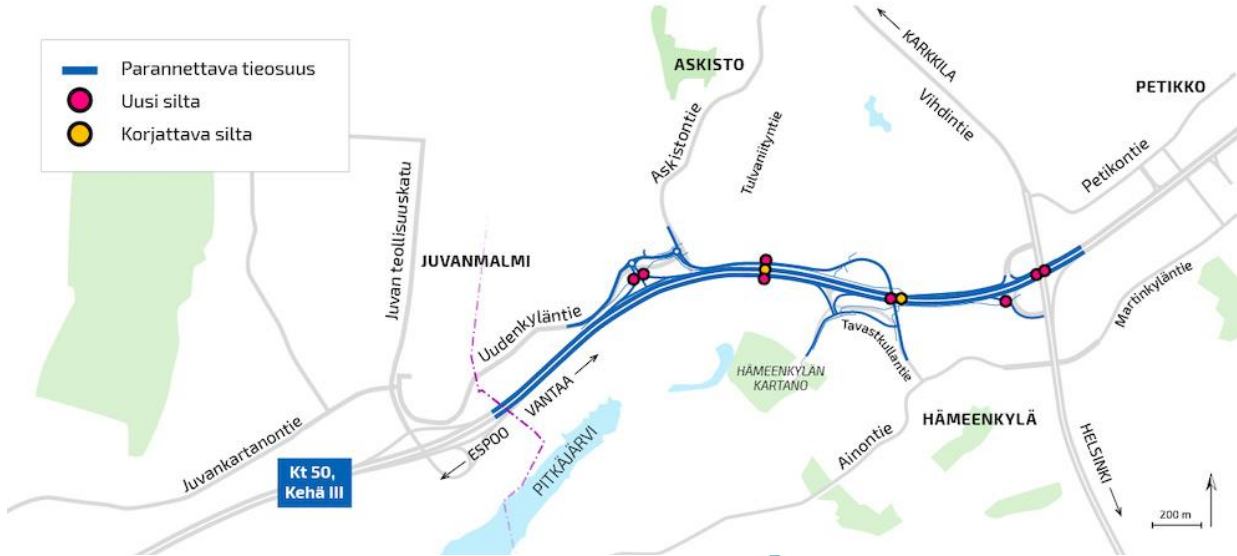

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA Rakennussuunnitelma

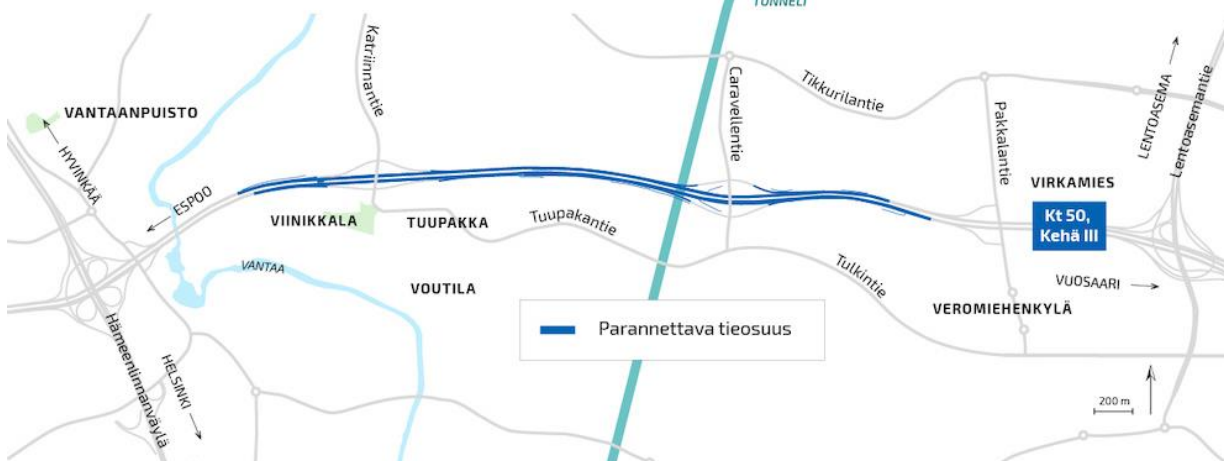

Kuukausiraportti nro 11/2022
Tarkastelujakso: 1.11.2022 – 30.11.2022
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



Väylävirasto
Trafikledsverket

2.12.2022

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisälllys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



2.12.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 2.12.2022)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	83
Sillat (S101-S111)	95
ST S112	22
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	88
Päällysteet	70
Liikenteenhallinta	55
HSY	90
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	100
Liikenteenhallinta	100
HSY	100

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo marraskuulta: 96,21 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 96,61 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia marraskuussa. Tapaturmataajuus marraskuun 2022 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Silta S104 on betonoitu ja kaiteet on asennettu. Siltakannen halkeamat on paikattu ja eristystyöt on tehty. Siirtymälaatat on asennettu paikoilleen. Sillalle S106 on levitetty viimeinen päällystekerros. S107 kohdalla kiertotien aikaiset liikennejärjestelyt on purettu ja keskialueen valaistusta on rakennettu. S112 tuki T4 on paalutettu ja paalut on betonoitu. S112 eteläpäässä telineen rakentaminen on käynnissä ja pohjoispäässä tukia raudoitetaan. Kiertotien linjausta S112 kohdalla on marraskuussa muutettu kulkemaan tukien T2 ja T3 välistä.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Kuva 1. Sillan S104 betonointi käynnissä viikolla 46.



Kuva 2. S112 tukien rakentaminen käynnissä Kehä III:n pohjoispuolella.



Kuva 3. Sillan S112 telineen rakentaminen käynnissä Kehä III:n eteläpuolella.



2.12.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Marraskuussa Askiston alueella on asennettu liikennemerkkejä ja tehty istutuksia. Luiskia on viimeistely ja rakennekerrosten levittämistä on jatkettu. HSY:n putkituksia on rakennettu ja Askiston melukaiteen betonimuuri on liukuvalettu. Päällystekerroksia on marraskuun aikana levitetty sään salliessa ja ajoratamerkintöjä on maalattu ennen ramppien liikenteelleottoja ja kiertoteiden siirtoja. Sillan S104 kohdan kiertotie on käytössä molempiin ajosuuntiin. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee uuden sillan S111 kautta. Uudet rampit Askistossa on avattu liikenteelle.

Vantaankoski-Pakkala

Keven liikenteen väylät on päällystetty Nuolitian ympäristössä. Vantaankoski-Pakkalan työt ovat hankkeen osalta valmistuneet, mutta HSY jatkaa alueen vesihuollon korjaustöitä.



Kuva 4. Rampit Kehä III:n ja Askiston välillä on avattu liikenteelle.



Kuva 5. Yleiskuva sillalta S106 länteen.



2.12.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 1.12.2022 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset Sidotut kustannukset	28 724 037,47 €	8 771 118,51 €	485 069,55 €	99 401,00 €	911 443,80 €	38 991 070,33 €
Toteutuneet kustannukset	23 528 252,29 €	7 378 506,84 €	344 069,55 €	43 403,00 €	861 443,80 €	32 155 675,48 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,496 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksusuudet.

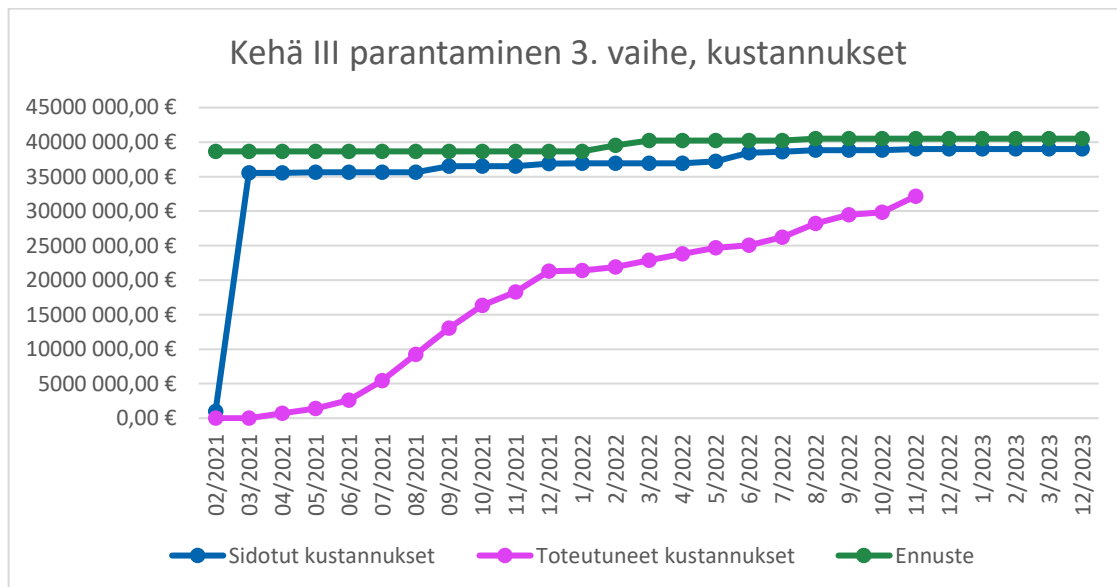

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 11/2022.



2.12.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Marraskuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Tiedote: Kehä III:n ja Askiston välille aukeaa kaksi uutta ramppia
- Facebook-postaus Petikon ramppien aukeamisesta
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta
- Facebook-postaus Askiston uusien ramppien käytöstä
- Facebook-postaus Askiston uusien ramppien käyttöönotosta
- Facebook-postaus Kehä III:n idän ajosuunnan kiertotiejärjestelyiden poistumisesta Sänkiniityn alikulkukäytävän kohdalla
- Facebook-postaus Kehä III:n idän ajosuunnan liikennejärjestelyiden muutoksista Vihdintien kohdalla
