



7.2.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU


KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO

Rakennussuunnitelma



KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA

Rakennussuunnitelma

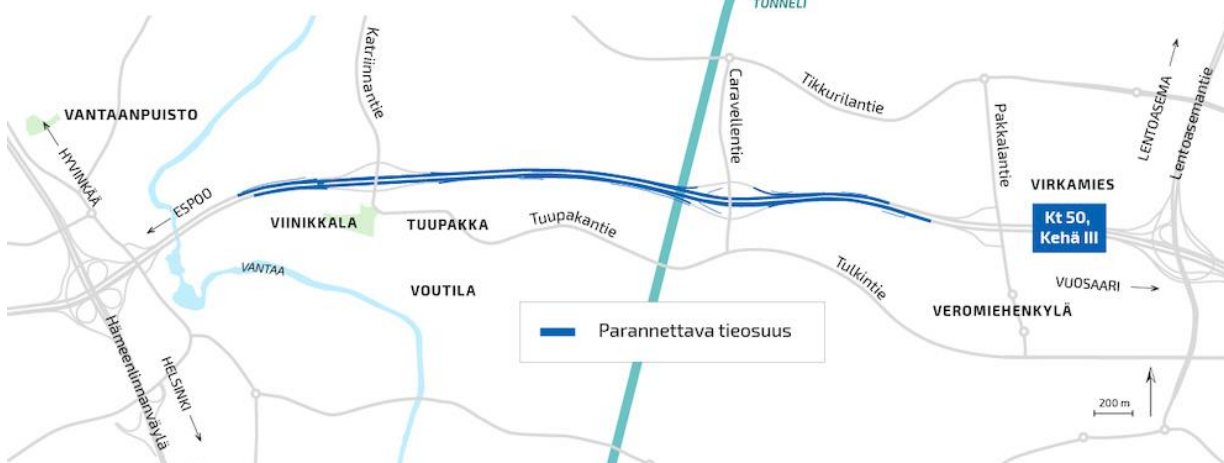**Kuukausiraportti nro 1/2023****Tarkastelujakso: 1.1.2023 – 31.1.2023****Laatinut: Welado Oy****Hyväksynyt: Väylävirasto**



Väylävirasto
Trafikledsverket

7.2.2023

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisälllys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



7.2.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 3.2.2023)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	86
Sillat (S101-S111)	100
ST S112	38
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	92
Päällysteet	78
Liikenteenhallinta	72
HSY	96
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	100
Liikenteenhallinta	100
HSY	100

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo tammikuulta: 96,46 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 96,72 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia tammikuussa. Tapaturmataajuus tammikuun 2023 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Tammikuussa työmaan joulutauon jälkeen sillalle S111 on asennettu valaistustolppia ja tehty sähkökytkentöjä. Sillan S112 telineille on rakennettu pelkkapedit sekä tukien T2 ja T3 että T5 ja T6 väleihin. Telineiden rakentamista on jatkettu Kehä III:n eteläpuolella ja telinetolppien asennus on aloitettu Kehä III:n pohjoispuolella. S112 maatuen T6 sulku-laatat on raudoitettu ja valettu. Lännen ajosuunnan kiertotie S112 sillan kohdalla Kehä III:lla on suoristettu viikolla 4. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee edelleen uuden sillan S111 kautta.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Kuva 1. Sillan S112 tukien T1-T3 telineen rakentaminen käynnissä.



Kuva 2. Sillan S112 pelkkapeti valmistunut tukien T5 ja T6 kohdalla. Telineolpituksen rakentamista aloitettu.



Kuva 3. Sillan S112 maatuen T6 lisälaatat valettu.



7.2.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Askistossa on tammikuussa jatkettu vesihuollon töitä ja HSY:n linjojen liitoksia on tehty väylällä K2 ja K3. Myös portaaliperustuksia ja kaapeliputkituksia on asennettu. Väylällä K2 on tehty valaistuksen sähkökytkentöjä ja väylällä K3 on aloitettu stabiloimattomien alueiden pilaristabilointi. Melukaiteen Me1 puuttuvan lohkon maatyöt on tehty ja anturan rauditus on käynnissä. Lisäksi Askiston tukimuurin viimeisten lohkojen rakennus on aloitettu.

Vantaankoski-Pakkala

Vantaankoski-Pakkalan työt ovat hankkeen osalta valmistuneet, mutta HSY jatkaa alueen vesihuollon korjaustöitä.



Kuva 4. Pilaristabilointi käynnissä väylällä K3.



Kuva 5. Portaaliperustuksen ja kaapeliputkitusten asennus käynnissä.



7.2.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.1.2023 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset						
Sidotut kustannukset	28 749 956,55 €	8 780 124,82 €	485 069,55 €	148 624,40 €	911 443,80 €	39 075 219,12 €
Toteutuneet kustannukset	24 792 095,33 €	7 727 718,45 €	344 069,55 €	43 403,00 €	861 443,80 €	33 768 730,13 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,000 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksuosuudet.

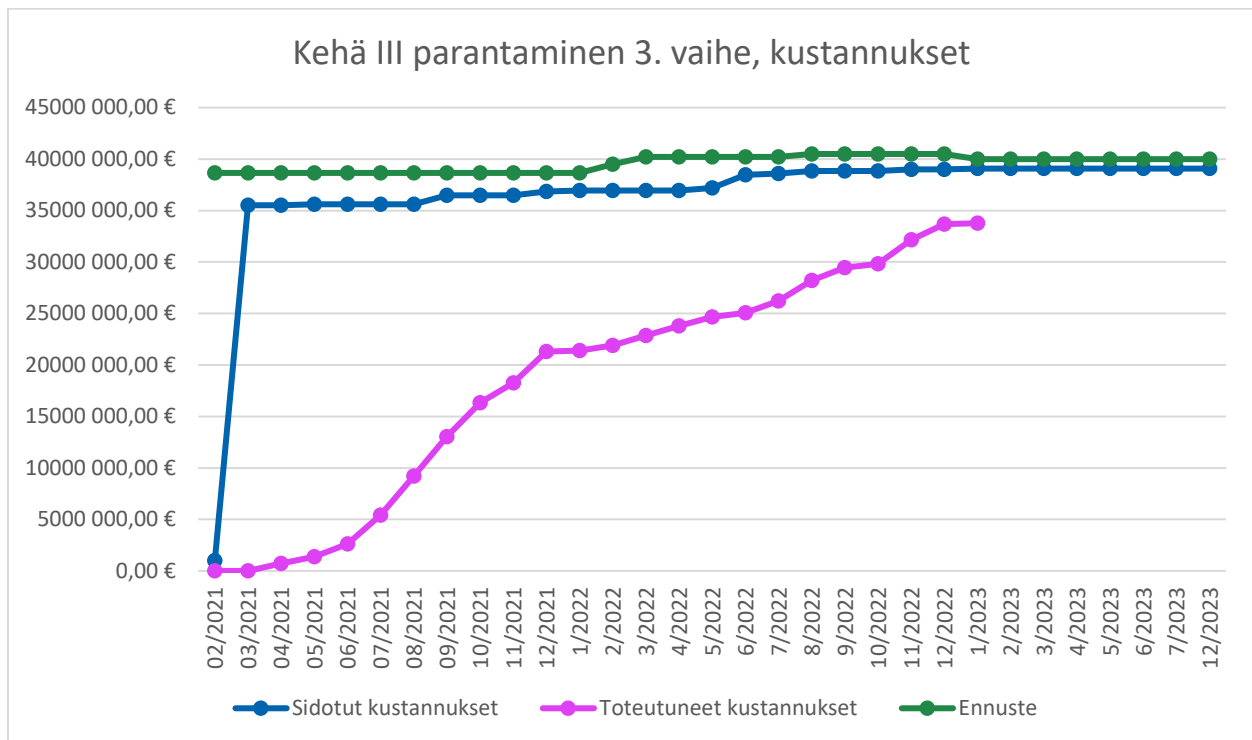

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 1/2023.



Väylävirasto
Trafikledsverket

7.2.2023

Raportti 7 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Joulukuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus lännen ajosuunnan kiertotien poistumisesta Kehä III:lla Vihdintien kohdalla
- Facebook-postaus liukkaudesta
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta
