


## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

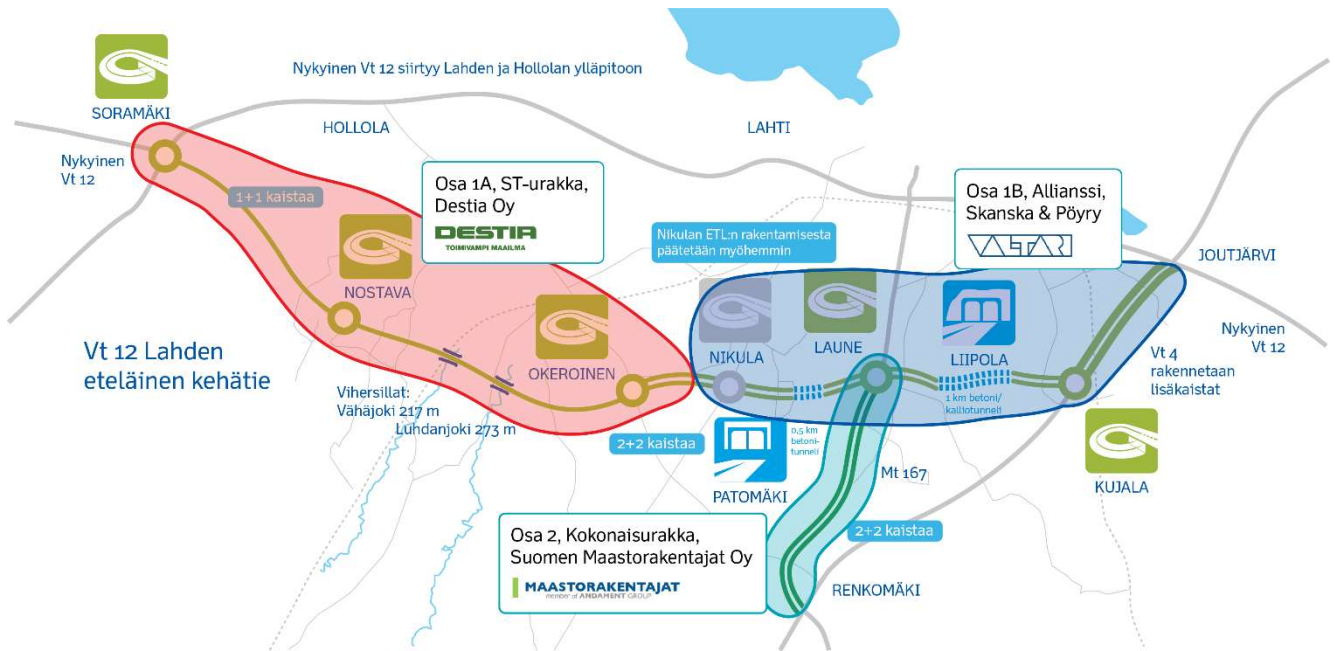

**Kuukausiraportti nro 2/2018**  
**Tarkastelujakso: 1.2.2018 - 28.2.2018**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Liikennevirasto**

2.3.2018

## 1 Ajankohtaiset asiat

### Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Osa 2, Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Hankaankadun sillan kannen valu
- Osa 1B Allianssi, suunnittelu- ja selvitystyöt etenevät
- Osa 1A ST, suunnittelutyöt käynnissä, valmistelevat työt maastossa käynnistyivät
- Osat 1B Allianssi ja Osa 1A ST, toinen yhteensovituspäätös pidetty
- Yleisötilaisuudet Lahdessa ja Hollolassa 7.2. ja 8.2.

### Käynnissä olevat työt ja tulevat tapahtumat:

- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie rakennustyöt jatkuvat
- Vt 12 Letke, Osa 1B Allianssi, suunnittelu ja selvitystyöt jatkuvat, maastossa pohjaveden pumppaukseen liittyvät rakennustyöt
- Vt 12 Letke, Osa 1A ST, suunnittelu jatkuu, valmistelevat työt käynnissä mm. työmaateiden ja -tukikohtien rakentaminen, koepaalutus Okeroisissa alkaa maaliskuussa.
- Hankealueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten purku jatkuu helmikuussa, asuinkiinteistöt saataneen purettua maaliskuun aikana.

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### **Henkilöstövahvuus**

Koko hankkeen henkilöstövahvuus tammikuussa oli 139 henkilötyökuukautta (htkk), mistä 35 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä.

### **Hankeosa 1A ST-Hollola**

Helmikuussa työt ovat edelleen keskittyneet rakennussuunnitteluun ja työnsuunnitteluun. Valmistelevat työt käynnistyivät mm. työmaateiden rakentamisella, koekuoppien kaivulla, koepaalutuksen valmistelulla sekä kalion kuorinnalla.

Maastossa tehty lisäpohjatutkimukset ovat loppusuoralla. Puuston poisto on edelleen käynnissä.

Pidetty urakan kolmas työmaakokous.

Urakoitsija esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Hollolassa 8.2.2018.

2.3.2018



Kuva 1. Ensimmäinen kaivinkone aloitti työt ST-urakassa 12.2.2018.

### Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Hankeosalla on maastossa tehty lisäpohjatutkimuksia mm. Ajokadulla ja Kujalan eritasoliittymän alueella. Launeella on asennettu pohjaveden alen- tamista varten tarvittavien siiviläkaivoja ja rakennettu purkuputkea.

Helmikuussa on jatkettu rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta, ja tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin.

Valtari esitteli suunnitelmiaan yleisötilaisuudessa Lahdessa 7.2.2018.

### Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituk- sen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työ- vaiheita ovat mm:

- silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), sillan päällysrakenteet
- silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä)
- silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), tukiseinän rakentaminen ja kai- vutyöt käynnissä
- silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen telineen ja muotin rakenta- minen
- S10 (Launeen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen
- S36 (Patomäen alikulkukäytävä), paalutustyöt

2.3.2018

Helmikuussa ei tehty merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.



Kuva 2. Sillan S1 valu 8.2.



Kuva 3. Sillan S24 telineen valmistelua 7.2.



2.3.2018



Kuva 4. S10-S24 siltapaikka 13.2.

### Rakennusten purku-urakka

Helmikuussa jatkettiin Patomäen länsipään kohdalta asuintalojen purkamista.

## 3 Aikataulu

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikaisemmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla.

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aikataulu.



## 4 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 28.2.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	68 955 141,81 €	24 134 299,63 €	2 681 588,85 €	95 771 030,29 €
Toteutuneet kustannukset	11 209 454,38 €	3 939 241,54 €	430 889,96 €	15 579 585,88 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

2.3.2018

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

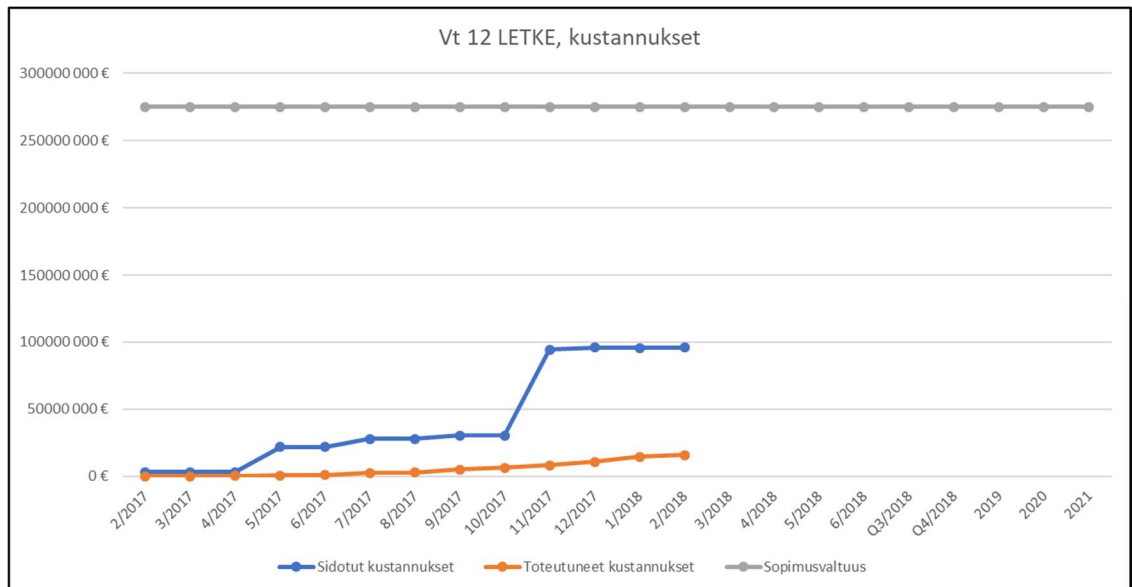

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 2/2018

## 5 Muut asiat

Viestinnän työpalaverit pidettiin 2.2.2018 ja 16.2.2018, painottuen lähinnä allianssiurakan ulkoiseen viestintään.

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke>
- Twitterissä: [@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)
- Flickrissä: <https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums>

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotiedotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla.

Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5.
