


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

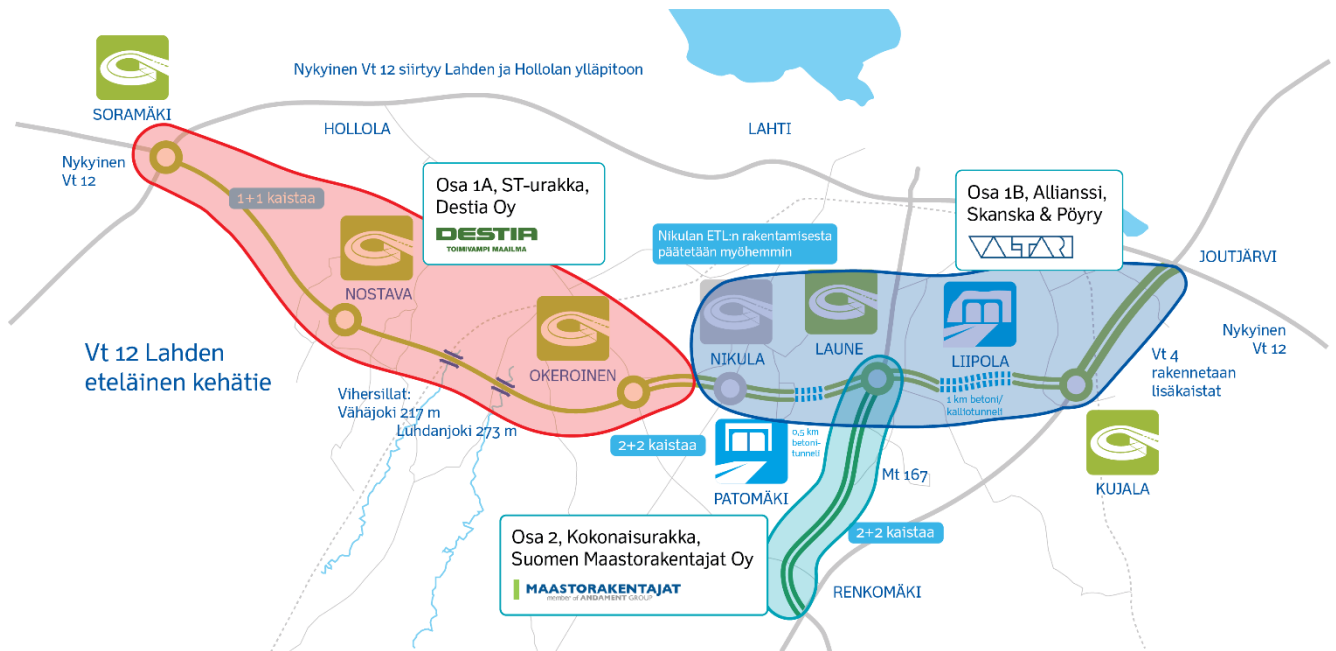

Kuukausiraportti nro 3/2018
Tarkastelujakso: 1.3.2018 - 31.3.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

4.4.2018

1 Hankkeen yleiskatsaus

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) työt etenevät pääosin siltatöiden parissa.

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) on edetty suunnittelusta valmistelevien töiden pariin, ja varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuussa.

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) urakka on kehitysvaiheessa, jossa tehdään suunnittelu- ja selvitystöitä. Maaliskuussa edettiin valmisteleviin rakennustöihin Liipolassa. Huhtikuussa aloitetaan tutkimustunnelien louhinta.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 155 henkilötyökuukautta (htkk), mistä 33 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä.

Hankeosa 1A ST-Hollola

Maaliskuussa työt ovat edelleen keskittyneet rakennussuunnitteluun ja työsuunnitteluun. Valmistelevinä töinä tehtiin koepaalutusta, työmaateiden ja -tukikohtien rakentamista ja kallion kuorintaa. Huhtikuun alussa rakentaminen alkaa useassa kohteessa. Louhintatyöt alkavat Soramäessä ja Patiokalliossa. Paalutustyöt alkavat Patiokalliossa ja Okeroisissa.

Maastossa tehdyt lisäpohjatutkimuksia viimeistellään. Puuston poisto on pääosin valmis.

Maaliskuussa pidettiin urakan neljäs työmaakokous.

Maaliskuussa pidettiin hankeosien 1A ja 1B yhteiset hankintamarkkinat yhteistyössä Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kanssa.

4.4.2018



Kuva 1. Koepaalutusta Luhdanjoen sillan (S9b) itäpäässä

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Hankeosalla suunnittelu ja selvitystyöt jatkuvat. Maastossa tehtiin valmistelevia töitä Liipolassa (työmaa-alueen aitaaminen, työmaateiden rakentaminen, kallion kuorinta). Huhtikuun alusta alkaa tutkimustunnelien louhinta

Maaliskuussa on jatkettu rakennustöiden suunnittelua ja aikataulutusta, ja tekniikkaryhmissä on viety suunnitteluratkaisuja eteenpäin.



Kuva 2. Maankaivua Liipolan tutkimustunnelin kohdalta.

4.4.2018

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituksen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat mm:

- silta S1 (Hankaankadun risteyssilta), sillan päällysrakenteet
- silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä), tukiseinän siirto
- silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä), tukiseinän rakentaminen ja kaivutyöt käynnissä
- silta S24 (Launeen risteyssilta), kannen raudoitus
- S10 (Launeen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen
- S36 (Patomäen alikulkukäytävä), perustusten rakentaminen

Maaliskuussa ei tehty merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.



Kuva 3. Hankaankadun risteyssillan (S1) sääsuoja rakentumassa.



Kuva 4. Launeen risteys sillan (S24) kannen telinettä

Rakennusten purku-urakka

Maaliskuussa purettiin Patomäen länsipään kohdalta asuintalot.

3 Aikataulu

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikaisemmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pääntien urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla.

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aikataulu.



4 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.3.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	68 955 141,81 €	24 134 299,63 €	2 681 588,85 €	95 771 030,29 €
Toteutuneet kustannukset	11 209 454,38 €	3 939 241,54 €	430 889,96 €	15 579 585,88 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

4.4.2018

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

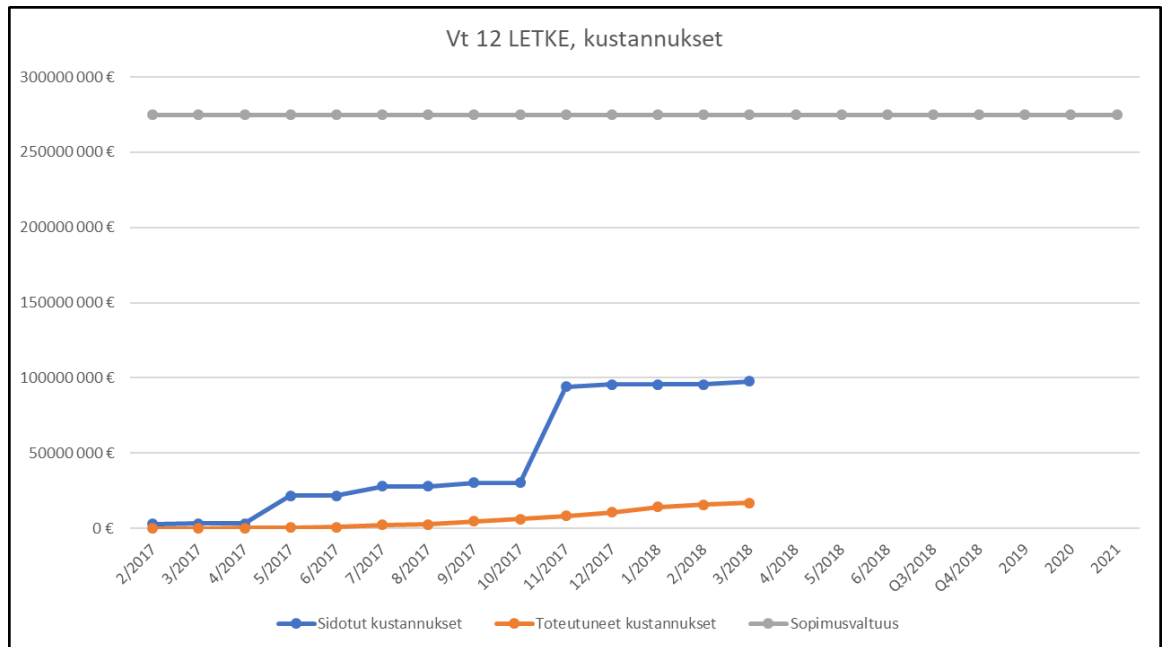

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 3/2018

5 Muut asiat

Viestinnän työpalaveri pidettiin 8.3.2018, painottuen lähinnä allianssiuran ulkoiseen viestintään.

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke>
- Twitterissä: [@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)
- Flickrissä: <https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums>

Hankeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotiedotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla.

Allianssi järjesti Jyrkänkadun asukkaille asukastilaisuuden 28.3.2018.

Seuraavat yleisötilaisuudet pidetään Lahdessa 30.5. ja Hollolassa 31.5.
