


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

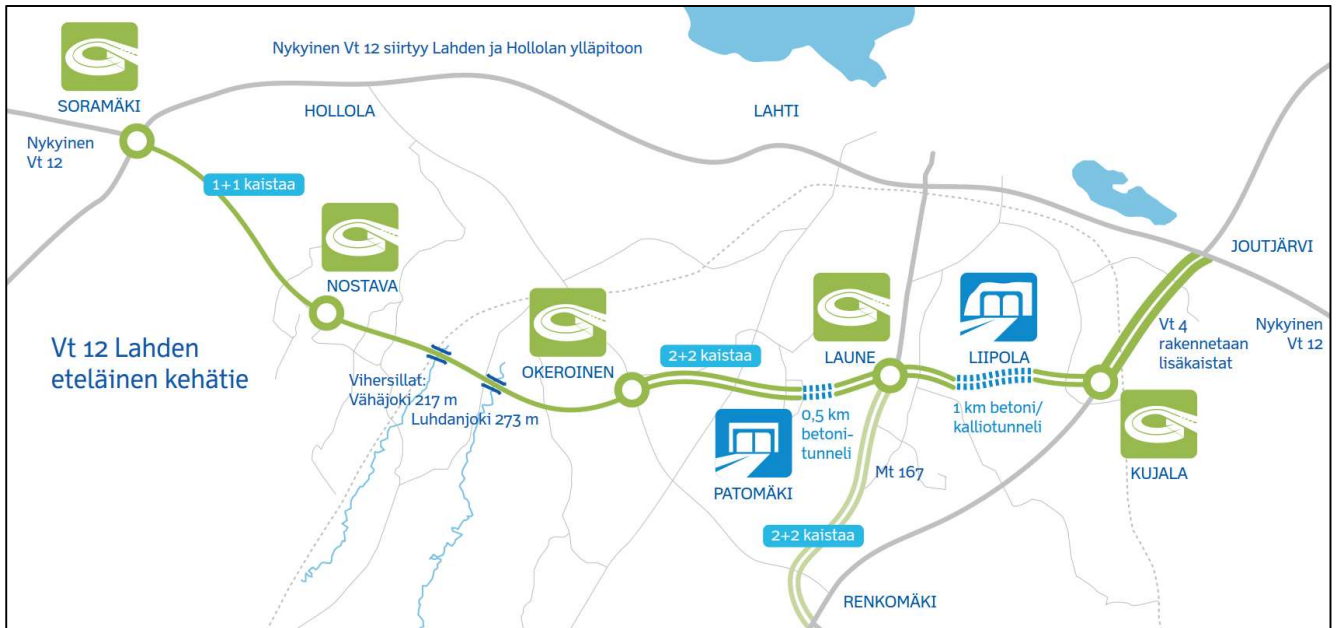

Kuukausiraportti nro 3/2017
Tarkastelujakso: 1.3.2017 - 31.3.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Mt167 RS, Hankeryhmän kokous nro 11, 1.3.2017
- Projektiryhmän kokous 6.3.2017 Lahdessa
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi ehdokaskeskustelut 9.-10.3.2017 Liikennevirastossa
- Viestintäpalaveri 13.3.2017 Lahden projektitoimistolla
- Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjoajakeskustelut Lahden projektitoimistolla 14.-15.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1A ST, pohjatutkimusten sopimuskatselmuksen hyväksyminen ja turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017
- Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, Venetsian painopenkereen turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1A ST, pohjatutkimusten sopimuskatselmuksen hyväksymien ja turvallisuuden aloituskokous 20.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, pohjatutkimusten tarjousten jättö 23.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, urakan osallistumishakemusten jättö ja avaus 27.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, urakan tarkennetun tarjouspyynnön lähetys 30.3.2017
- Osa 2, Venetsian esikuormituspenkereen valmistuminen 31.3.2017

Tulevat tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous 4.4.2017 Lahdessa
- Vt12 Letke, E4 Nikula ETL hankeryhmän kokous 7.4.2017 Liikennevirastossa
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjousten jättö 12.4.2017 (tarjousaika jatkettu kaksi päivää)
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, hankintailmoitus 19.4.2017
- Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 12, 26.4.2017

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus

Tilaaaja: Työpanos 3 henkilötyökuukautta (htkk)
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4 htkk
Urakoitsijat: Työpanos 2,5 htkk (M. Huhtakallio Oy)

Hankeosa 1A ST-Hollola

Urakkahankinnan valmistelu on käynnissä.

3.4.2017

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Urakkahankinta on käynnissä.

Kevään aikana käynnistetään Nikulan eritasoliittymän tiesuunnitelman laatiminen. Nikulan eritasoliittymän toteuttamisen edellytyksiä tarkastellaan ja päätös tehdään siinä vaiheessa, kun Lahden eteläisen kehätien kustannukset ovat selvillä. Nikulan eritasoliittymän kustannusten tulee mahtua osaksi Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden 275 miljoonan euron enimmäiskustannuksia, jotta rakentaminen toteutetaan.

Hankeosa 2 KU – Mt 167

Urakkahankinta on käynnissä.

Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen rakentamisen tarjous on saatu ja hankintapäätös tehty 14.3.2017. Putkisillan kohdan esirakennustyöt ovat valmistuneet maaliskuun aikana. Rakenteeseen lisätään vielä lisätyönä kuivatusputket huhtikuun aikana.



Kuva 1. Venetsian putkisillan (S4) esikuormituspenger

Pohjatutkimustyöt jatkuvat hankkeen alueella.

3.4.2017

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

4 Kustannukset

Hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.3.2017 on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	2 428 616,72 €	606 971,41 €	67 441,27 €	3 103 029,40 €
Toteutuneet kustannukset	43 109,75 €	0,00 €	0,00 €	43 109,75 €

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLF-fX-5j0>
