




Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Antti Koski

14.5.2019

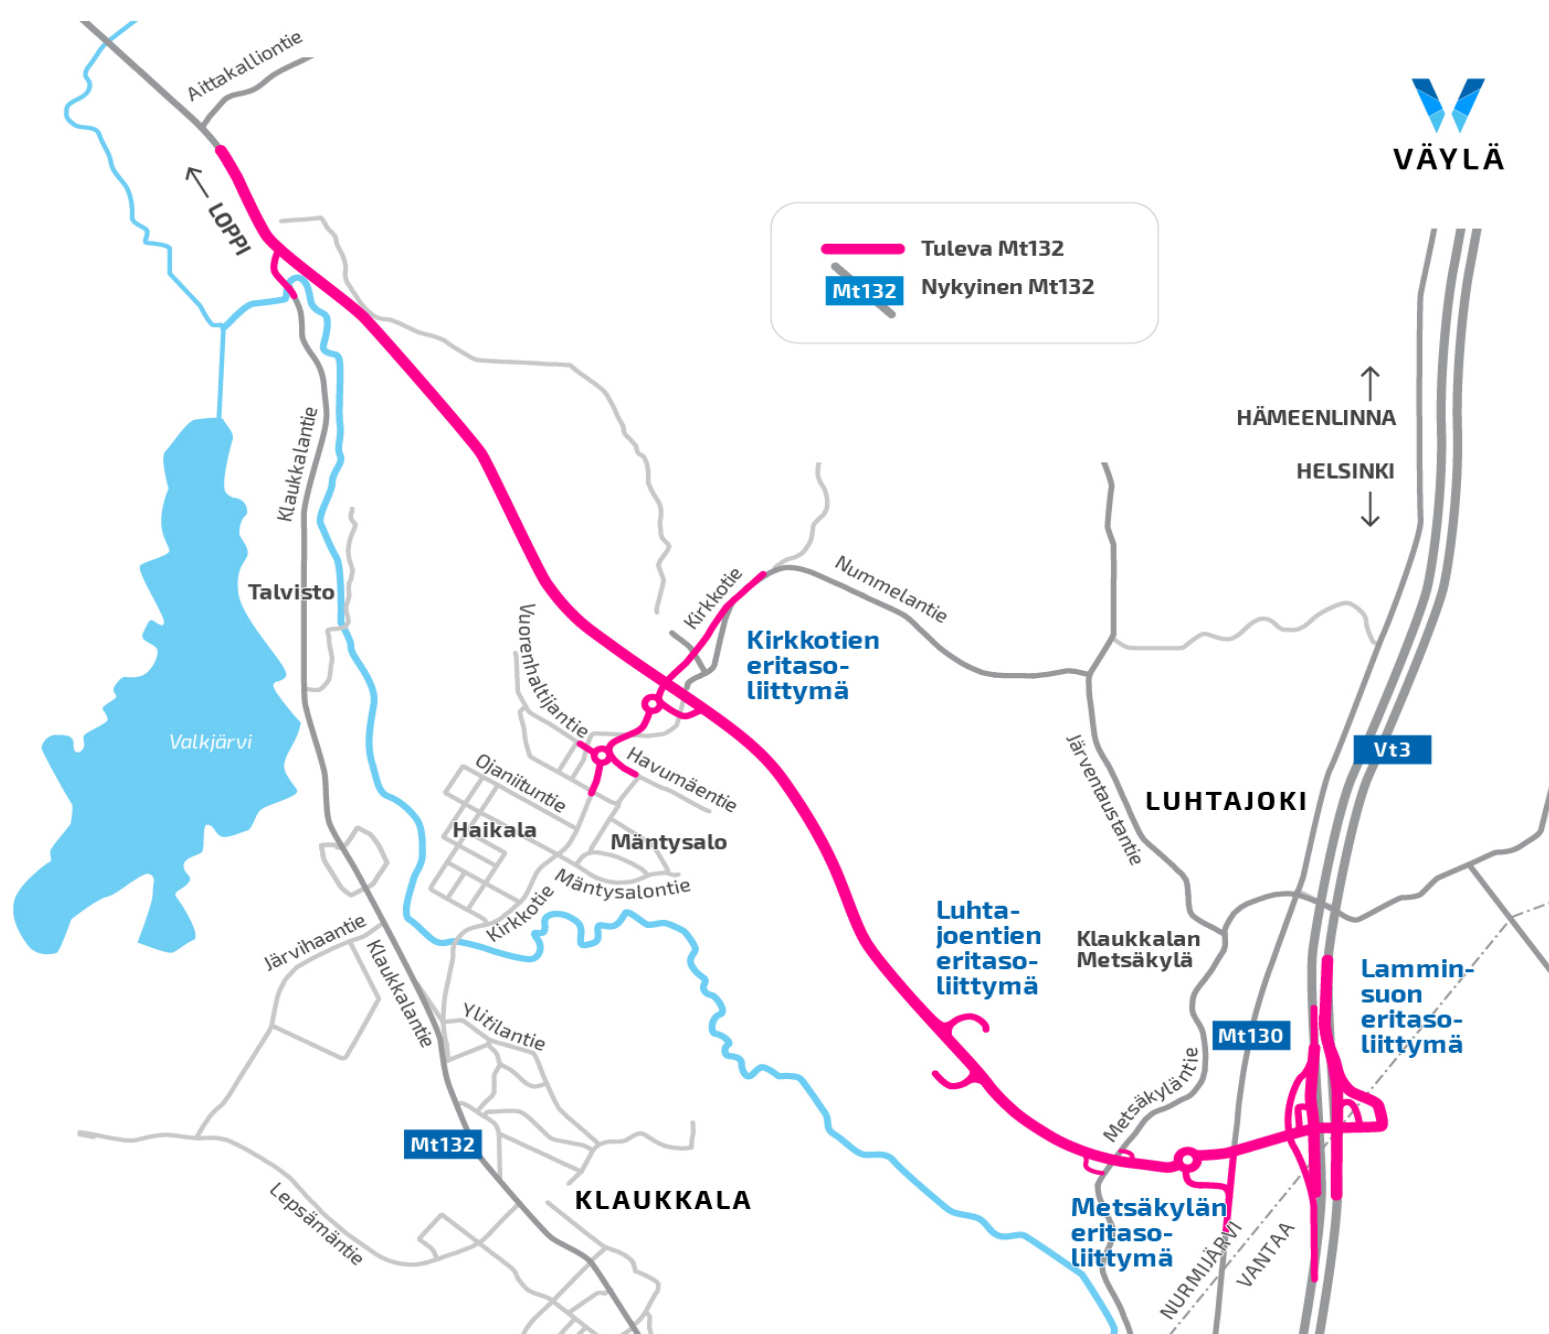

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

- Yhteishanke; Nurmijärven kunta ja Väylävirasto
- Toteuttamissopimus 21.12.2017
- Hankkeen kustannusarvio 34 M€, josta Nurmijärven kunnan osuus 8 M€.
- Urakan toteutusmuoto STk (Suunnittele ja toteuta, sisältäen kehitysvaiheen)
- Pääurakoitsija Kreate Oy

Hallinnollinen tilanne

- Yleissuunnitelman hyväksymispäätös lainvoimaiseksi 15.5.2017
- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehty 19.12.2017. Tiesuunnitelma lainvoimainen 22.11.2018.
- Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta ei saatu valituslupaa KHO:lta ja asemakaavamuutos lainvoimaiseksi 18.2.2019.
- Tiealueen haltuunotto 29.8.2018 ja 14.3.2019 (Kirkkotien kaavamuutosalue)
- Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätös tehty Nurmijärven kunnassa 21.3.2019 ja siitä on tehty 1 valitus HaO:een.

Työt käynnistyneet

- Rakennustyöt ovat alkaneet helmikuussa 2019.
- Kirkkotien katualueella työt alkavat katualueen haltuunoton jälkeen, tarkempi töiden aloitusajankohta ei vielä selvillä. Katusuunnitelmasta tehdyllä valituksella ei näillä näkymin ole vaikutusta ohikulkutien valmistumisaikatauluun.
- Urakka valmis ja uusi tie liikenteellä 2021 syksyllä.




VÄYLÄ

**THE FUTURE IS
BUILT TODAY**

KREATE

**14.5.2019
Sami Laakso**

MT 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk

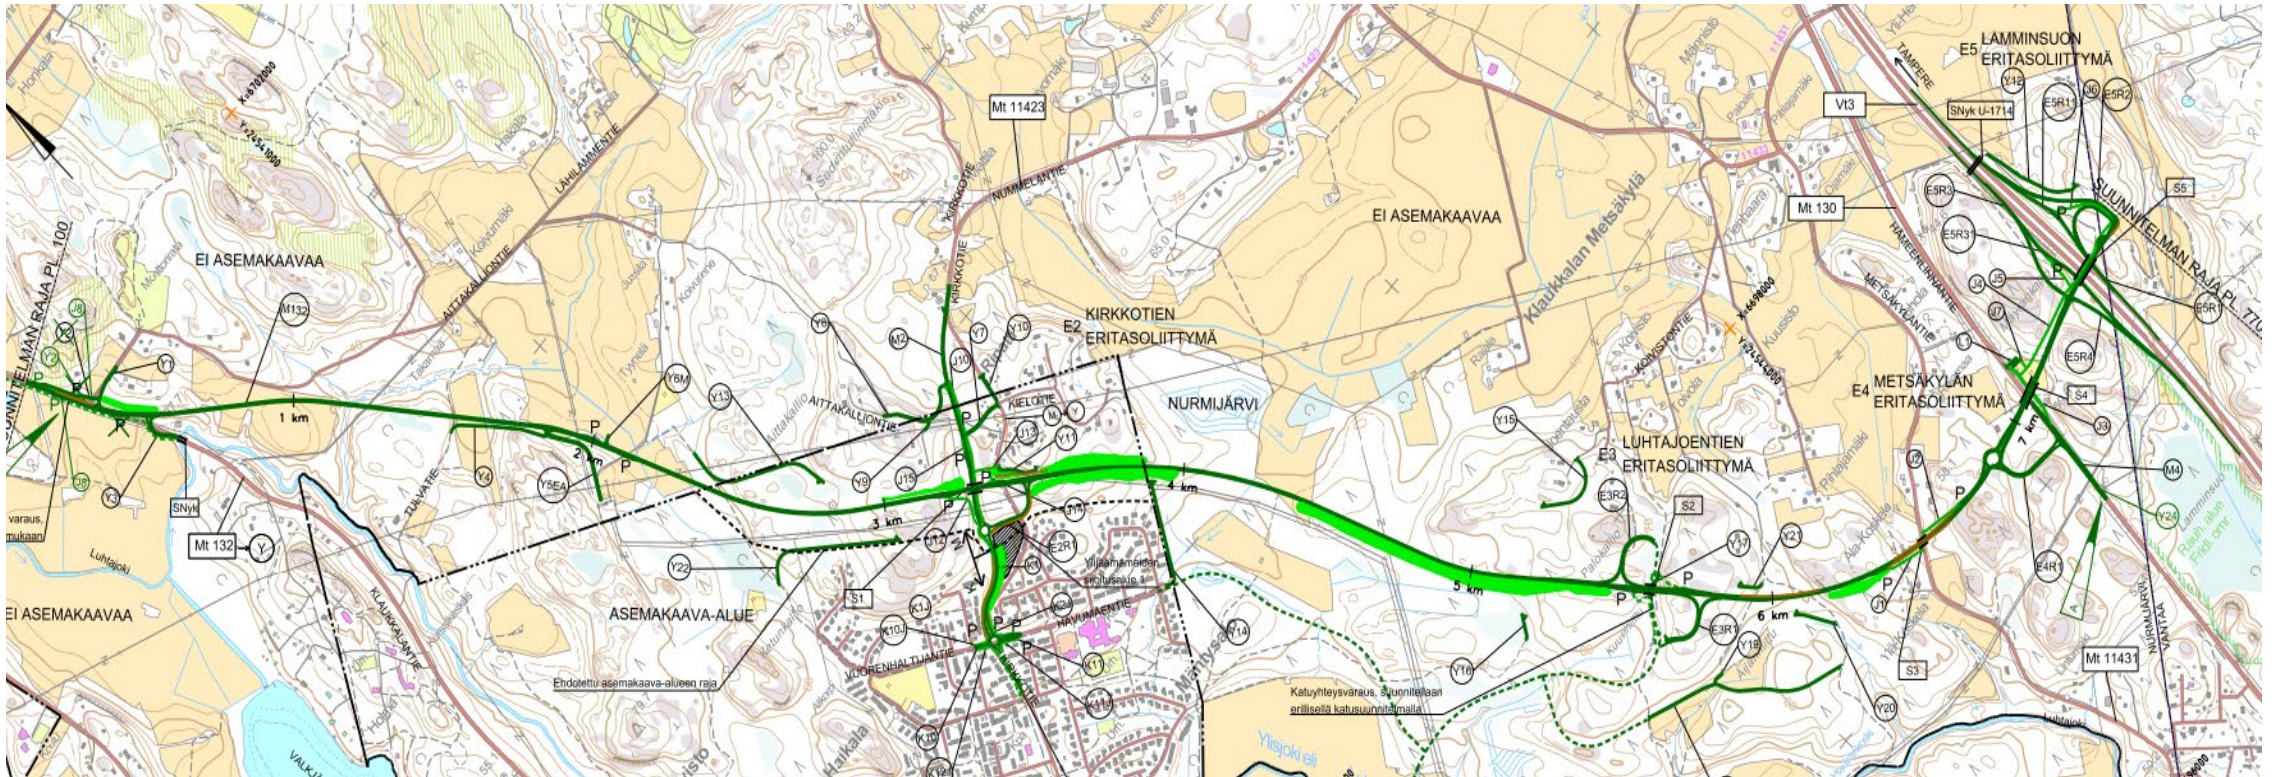

Aiheina mm.

- Hankkeen työtilanne tällä hetkellä
- Hankkeella lähiaikoina tapahtuvaa
- Kirkkotien eritasoliittymän työtilanne
- Kirkkotien alueen alkavat työt lähiaikoina
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt hankkeella



Hankkeen työtilanne

- Rakennustyöt maastossa alkoivat 02/2019
- Hyötypuusto ja kannot poistettu kaava-alueen ulkopuoliselta alueelta
- Sähkönlinjan siirrot tehty Hämeenlinnantiellä ja Metsäkyläntiellä
- Työt käynnissä hankkeen länsi – ja itäpäässä
 - Länsiosassa tehdään pohjanvahvistuksia
 - Luhtajoen eritasoliittymän itäpuolella tehdään maan- ja kallionleikkaustöitä
 - Talonpurkuja Metsäkyläntiellä ja Havumäentiellä
 - Metsäkyläntien risteyssillan (S3) telineen rakentamista
 - Metsäkylän risteyssillan (S4) anturoiden rakentamista
 - PIMA-puhdistukset tehty Hämeenlinnantien ympäristössä



- Louhintatöistä tehty n. 20 %
- Maanleikkauksista tehty n. 15%
- Työmaan vahvuus n. 50 henkilöä
 - Kaivinkoneita 17 kpl
 - Dumppereita 7 kpl
 - Poravaunuja 3-4 kpl
 - Lisäksi pyöräkuormaaja, jyriä, puskukoneita




Hankkeella lähiaikoina tapahtuvaa

- Työnaikaiset liikennejärjestelyt Vt 3:lle, vko 20. Nopeusrajoitus 80 km/h
- Louhinnan aiheuttamia liikenteenpysäytyksiä moottoritieellä, alkaen vko 21
- Metsäkyläntien RS teline- ja muottityöt jatkuvat, kannen betonointi 07/2019
- Metsäkylän RS välitukien sekä teline- ja muottitöitä, kannen betonointi 09/2019
- Vt 3:n ylittävän Lamminsuon RS työt alkavat porapaalutuksella toukokuun lopussa




- Maanleikkaus ja louhintatyöt etenevät idän suunnasta kohti Kirkkotietä
- Louhinta etenee moottoritien lähialueille → liikenteen pysäytyksiä vt 3
- Nurmijärven Veden linjasiirrot hankealueella käynnistyvät kesällä.
- Johtosiirrot aloitetaan Aittakalliontien kohdalla hankkeen länsipäässä.

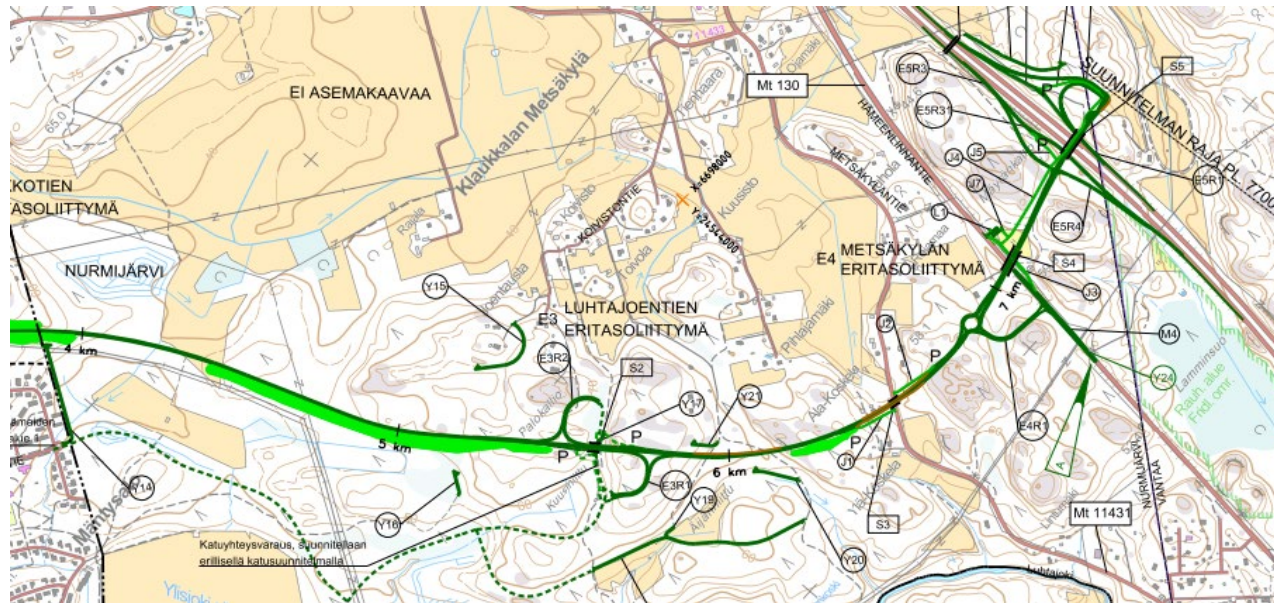

Kirkkotien eritasoliittymän työtilanne

- Hyötypuuston poisto käynnissä
- Kiinteistökatselmukset lähimpiin kiinteistöihin tehty
- Vesinäytteiden ottaminen lähimmistä kaivoista käynnissä
- Nurmijärven Sähkön linjasiirrot ovat käynnistyneet

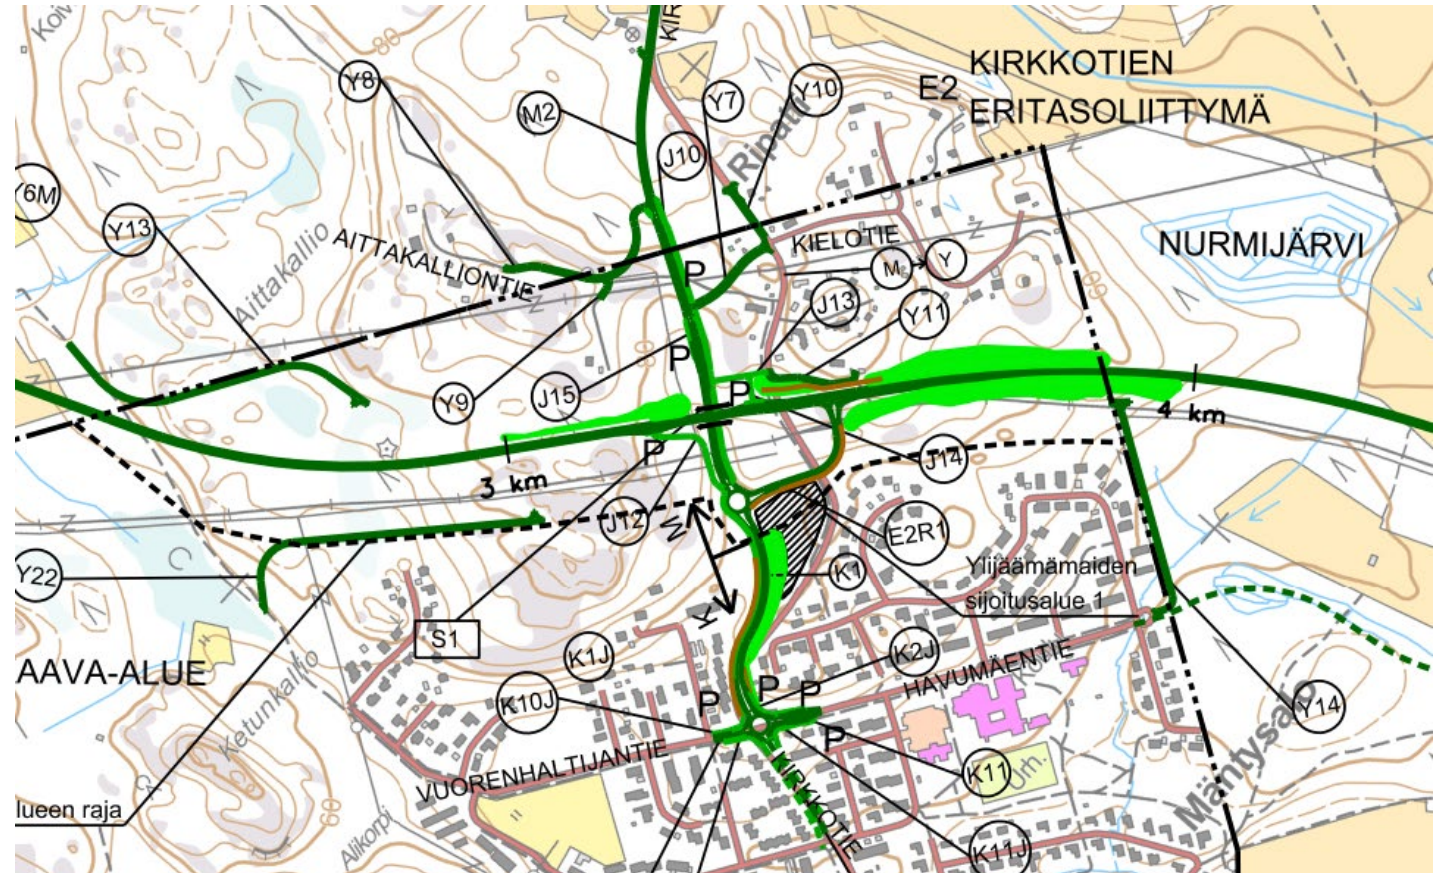



Kirkkotien eritasoliittymän alkavat työvaiheet tiealueella

- Kantojen ja pienpuuston poisto kesäkuun alussa
- Pintamaan poisto ja maanleikkaus → kaivuumassat meluvalleihin
- Louhintatyöt → määrä n. 80 000 m³kr
- Kirkkotien risteyssillan rakennustyöt, kannen betonointi vuoden lopussa.
- PIMA-puhdistus




Työnaikaiset liikennejärjestelyt hankkeella

- Vt 3 alennettu nopeusrajoitus (80 km/h), työnaikaisia pysäytyksiä
- Hämeenlinnantie (mt 130) alennettu nopeusrajoitus, työnaikaiset liikennevalot massansiirtoliikennettä varten. Käytössä vuoden 2019 loppuun.
 - Erikoiskuljetukset kiertotielle kesän aikana
- Metsäkyläntiellä työnaikaiset liikennevalot, käytössä vuoden loppuun.
- Kirkkotielle asennetaan kesäkuun aikana työnaikaiset liikennevalot, käytössä ensi kevääseen.



- Katualueelle ei merkittäviä liikennejärjestelyjä tämän vuoden puolella. Rakentaminen tapahtuu v. 2019 pääosin nykyisen Kirkkotien sivussa.
- Ensi keväänä muutoksia jalankulku- ja pyöräilyliikenteeseen Havumäentien kiertoliittymän rakentamisen aikana.

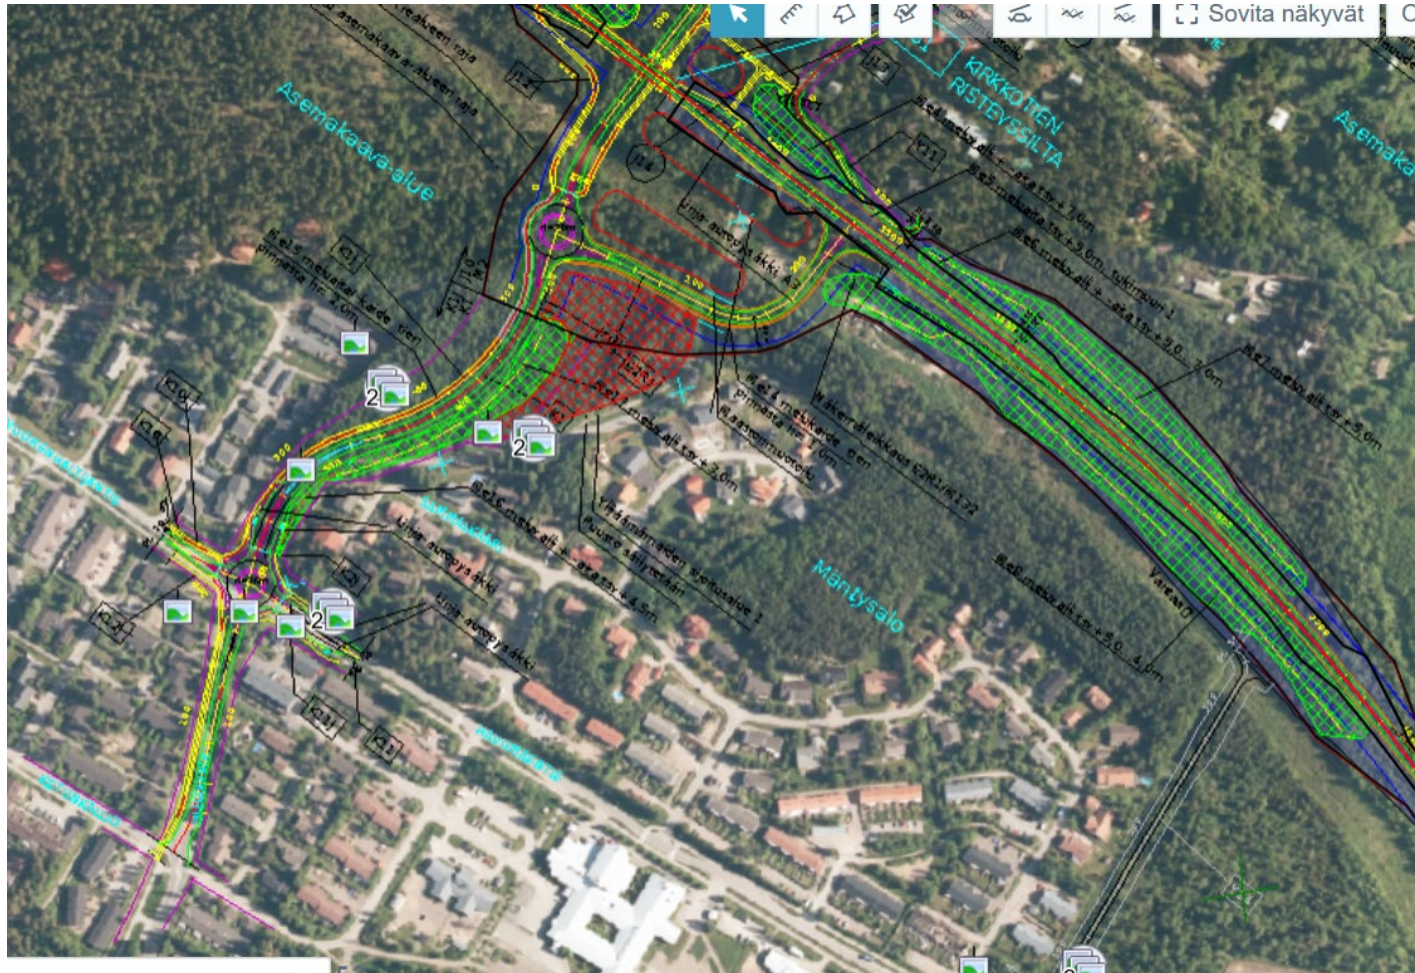

Kiitoksia mielenkiinnosta

