

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka



Kuukausiraportti nro 2/2018
Tarkastelujakso: 1.6.2018 - 30.6.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

4.7.2018

1 Hankkeen yleiskatsaus

Rakennusurakkaa on valmisteltu kesäkuun aikana. Tarjoajat jättäneet osallistumishakemukset SokoPro:hon. Tarjoajiksi hyväksytyt seuraavat:

- Destia Oy
- Graniittirakennus Kallio Oy
- Kreate Oy
- SRV Infra Oy
- YIT Rakennus Oy

Hyväksytyille tarjoajille on lähetetty kutsu jättää tarjous sekä julkaistu lisäkirje 2 19.6.2018 SokoPro:ssa.

Tarjoajatapaamiset pidetty 27-28.6.2018 Nurmijärvellä.

Purettavien rakennusten asbesti- ja haitta-ainekartoitukset on suoritettu kesäkuussa.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

2 Aikataulu

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt päästään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Kilpailutuksen ja urakan suunniteltu aikataulu:

- Tarjouksien sisäänjätto on 3.9.2018.
- Kehitystyöpajat tarjoajille järjestetään 4.9.2018 Pasilassa.
- Hankintapäätös 14.9.2018 mennessä.
- Kehitysvaihe loka-marraskuu 2018
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuun 2018

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen.

3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.6.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	988 933,22 €	309 049,76 €	1 297 982,98 €
	Toteutuneet kustannukset	249 600,50 €	78 296,93 €	327 897,43 €

4.7.2018

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuutus on 42 M€.

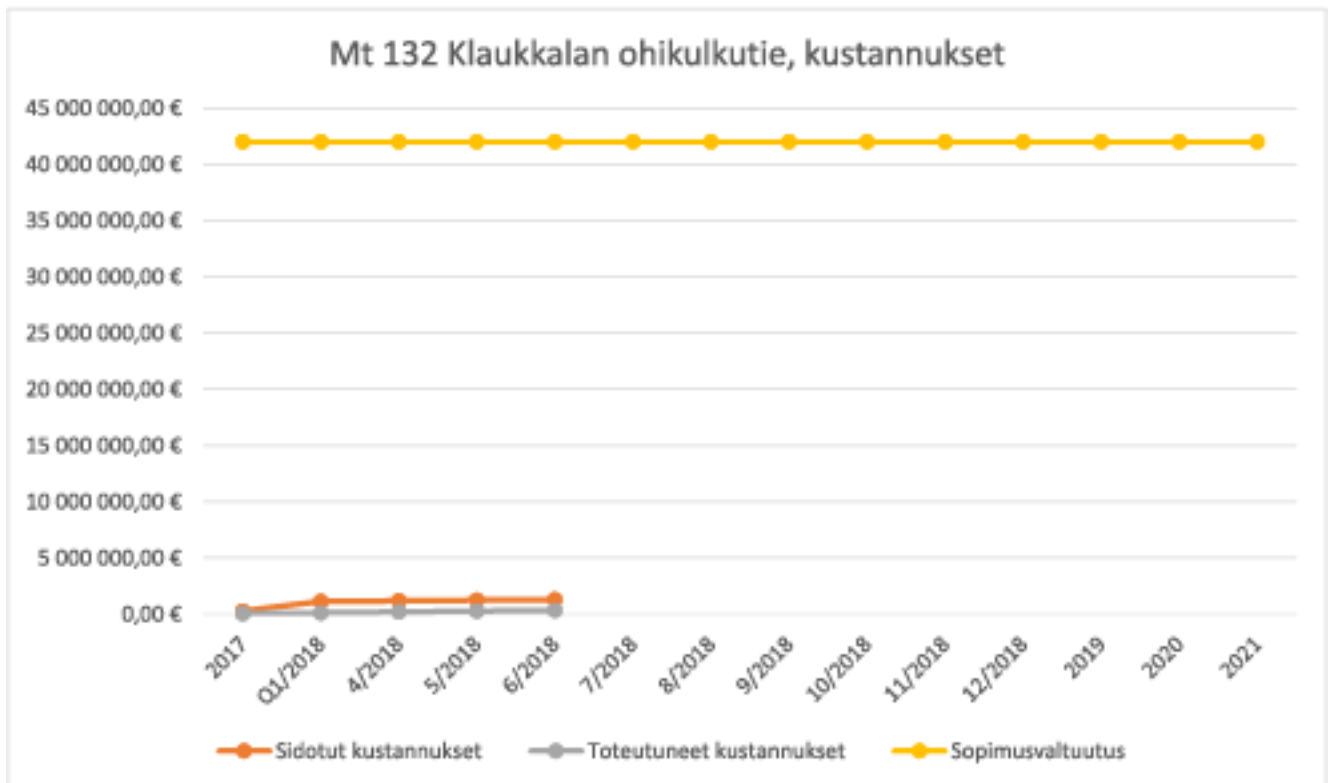

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 6/2018

4 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
