


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

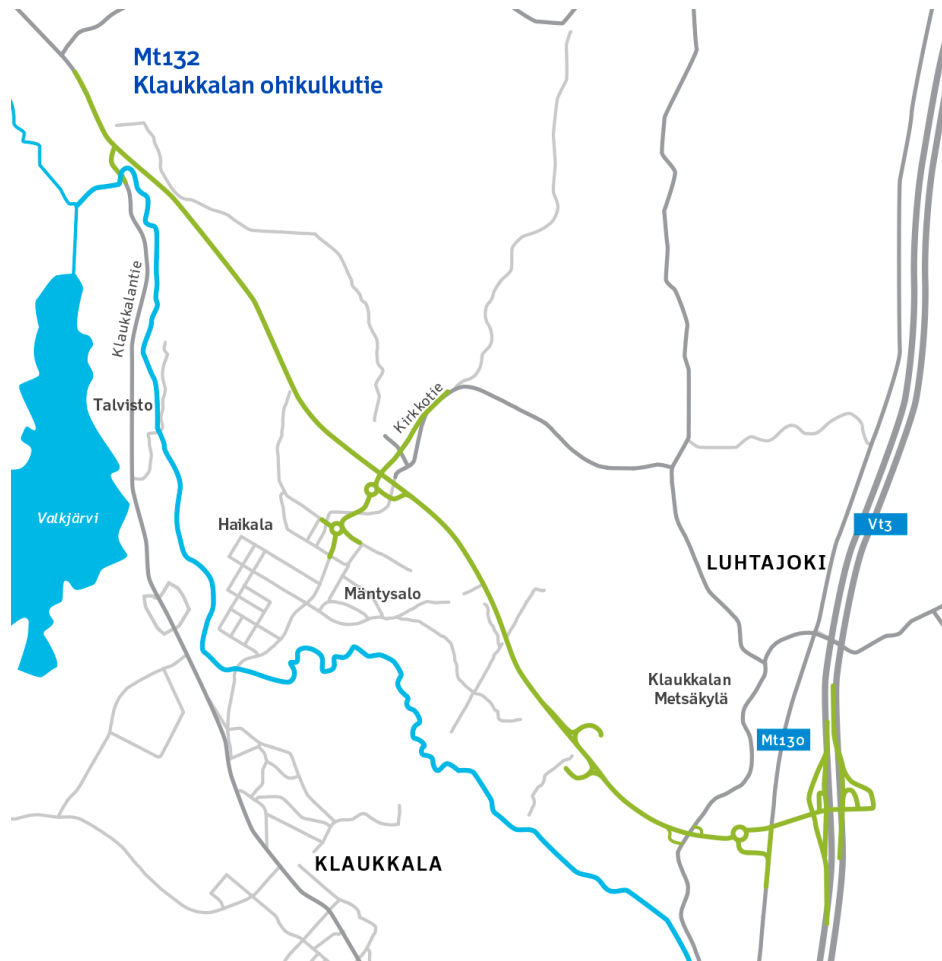

Kuukausiraportti nro 7/2018
Tarkastelujakso: 1.11.2018 - 30.11.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

5.12.2018

1 Hankkeen yleiskatsaus

Puuston poisto on aloitettu urakka-alueella. Hankkeen kilpailuttamana urakoitsijana toimii L&T Biowatti Oy.

Hanke-alueella tehty ensimmäinen ilmakuvaus.

Asukastilaisuus pidetty 27.11.2018 Klaukkalan Monikossa.

Pohjavesiputkien seuranta mittauksia on suoritettu jälleen marraskuussa. Seurantamittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

2 Aikataulu

STk- urakan kehitysvaihe on käynnistynyt. Kehitysvaiheessa eri työryhmissä on valmisteltu urakkaa, jotta voidaan käynnistää toteutusvaihe. Toteutusvaihe käynnistyy alustavasti joulukuussa 2018.

Rakennustyöt maastossa alkavat helmikuussa 2019.

Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu kehitysvaiheessa.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.11.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	1 042 852,05 €	325 901,52 €	1 368 753,57 €
	Toteutuneet kustannukset	389 189,03 €	121 626,24 €	510 815,27 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

5.12.2018

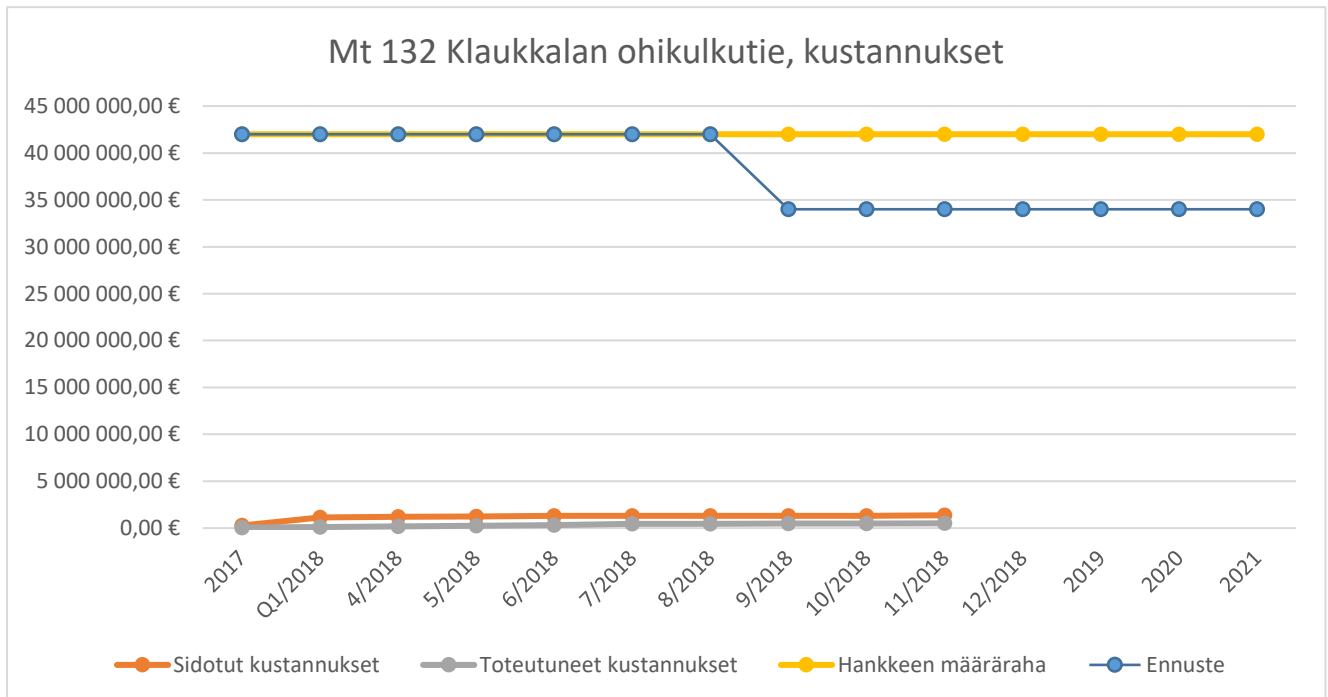

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 11/2018

4 Muut asiat

Hankkeelle on omat Facebook-sivut, jossa julkaistaan tiedotteita hankkeen etenemisestä sekä tietoa STk-urakkamallista. Hankkeen löytää Facebook:sta nimellä " Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie".

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
