




Väylävirasto
Trafikledsverket

LIVI/1668/02.01.01/2018

2.12.2021

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

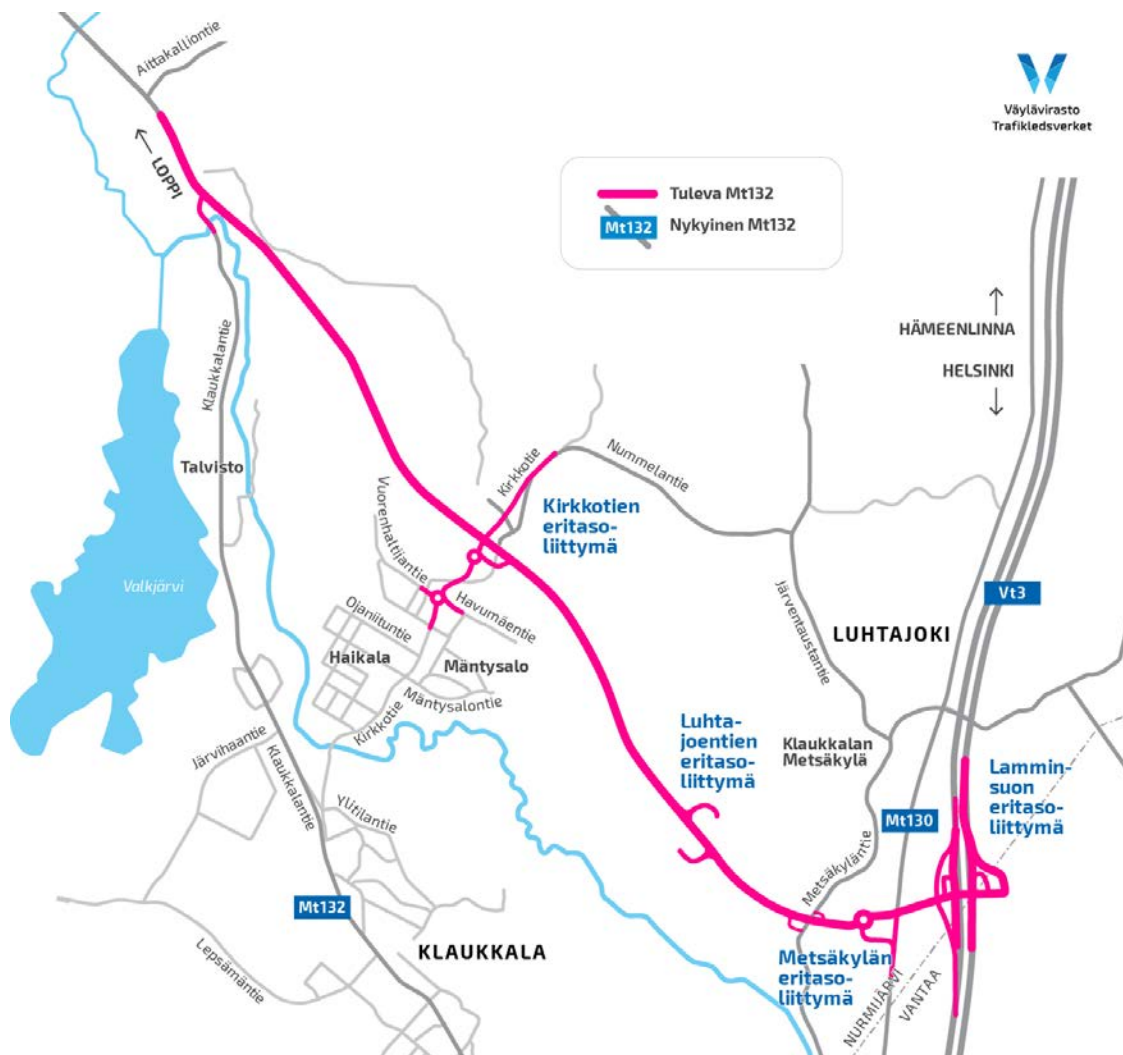

Kuukausiraportti nro 11/2021
Tarkastelujakso: 1.11.2021 – 30.11.2021

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

2.12.2021

1 Hankkeen yleiskatsaus

Mt 132 Klaukkalan kehätien STk-urakan takuvaiheen seuranta käynnissä.

Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 2.11.2021.

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtaturmia marraskuussa.

Tapaturmataajuus marraskuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden).

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy

Takuuvaiheen seuranta on käynnissä.

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana Normiopaste Oy



Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 2.11.2021. Järjestelmän toiminnan varmistus- ja säätöjakso on käynnissä.

2.12.2021

3 Aikataulu

STk-urakan takuu-aika on käynnissä. Lisäksi vuonna 2023 tehdään urakassa vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle. Urakan takuu-aika päättyy 25.1.2026.

Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otettu käyttöön 2.11.2021. Järjestelmän toiminnan varmistus- ja säätöjakso (ohjelmiston-, tietoliikenneverkon- ja laitteiden seurantajakso) on käynnissä 8/2022 asti. Urakan vastaanottotarkastus pidetään elokuussa 2022. Hyväksytyin vastaanottotarkastuksen jälkeen alkaa urakan 2 vuotta kestävä takuu-aika.


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.11.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

Yhteiset		Väylävirasto	Nurmijärvi	ITM Finland Oy	YHTEENSÄ
		Sidotut kustannukset	24 306 586,37 €	8 098 417,68 €	1 393 847,79 €
	Toteutuneet kustannukset	22 840 664,48 €	7 578 696,80 €	1 328 350,26 €	31 747 711,54 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen alkuperäinen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,8 M€

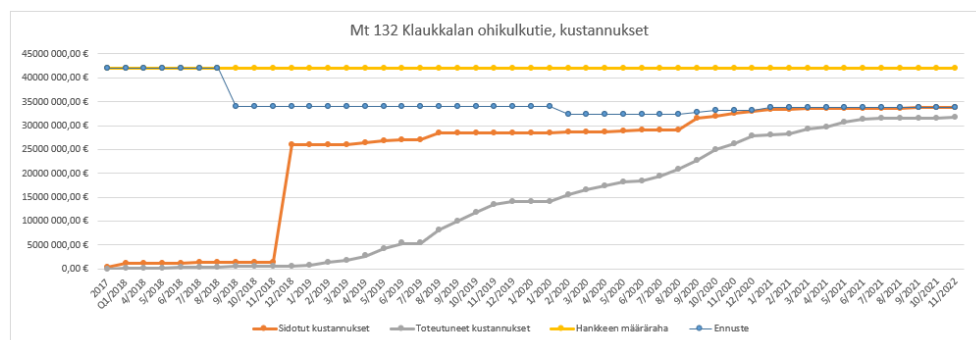

Kuva 1. Koko hankkeen kustannukset 11/2021

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
