


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

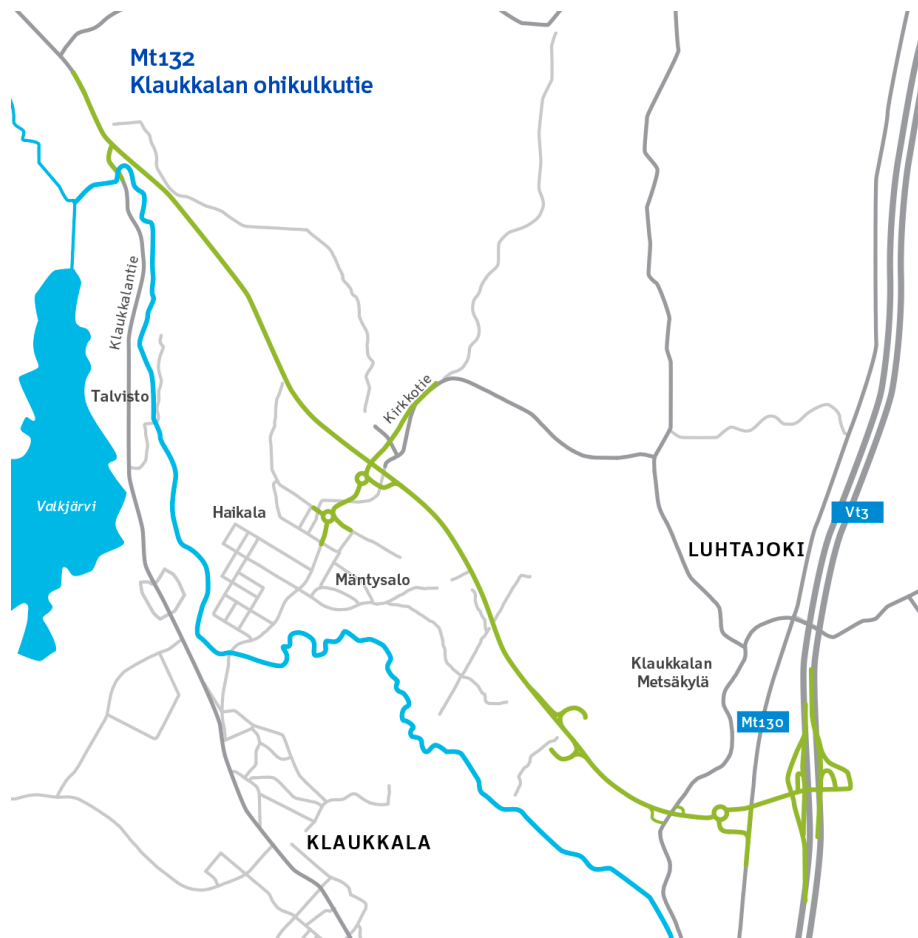

Kuukausiraportti nro 4/2019
Tarkastelujakso: 1.4.2019 - 30.4.2019

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

7.5.2019

1 Hankkeen yleiskatsaus

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella.

Urakoitsija on pitänyt yhteistyöpalaverin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa 25.4.2019.

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnitelun kilpailutus on käynnissä.

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo huhtikuulta on 95,5.

Metsäkyläntien tulevan eritasoliittymän ja Vanhan Hämeenlinnantien välissä on rikkoutunut työmaalla ajaneen kuorma-auton polttoainetankki huhtikuun aikana. Tankki rikkoutui sen osuessa maahan ja säiliön sisältö valui työmaalle. Tarvittavat ilmoitus- ja puhdistustoimenpiteet on suoritettu.

Hankkeella ei ole sattunut huhtikuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yhteensä hankkeella on sattunut 1 työtapaturma, joka ei ole aiheuttanut työntekijälle sairauspoissaolopäiviä.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Siltatyöt

Metsäkyläntien ylittävän sillan pilarimuottityöt on saatu valmiiksi. Sillan pilarit on valettu 26.4.2019.



Kuva 1. Sillan pilareiden valu käynnissä.

7.5.2019

Hämeenlinnantien (Mt 130) ylittävän sillan rakennustyöt on alkanut huhtikuun aikana.

Väylätyöt

Kirkkotien maantiealueen puustonpoistotyöt ovat alkaneet.

Pystysalaojitustyöt käynnissä Tulvatien ja Aittakalliontien välisellä alueella.



Kuva 2. Louhinta- ja maanrakennustyöt käynnissä.

Louhintatyöt ja työmaateiden teko jatkuu urakka-alueella. Louhintatöiden vuoksi valtatie 3 sekä maantien 130 liikenne joudutaan katkaisemaan räjäytyksien ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia.

Maanleikkaus- ja pengertöitä on tehty mm. Hämeenlinnantien (Mt 130) varrella ja Metsäkyläntien alueella.

3 Aikataulu

Kirkkotien varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät toukokuussa 2019. Puustonpoisto on alkanut alueella huhtikuussa.

Metsäkyläntien ylittävän sillan peruslaattojen työt käynnistyvät toukokuun alussa.

7.5.2019

Metsäkyläntien ylittävän sillan peruslaattojen työt käynnistyvät toukokuun alussa.

Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeista on valmistunut. Pilaantuneen maan puhdistustyöt ovat alkamassa Metsäkyläntien eritasoliittymän kohdalla.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.4.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

Yhteiset		Väylävirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
	Sidotut kustannukset	20 060 390,91 €	6 269 036,72 €	26 329 427,63 €
Toteutuneet kustannukset	2 084 821,11 €	651 531,31 €	2 736 352,42 €	

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

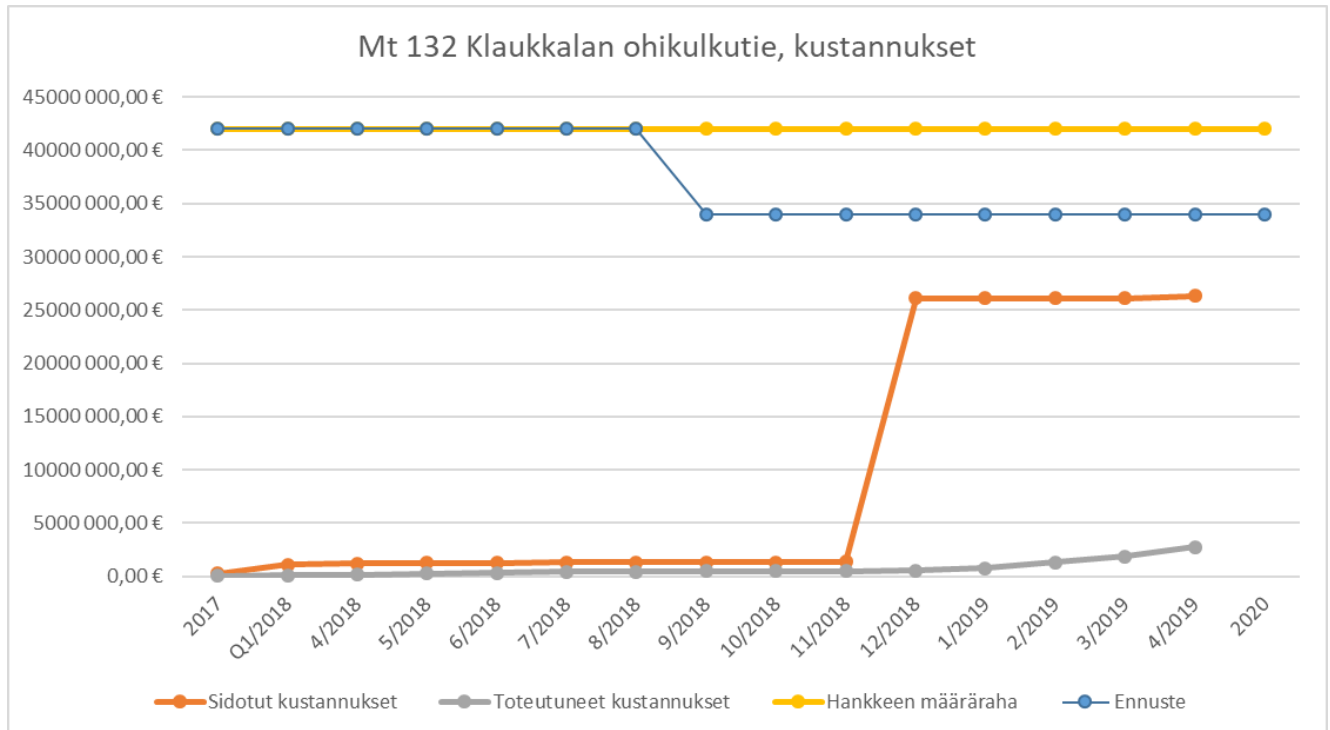

Kuva 3. Hankkeen kustannukset 4/2019

7.5.2019

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
