


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

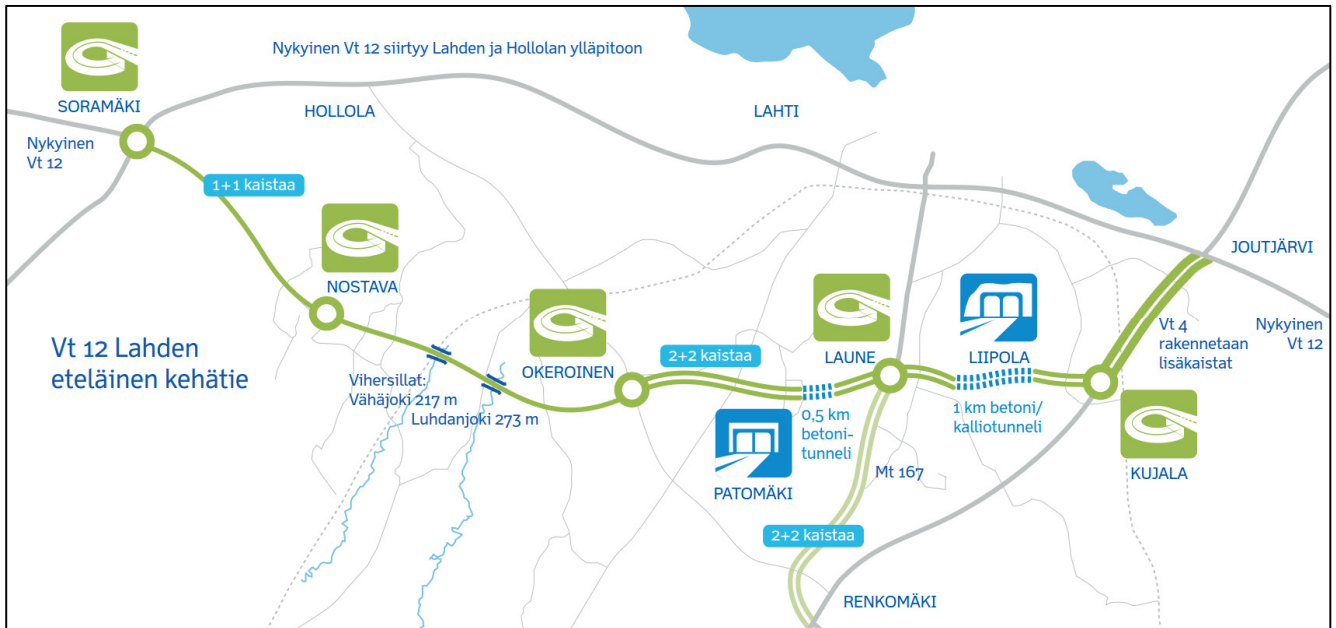

Kuukausiraportti nro 7/2017
Tarkastelujakso: 1.7.2017 - 31.7.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

3.8.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous Lahdessa 4.7.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, tarjoajakohtaiset hanke-esittelyt 5.-6.7.2017 Lahdessa
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuskatselmus 7.7.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuksen allekirjoitus 13.7.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Lisäkirje 2 13.7.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK4 18.7.2017

Tulevat tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous 8.8.2017 Lahdessa
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, Turvallisuuden aloituskokous, 21.8.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK5 22.8.2017
- Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjoukset sisään 27.9.2017

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus

Tilaaaja: Työpanos 1,5 henkilötyökuukautta (htkk)
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 3htkk

Hankeosa 1A Urakoitsijat:	Henkilöstövahvuus
Taratest Oy	3 kairakonetta
Hankeosa 1B Urakoitsijat:	Henkilöstövahvuus
Taratest Oy	6 kairakonetta
Hankeosa 2: Urakoitsijat:	Resurssivahvuus
Suomen Maastorakentajat Oy	26 henkilöä, joista Lahden seudulta 15 henkilöä

Hankeosa 1A ST-Hollola

ST-urakka on kilpailutuksessa. Lisäkirje 2 on lähetetty 13.7.2017.

3.8.2017

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Liikennevirasto ja Skanskan ja Pöyryn muodostama konsortio ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Lahden eteläisen kehätien Lahden pään hankkeesta 13.7.2017.

Maastossa on käynnissä täydentävät pohjatutkimukset.

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat urakoitsijan ilmoituksen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa.



Kuva 1. Kiertotie 24 on otettu käyttöön

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

4 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.7.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

3.8.2017

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	20 023 599,56 €	7 008 259,85 €	778 695,54 €	27 810 554,94 €
Toteutuneet kustannukset	1 841 660,57 €	466 404,95 €	71 329,76 €	2 379 395,28 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

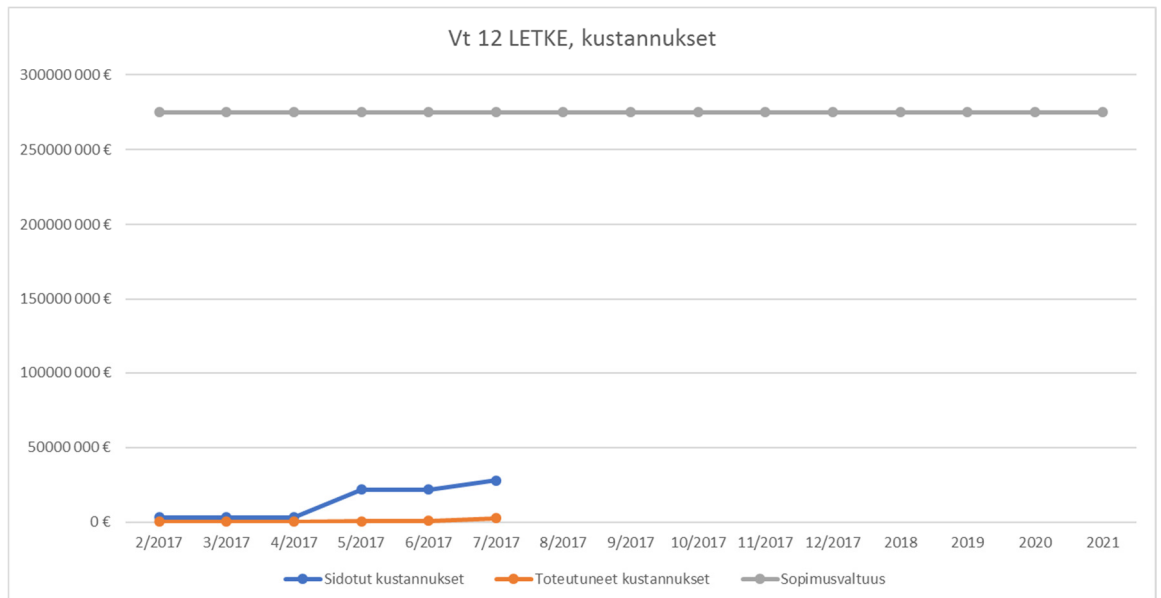

Kuva 2. Hankkeen kustannukset 7/2017

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>
