


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

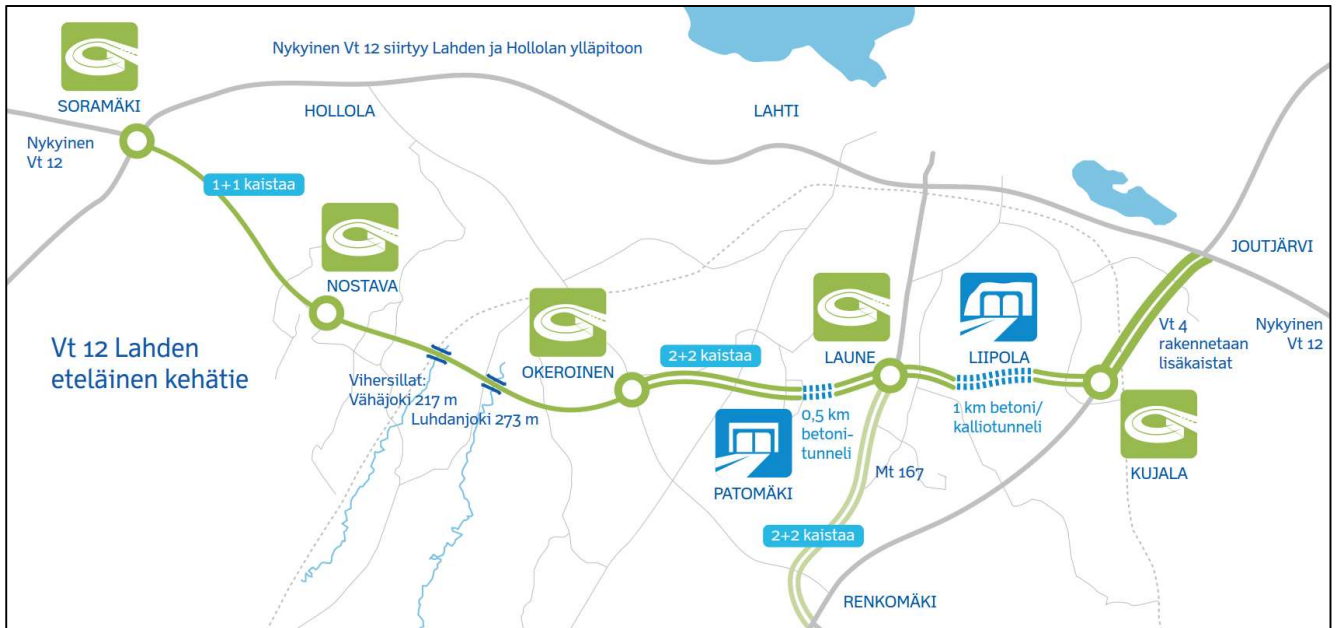

Kuukausiraportti nro 4/2017
Tarkastelujakso: 1.4.2017 - 30.4.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

28.4.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous 4.4.2017 Lahdessa
- Vt12 Letke, E4 Nikula ETL hankeryhmän kokous 7.4.2017 Liikennevirastossa
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjousten jättö 12.4.2017 (tarjousaikaa jatkettu kaksi päivää)
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen toteuttajaksi on valittu Suomen Maastorakentajat Oy, hankintapäätös 13.4.2017 ja sopimuskatselmus 24.4.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, hankintailmoitus 18.4.2017
- Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 12, 26.4.2017

Tulevat tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous 2.5.2017 Lahdessa
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Pohjatutkimusten työmaakokous 2.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, Pohjatutkimusten turvallisuuden aloituskokous 2.5.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie rakentaminen alkaa, urakkasopimuksen allekirjoitus, turvallisuuden aloituskokous ja TMK 1 4.5.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, operaattorikokous Lahdessa 9.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi työpajat 10-12.5.2017 ja 15.5.2017
- Vt 12 Letke, aloitustilaisuus 16.5.2017
- Vt 12 Letke, Tiedotustilaisuus Lahdessa 17.5.2017 ja Hollolassa 18.5.2017
- Vt 12, Letke, E4 Nikulan ETL hankekokous nro 2 Lahdessa 19.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Osallistumishakemukset sisään 22.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Tarjouspyyntöjen lähetys 24.5.2017

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus

Tilaaaja: Työpanos 3 henkilötyökuukautta (htkk)
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4,5 htkk

28.4.2017

Hankeosa 1A Urakoitsijat:	Henkilöstö- vahvuus
Taratest Oy	7 htkk
Hankeosa 1B Urakoitsijat:	Henkilöstö- vahvuus
Ei toimijoita	0
Hankeosa 2: Urakoitsijat:	Henkilöstö- vahvuus
Ei toimijoita	0

Hankeosa 1A ST-Hollola

Urakkahankinta on käynnissä, hankintailmoitus on julkaistu 18.4.2017. Pohjatutkimukset ovat käynnissä.



Kuva 1. Pohjatutkimuksia hankeosalla 1A

28.4.2017

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Urakkahankinta on käynnissä.

Hankeosan 1B tarjouspyyntöä on täsmennetty kahdella lisäkirjeellä. Lisäkirje 1 lähetettiin pvm 13.4.2017 ja lisäkirje 2 lähetettiin pvm 21.4.2017.

Hankeosa 2 KU – Mt 167

Hankintapäätös urakoitsijasta on tehty 13.4.2017 ja sopimuskatselmus on pidetty 24.4.2017. Urakka käynnistyy toukokuussa.

Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen rakentamisen muutostyötilaus koskien kuivatusta on tehty 10.4.2017. Lisätyönä tehtävät rumpuputket on asennettu.

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 24.4.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	2 643 912,72 €	925 369,45 €	102 818,83 €	3 672 101,00 €
Toteutuneet kustannukset	86 728,19 €	3 649,01 €	1 867,68 €	92 244,88 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLF-fX-5j0>
