


## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

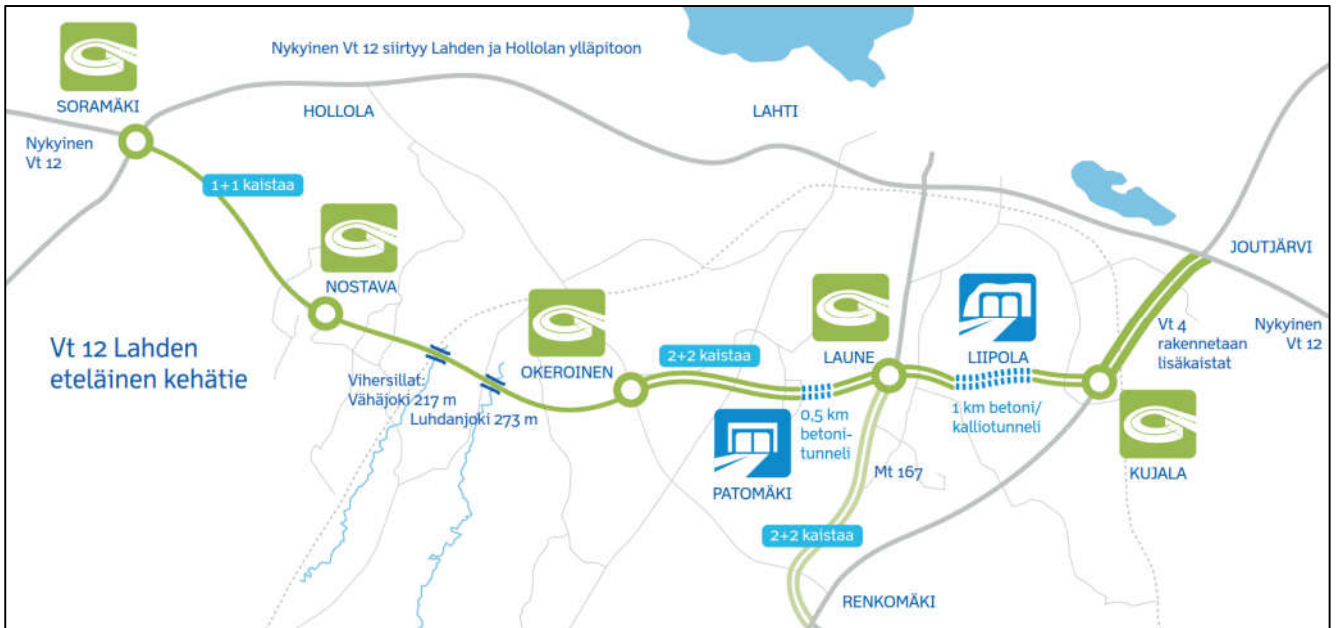

**Kuukausiraportti nro 5/2017**  
**Tarkastelujakso: 1.5.2017 - 31.5.2017**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Liikennevirasto**

2.6.2017

## 1 Ajankohtaiset asiat

### Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous Lahdessa 2.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Pohjatutkimusten työmaakokous 2.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, Pohjatutkimusten turvallisuuden aloituskokous 2.5.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, urakkasopimuksen allekirjoitus, turvallisuuden aloituskokous ja TMK 1 4.5.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, rakentaminen maastossa alkanut 8.5.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi työpajat 10-12.5.2017 ja 15.5.2017
- Vt 12 Letke, aloitustilaisuus 16.5.2017
- Vt 12 Letke, Tiedotustilaisuus Lahdessa 17.5.2017 ja Hollolassa 18.5.2017
- Vt 12, Letke, E4 Nikulan ETL hankekokous nro 2 Lahdessa 19.5.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK2 24.5.2017

### Tulevat tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous 6.6.2017 Lahdessa
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi työpajat 12-13.6.2017 ja 15-16.6.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK3 22.6.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, Hintatarjoukset sisään 27.6.2017
- Vt 12, Letke, E4 Nikulan ETL hankekokous nro 3 Lahdessa 29.6.2017
- Vt 12, Letke, Hankkeen viestintäpalaveri 29.6.2017

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### **Henkilöstövahvuus**

Tilaaaja: Työpanos 4,5 henkilötyökuukautta (htkk)  
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 5,5 htkk

2.6.2017

<b>Hankeosa 1A Urakoitsijat:</b>	<b>Henkilöstö- vahvuus</b>
Taratest Oy	8 htkk
<b>Hankeosa 1B Urakoitsijat:</b>	<b>Henkilöstö- vahvuus</b>
Ei toimijoita	0
<b>Hankeosa 2: Urakoitsijat:</b>	<b>Henkilöstö- vahvuus</b>
Suomen Maastoraken- tajat Oy	4,5 htkk

### **Hankeosa 1A ST-Hollola**

Urakkahankinta on käynnissä.

Osallistumishakemusten perusteella on valittu neljä yritystä tai työyhteisöä, joilta pyydetään tarjoukset Lahden eteläisen kehätien Hollolan pään, eli hankeosan 1A, toteutuksesta. Valitut tarjoajat ovat Graniittirakennus Kallio Oy, Skanska Infra Oy, Destia Oy ja TYL HOLA (YIT Rakennus Oy, Kreate Oy).

### **Hankeosa 1B Allianssi-Lahti**

Urakkahankinta on käynnissä.

Liikennevirasto on tehnyt 31.5.2017 valinnan kahdesta tarjoajakonsortioista, jotka jatkavat Lahden eteläisen kehätien Lahden pään, eli hankeosan 1B, toteutuksen tarjouskilpailuun. Valinta tehtiin toukokuussa käytyjen Allianssi työpajojen perusteella ja valitut tarjoajat ovat:

- LATU (Lemminkäinen Infra Oy ja WSP Finland Oy)
- VALTARI (Skanska Infra Oy ja Pöyry Infra Oy)

Neuvottelut kahden tarjoajan kanssa jatkuvat kesäkuussa.

### **Hankeosa 2 KU – Mt 167**

Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.5.2017 ja työt maastossa ovat käynnistyneet 8.5.2017.

2.6.2017



Kuva 1. Kiertotien rakentaminen Launeen ETL

### 3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

### 4 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 31.5.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	15 606 692,04 €	5 462 342,21 €	606 926,91 €	21 675 961,17 €
Toteutuneet kustannukset	431 387,42 €	46 043,90 €	16 749,74 €	494 181,06 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

2.6.2017

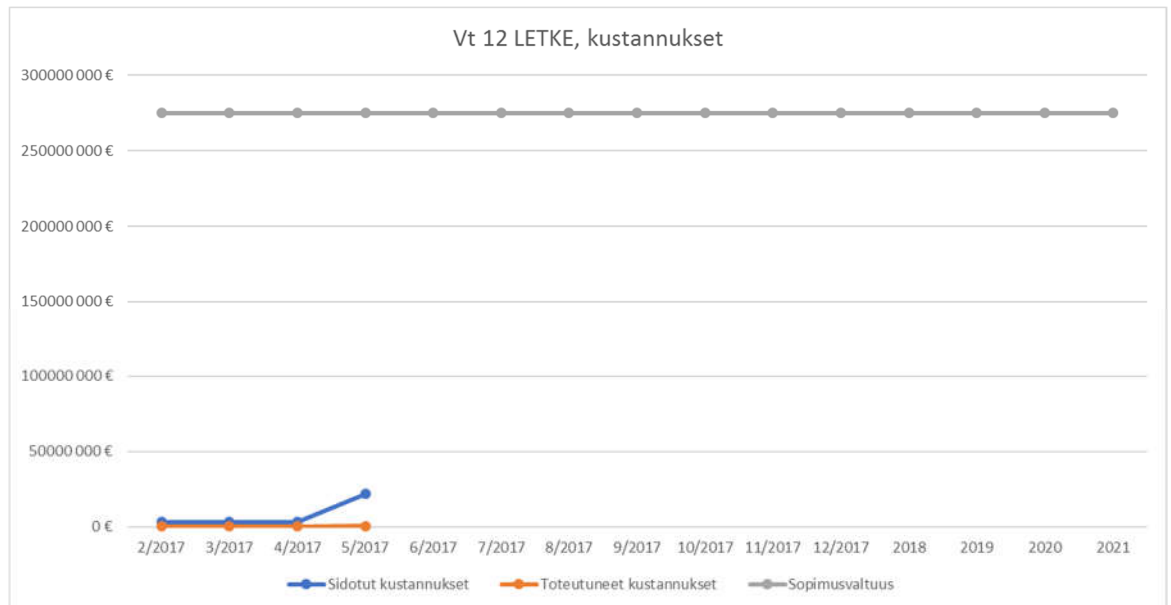

Kuva 2. Hankkeen kustannukset 5/2017

## 5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>
