


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

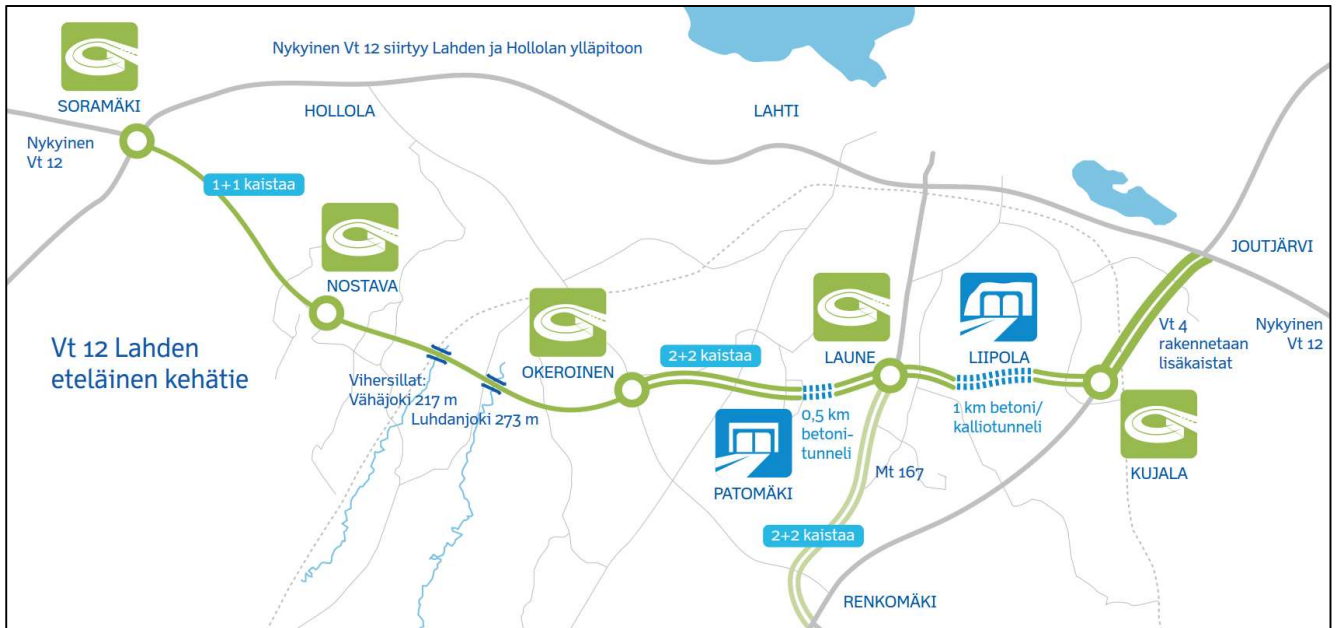

Kuukausiraportti nro 2/2017
Tarkastelujakso: 1.2.2017 - 28.2.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

2.3.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Vt 12 Letke, projektiryhmän kokous 7.2.2017
- Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 10, 14.2.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A, maaperämallin päivitys, pohjatutkimusten tarjoukset ja hankintapäätös 20.2.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B allianssiurakka, hankintailmoitus ja alustava tarjouspyyntö julkaistu 21.2.2017
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistu 23.2.2017

Tulevat tapahtumat

- Mt167 RS, Hankeryhmän kokous nro 11, 1.3.2017
- Projektiryhmän kokous 6.3.2017 Lahdessa
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi ehdokasneuvottelut 9.-10.3.2017 Liikennevirastossa
- Viestintäpalaveri 13.3.2017 Lahden projektitoimistolla
- Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjoajakeskustelut Lahden projektitoimistolla 14.-15.3.2017
- Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, osallistumishakemusten jättö 27.3.2017

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Hankeosa 1A ST-Hollola

Urakkahankinnan valmistelu on käynnissä.

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Urakkahankinta on käynnissä.

Maaperämallin päivitys ja täydentävien pohjatutkimusten tarjoukset on saatu ja hankintapäätös on tehty 20.2.2017.

Hankeosa 2 KU – Mt 167

Urakkahankinta on käynnissä.

Liikennevirasto on pyytänyt ja saanut tarjouksen urakkaan liittyvästä valmistelutyöstä koskien Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen rakentamisesta uuden ajoradan puolelle. Erillishankinnan tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman pitkä esikuormitusaika kohteessa ennen liikenteelle ottoa.

2.3.2017



Kuva 1. Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen kohde

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

4 Kustannukset

Hankkeen toteutuneet kustannukset 28.2.2017 ovat: 20 782,25 €

Toteutuneet kustannukset muodostuvat rakennuttamispalvelun sopimuksesta. Liikennevirasto on maksanut kustannuksista 100%.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>
