


## Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

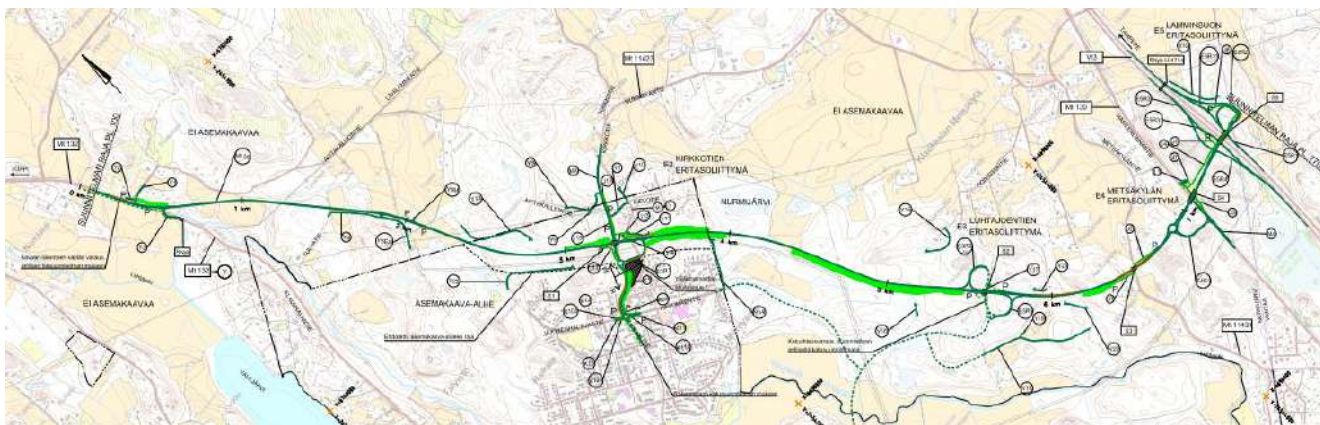

**Kuukausiraportti nro 1/2018**  
**Tarkastelujakso: 1.1.2018 - 31.5.2018**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Liikennevirasto**

5.6.2018

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammikuussa 2018. Konsulttisopimus on allekirjoitettu 16.2.2018 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa.

Täydentävä tiesuunnitelma (TTS) on laadittu kevään aikana, ja se on valmistunut 15.5.2018.

Rakennusurakkaa on valmisteltu kevään aikana. Hankintailmoitus on julkaistu 18.5.2018 HILMA:ssa. Urakka toteutetaan STk-mallilla (Suunnittele ja toteuta -urakka kehitysvaiheella).

Liikenteenhallintajärjestelmän (LIHA) toteuttaminen tehdään erillisenä urakkana.

Hankeessa ei ole sattunut tapaturmia.

## 2 Aikataulu

STk- urakan kilpailutus tapahtuu touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018. Rakennustyöt päästään käynnistämään joulukuussa 2018. Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

### Kilpailutuksen aikataulu:

Hankintailmoitus on lähetetty 18.5.2018. Tarjoajien tulee jättää osallistumishakemukset 18.6.2018 mennessä SokoPro:hon. Kutsu jättää tarjous on tarkoitus lähettää 19.6.2018.

Tarjoajatapaamiset järjestetään Nurmijärvellä 28-29.6.2018.

Tarjouksien alustava sisäänjätto on viikolla 36, tarkempi päivä tarkentuu myöhemmin.

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu urakoitsija valinnan jälkeen.

## 3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.5.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	957 928,46 €	299 360,52 €	1 257 288,98 €
	Toteutuneet kustannukset	220 545,74 €	68 923,94 €	289 469,68 €

5.6.2018

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuutus on 42 M€.

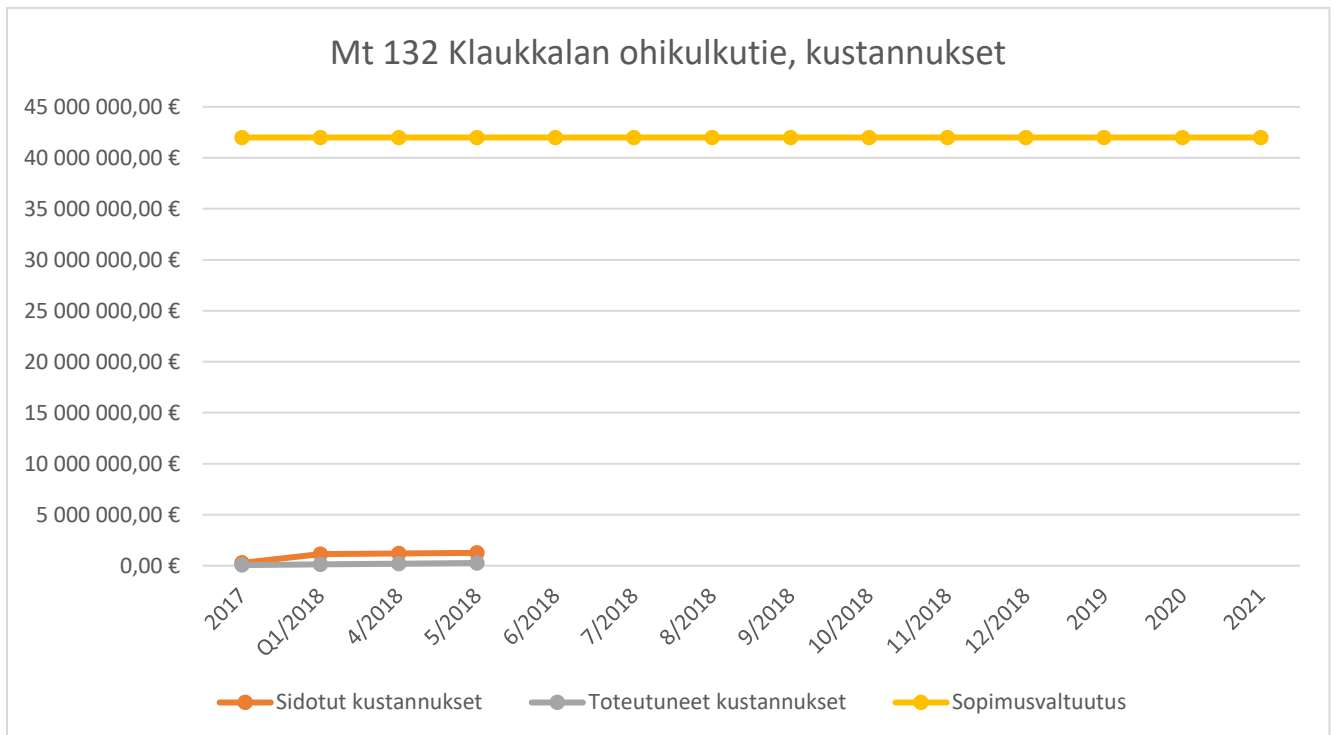

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 5/2018

#### 4 Muut asiat

Hankkeen viestintäkonsultiksi valittu Valve Group Oy.

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>

Tarkempaa viestintäsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.
