


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

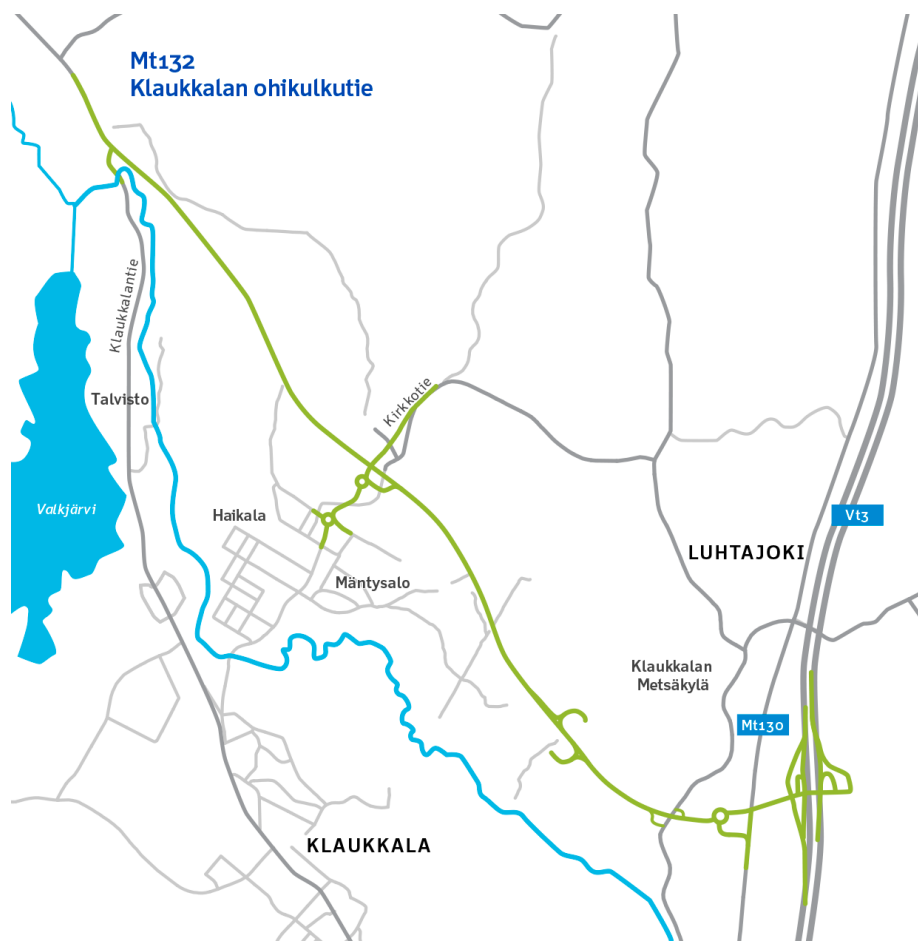

Kuukausiraportti nro 8/2018
Tarkastelujakso: 1.12.2018 - 31.12.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

4.1.2019

1 Hankkeen yleiskatsaus

Hankkeen kehitysvaihe on päättynyt. Tilaaja lunastanut optioehdon toteutusvaiheesta. Urakan toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu yhdessä Kreate Oy:n kanssa 21.12.2018.

Hankkeen jälki-ilmoitus julkaistu HILMA:ssa.

Metsäkylän ja Kirkkotien eritasoliittymien kohdalla tunnistettiin kaksi kohtaa, joissa aloitettiin PIMA-, eli pilaantuneen maan selvitykset. Selvitykset PIMA-tutkimuksista valmistuu tammikuun 2019 aikana.

Puuston poistoa jatkettu joulukuussa urakka-alueella.

Viimeinen pohjavesiputkien seuranta mittaus on suoritettu joulukuussa.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

2 Aikataulu

Toteutusvaihe on käynnistynyt 21.12.2018. Rakennustyöt maastossa alkavat helmikuussa 2019.

Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

3 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.12.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:


		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	19 873 107,95 €	6 210 510,96 €	26 083 618,91 €
	Toteutuneet kustannukset	403 227,99 €	126 013,53 €	529 241,52 €

Kustannuksiin liittyvät luvut ovat alustavia ja tarkentuvat, kun vuoden 2018 kirjanpito sulkeutuu. Täsmennetyt luvut julkaistaan seuraavassa kuukausi-raportissa.

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

4.1.2019

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

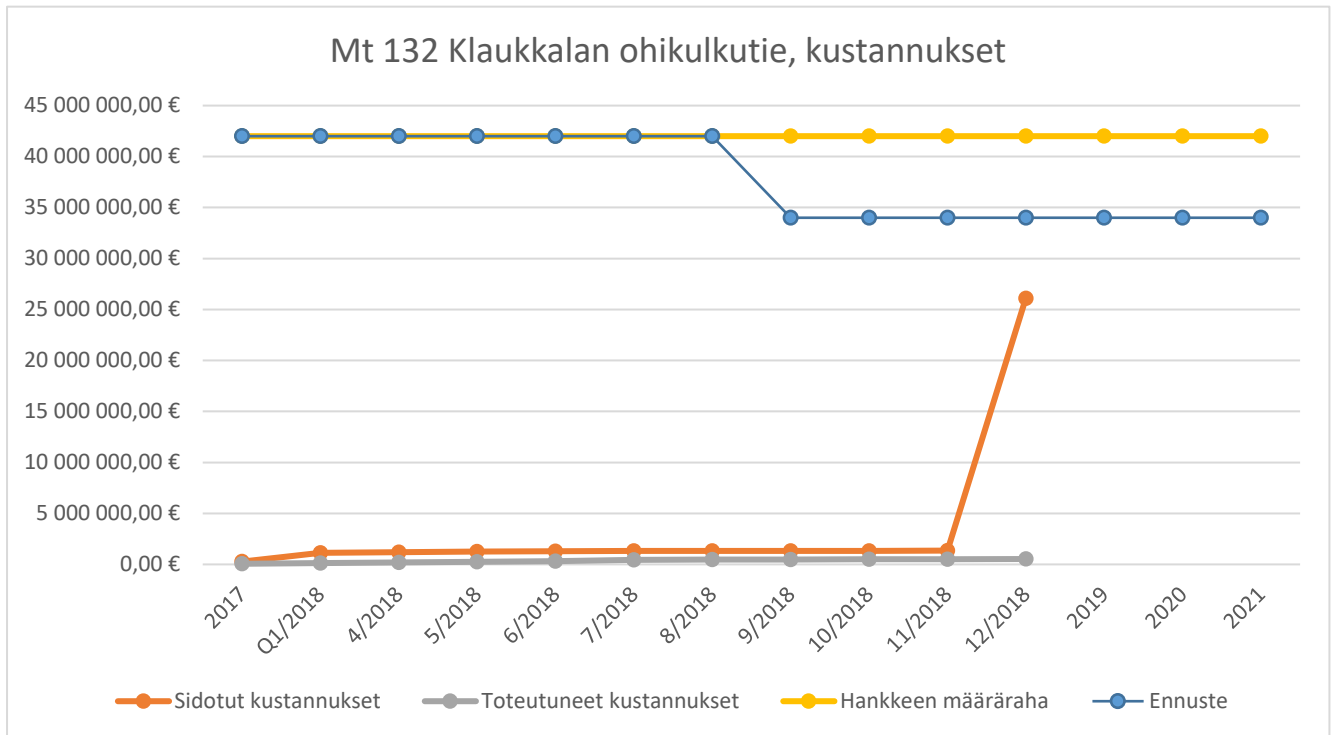

Kuva 1. Hankkeen kustannukset 12/2018

Joulukuun 2018 merkittävänä sidottuja kustannuksia nostava tapahtuma on urakan toteutusvaiheen option lunastaminen ja 21.12.2018 allekirjoitettu toteutusvaiheen urakkasopimus.

4 Muut asiat

Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Väylävirasto, virastosta ensisijaisesti käytettävä nimi on Väylä. Väylän uusi logo on kuvattu alla:



4.1.2019

Hankkeelle on omat Facebook-sivut, jossa julkaistaan tiedotteita hankkeen etenemisestä sekä tietoa STk-urakkamallista. Hankkeen löytää Facebook:sta nimellä " Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie".

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
