


## Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

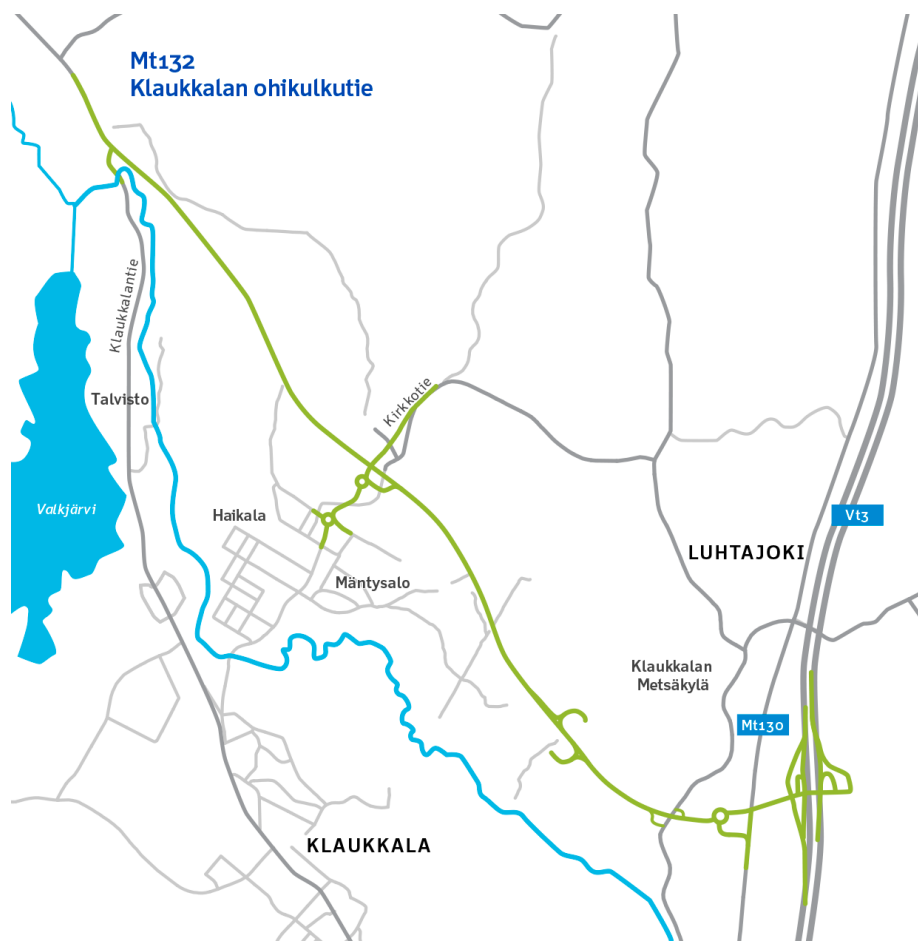

**Kuukausiraportti nro 1/2019**  
**Tarkastelujakso: 1.1.2019 - 31.1.2019**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**  
**Hyväksynyt: Väylävirasto**

5.2.2019

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Urakan toteutusvaihe on käynnistynyt. Urakka-alueella on aloitettu työmaateiden teko.

Puuston poisto jatkuu tammikuussa urakka-alueella.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

## 2 Aikataulu

Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan helmikuun 2019 aikana.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

## 3 Kustannukset


Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.1.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

		Väylävirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	19 887 878,69 €	6 215 125,24 €	26 103 003,93 €
	Toteutuneet kustannukset	606 058,01 €	189 400,37 €	795 458,38 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

5.2.2019

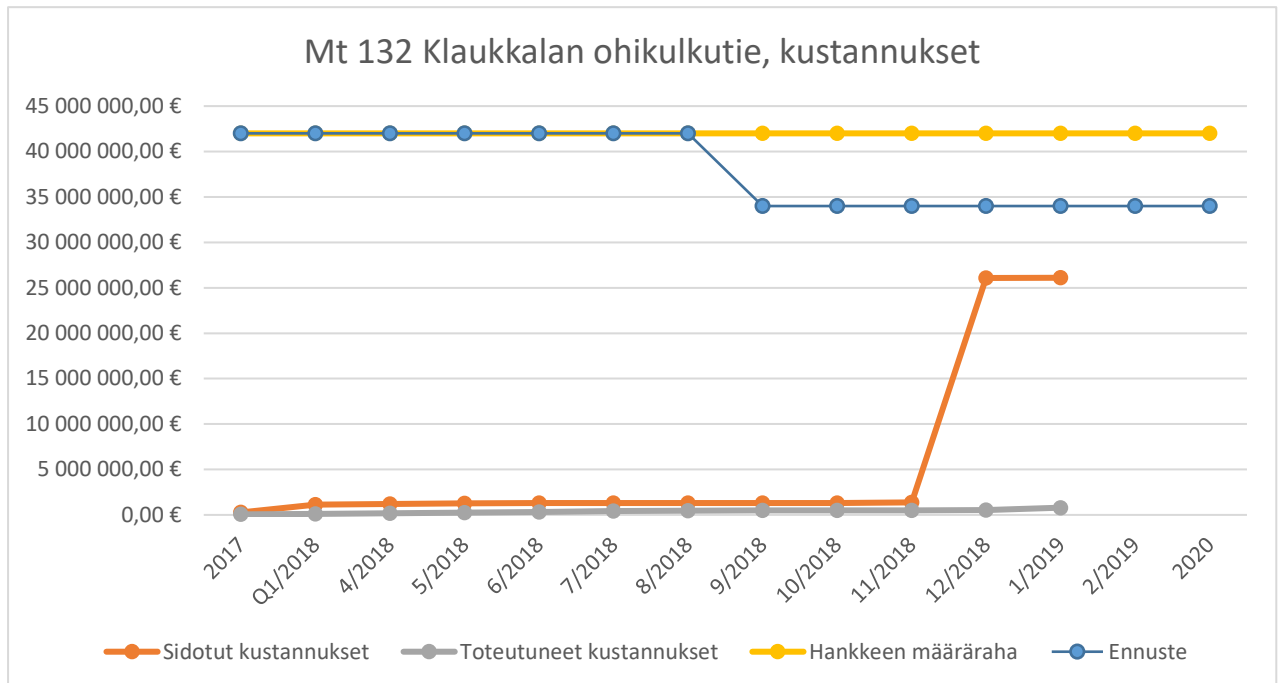

Kuva 1. Hankkeen kustannukset 1/2019

#### 4 Muut asiat

Hankkeelle on luotu oma Flickr-tili, jossa julkaistaan kuvia hankkeesta ja sen etenemisestä.

Hankkeelle on omat Facebook-sivut, jossa julkaistaan tiedotteita hankkeen etenemisestä sekä tietoa STk-urakkamallista. Hankkeen löytää Facebook:sta nimellä "Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie".

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
