




Väylävirasto
Trafikledsverket

LIVI/1668/02.01.01/2018

1.11.2021

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

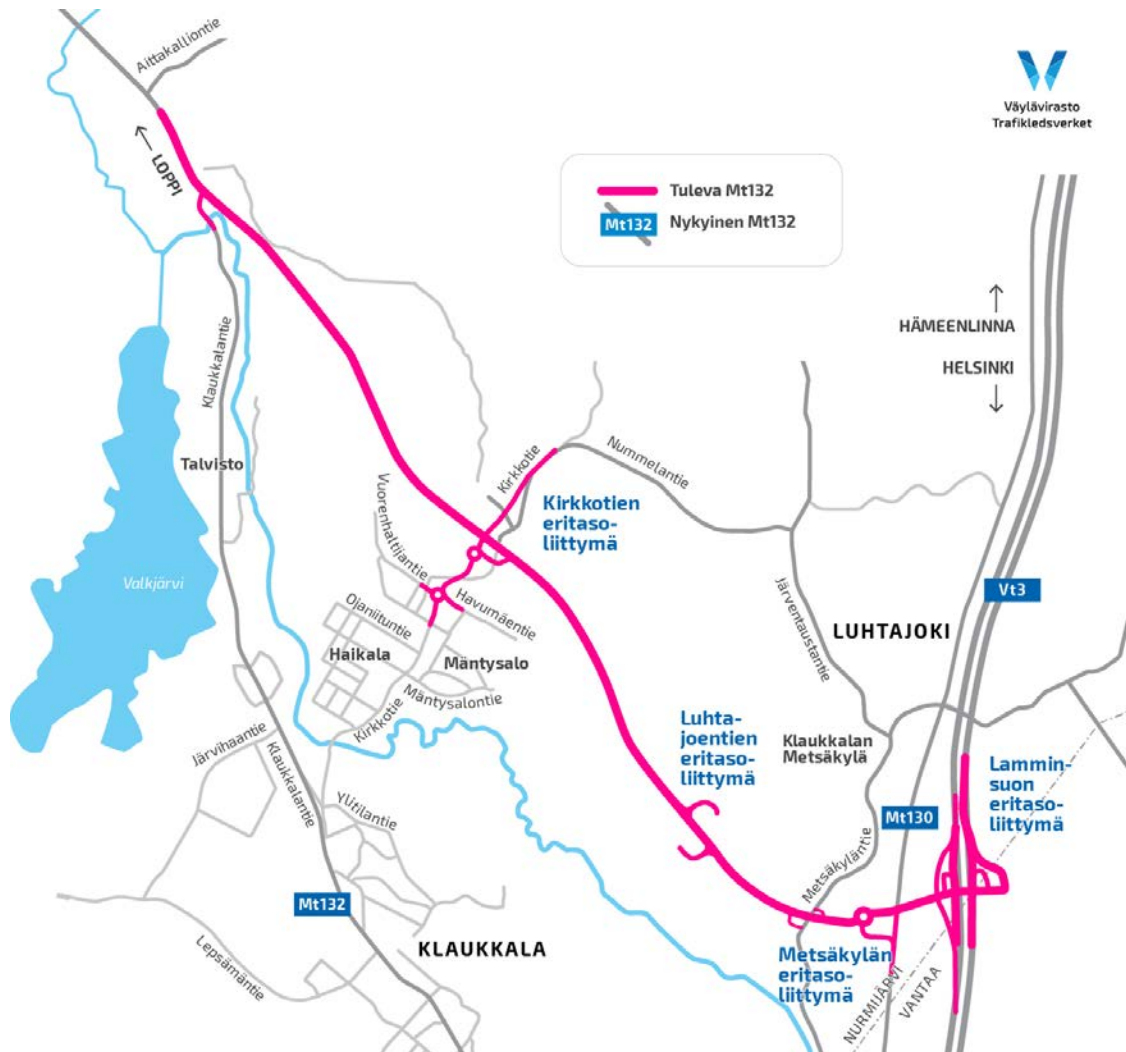

Kuukausiraportti nro 10/2021
Tarkastelujakso: 1.10.2021 – 31.10.2021

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

1 Hankkeen yleiskatsaus

Mt 132 Klaukkalan kehätien STk-urakan takuuvaiheen seuranta käynnissä.

Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi otetaan käyttöön marraskuussa 2021.

Vt3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 96,2 %.

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia lokakuussa.

Tapaturmataajuus lokakuun 2021 lopussa on 0*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. *) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden).

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy

Takuuvaiheen seuranta on käynnissä.

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, urakoitsijana Normiopaste Oy



1.11.2021

Maanrakennustyöt ovat valmiit. Järjestelmään käyttöönoton valmisteluun liittyvät ohjelmisto-, tietoliikenneverkko- laite-, ja maastotestaukset ovat olleet käynnissä.

3 Aikataulu

STk-urakan takuu-aika on käynnissä. Lisäksi vuonna 2023 tehdään urakassa vielä viimeinen päällystekerros (SMA) kehätielle.

Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi järjestelmän testauksia on suoritettu lokakuun aikana ja käyttöönotto tapahtuu marraskuun 2021 aikana.


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.10.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Nurmijärvi	ITM Finland Oy	YHTEENSÄ
Yhteiset				
Sidotut kustannukset	24 305 744,27 €	8 097 883,15 €	1 392 979,42 €	33 796 606,84 €
Toteutuneet kustannukset	22 777 635,25 €	7 534 862,36 €	1 251 113,07 €	31 563 610,68 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen alkuperäinen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 33,8 M€

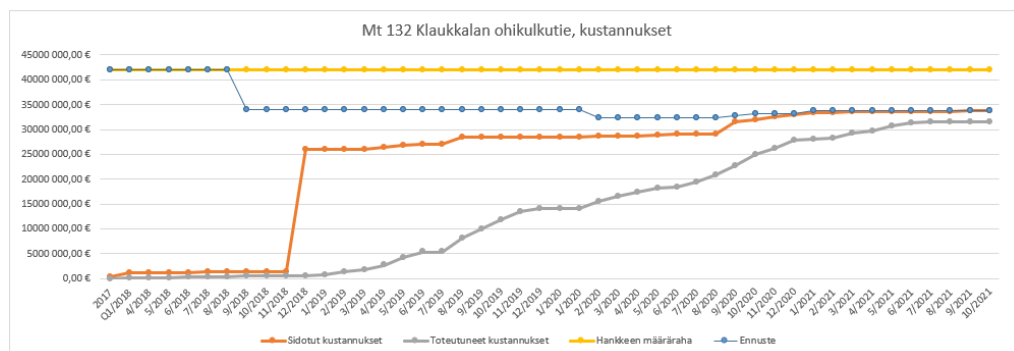

Kuva 1. Koko hankkeen kustannukset 10/2021

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/>
- Internet: <https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLaOsOniBI>
