



Väylävirasto
Trafikledsverket


Raportti

1

LIVI/4786/04.02.01/2016

1.11.2020

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

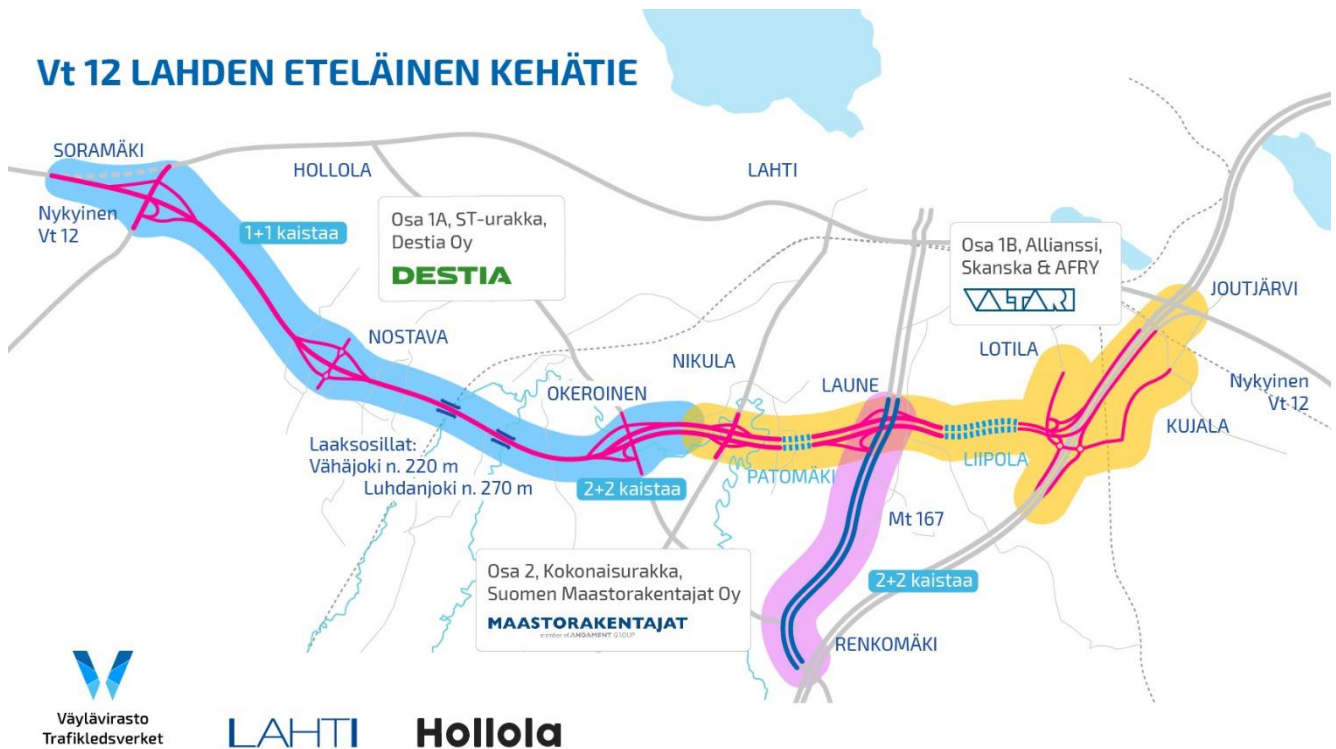

Kuukausiraportti nro 10/2020
Tarkastelujakso: 1.10.2020 – 31.10.2020

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto

1.11.2020

1 Hankkeen yleiskatsaus

Yleistilanne

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä koko osuudella.

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) on tehty korjaus- ja viimeistelytyötä. Urakka valmistuu aikataulusta myöhässä.

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo lokakuulta on 95,75.

Hankkeella ei sattunut lokakuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus lokakuun lopussa on 4,7*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.

**) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden).*

Henkilöstövahvuus

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli noin 161 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 56 htkk Lahden seudulla asuvilta työntekijöiltä.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Hankeosa 1A ST-Hollola

Urakka on valmis ja vastaanotettu. Kehätielinja avataan liikenteelle vasta joulukuussa yhdessä koko kehätien kanssa.

1.11.2020

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Kujalankatu avattiin liikenteelle 26.10.

Nikulan eritasoliittymässä on tehty viimeistelyitä ja ajoratamerkinnyt.

Tiekaiteiden asennus on jatkunut koko tielinjalla ja asfaltointeja on tehty Patomäen länsipuolella ja Kujalan eritasoliittymän alueella. Päätien ajoradalla asfaltointit on saatu valmiiksi.

Koko tielinjalla on tehty liikennemerkkien asennusta ja tiemerkinnyt.

Maisemointitöiden osalta on käynnissä multaukset ja puuistutusten teko.

Kujalan eritasoliittymän läheisyydessä on aloitettu maa-ainesten sijoitusalueen muotoilu.

Patomäen tunnelilla on tehty täyttötöitä ja sisäpuolen viimeistelyitä.

Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on tehty ympärystäyttyjä ja aita-asennuksia.

Liipolan välitunnelilla on tehty täyttö- sekä vesieristystöitä.

Tunnelien pelastusharjoitukset on pidetty ja tekniikan testaus jatkuu.



Kuva 1. Välitunnelin vesieristys- ja täyttötöyt

1.11.2020



Kuva 2. Pelastusharjoitus Patomäen tunnelissa

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Uudenmaankadulla on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä.

Urakka-alueella on tehty asfalttipaikkauksia ja piennartäyttöjä sekä siltojen viimeistelytöitä. Hulevesipumppaamoiden ja Ajokadun keskijakajan muu-
tostyöt on saatu valmiiksi. Lisäksi Launeen risteyssillan alle on tehty pien-
louheverhouksia.

1.11.2020




Kuva 3. Aukeankadun jalankulun ja pyöräilyn väylän luiskaverhous

3 Aikataulu

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikaisemmin. Hollolan pään urakka on valmistunut. Tavoitteena on, että Lahden pään urakan rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla, ja kehätie avataan liikenteelle joulukuussa 2020.

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumiseen.

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aikataulu.



1.11.2020


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 30.10.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	192 906 125,29 €	67 517 143,86 €	7 501 904,87 €	267 925 174,02 €
Toteutuneet kustannukset	185 400 846,05 €	65 064 823,21 €	7 046 604,75 €	257 512 274,01 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.

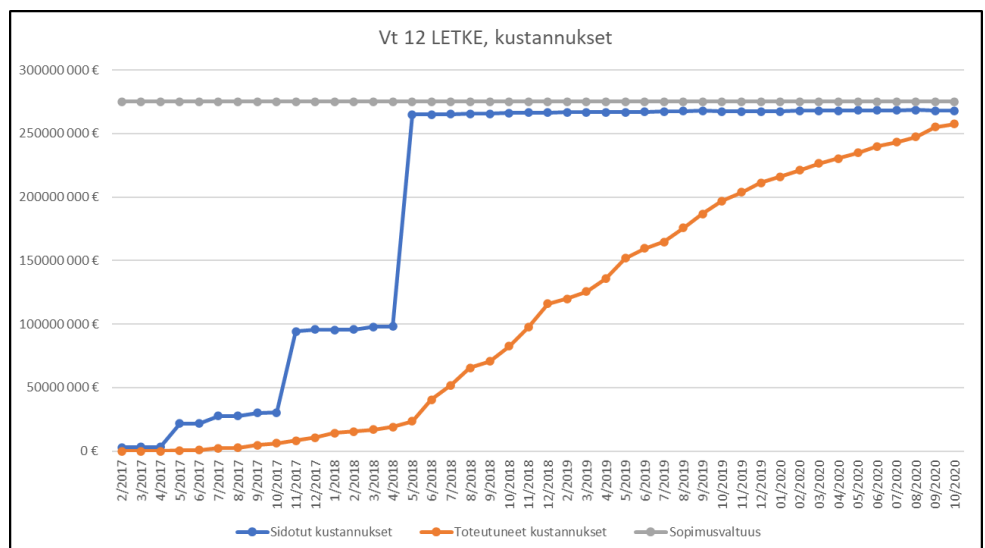

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 10/2020

5 Viestintä

Hankkeen viestintä:

- Facebookissa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.vayla.fi/vt12letke>
- Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
- Flickrissä: <https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums>

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotiedotteen voi tilata itselleen osoitteesta <https://bit.ly/vt12viikkotiedote>
