




10.1.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU


KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO

Rakennussuunnitelma

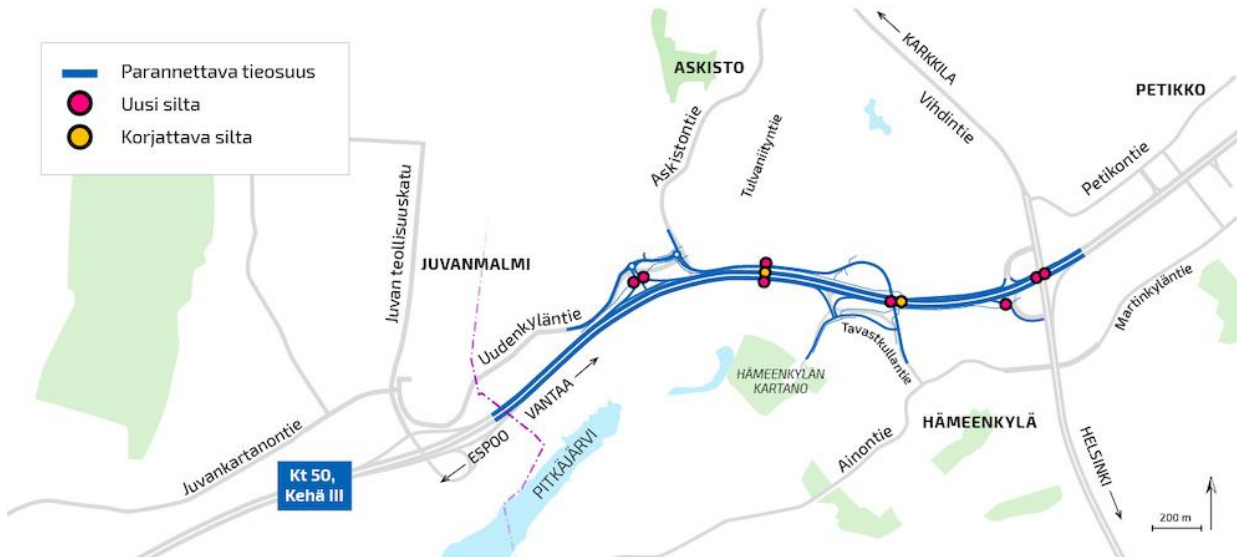

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA

Rakennussuunnitelma

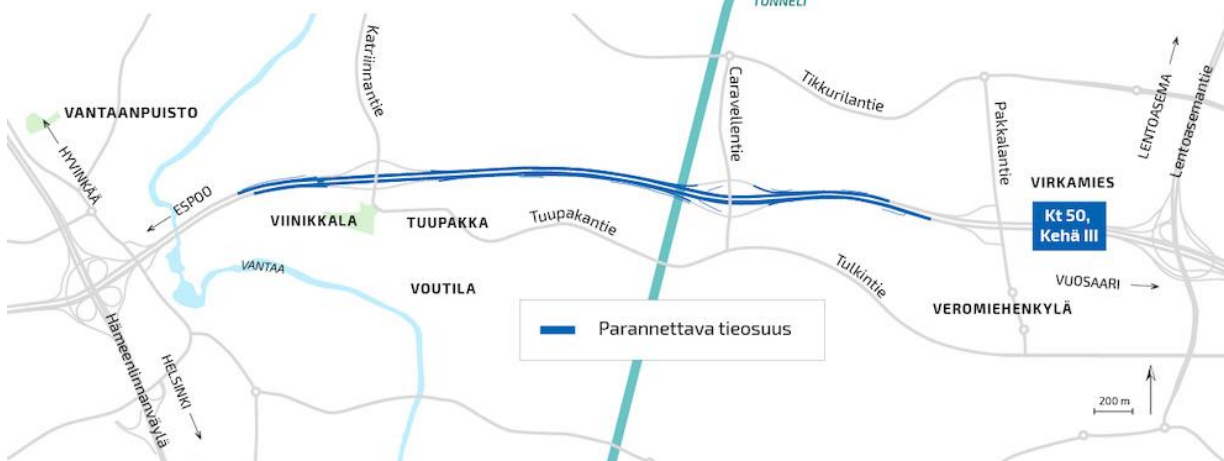

Kuukausiraportti nro 12/2022
Tarkastelujakso: 1.12.2022 – 31.12.2022
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



Väylävirasto
Trafikledsverket

10.1.2023

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisällys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



10.1.2023

Väylävirasto

Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 9.1.2023)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	85
Sillat (S101-S111)	96
ST S112	35
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	90
Päällysteet	75
Liikenteenhallinta	60
HSY	95
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	100
Liikenteenhallinta	100
HSY	100

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo joulukuulta: 96,17 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 96,97 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia joulukuussa. Tapaturmataajuus joulukuun 2022 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Silta S104 on päällystetty ja Kehä III:n idän suunnan liikenne on siirretty kulkemaan uuden sillan päältä. S104 paalulaatan PL13 paalutus on valmistunut. Sillan S112 tuen T4 pilarit sekä pohjoispuolen maatuki (T6) on valettu. Kiertotie S112 kohdalla on joulukuussa siirretty kulkemaan tukien T3 ja T4 välistä.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Kuva 1. Sillan S112 maatuki (T6) betonoitu ja jälkihoito käynnissä.



Kuva 2. Sillan S112 tuen T4 pilareiden betonointi käynnissä.



Kuva 3. Sillan S112 telineen rakentaminen käynnissä Kehä III:n eteläpuolella.



10.1.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Joulukuussa Askiston alueella on tehty päällystystöitä ja Kehä III:n kaistojen linjauksia on muutettu. Kehä III:n eteläpuolelle Askiston ylikulkusillalle on asennettu portaat. Kehä III:n keskikaistalla Askiston puomille on rakennettu sähkönsyöttö ja Askiston melukaiteen lasit on asennettu paikoilleen. Lisäksi vesihuoltoa on rakennettu S112 kohdalla. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee edelleen uuden sillan S111 kautta.

Vantaankoski-Pakkala

Vantaankoski-Pakkalan työt ovat hankkeen osalta valmistuneet, mutta HSY jatkaa alueen vesihuollon korjaustöitä.



Kuva 4. Askiston ylikulkusillan portaat asennettu ja melukaiteen lasiosien asennus käynnissä.



Kuva 5. Talvinen yleiskuva sillan S106 kohdalta.



10.1.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 9.1.2023 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset						
Sidotut kustannukset	28 731 778,65 €	8 775 292,72 €	485 069,55 €	99 401,00 €	911 443,80 €	39 002 985,72 €
Toteutuneet kustannukset	24 731 198,05 €	7 711 530,57 €	344 069,55 €	43 403,00 €	861 443,80 €	33 691 644,97 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,496 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksusuudet.

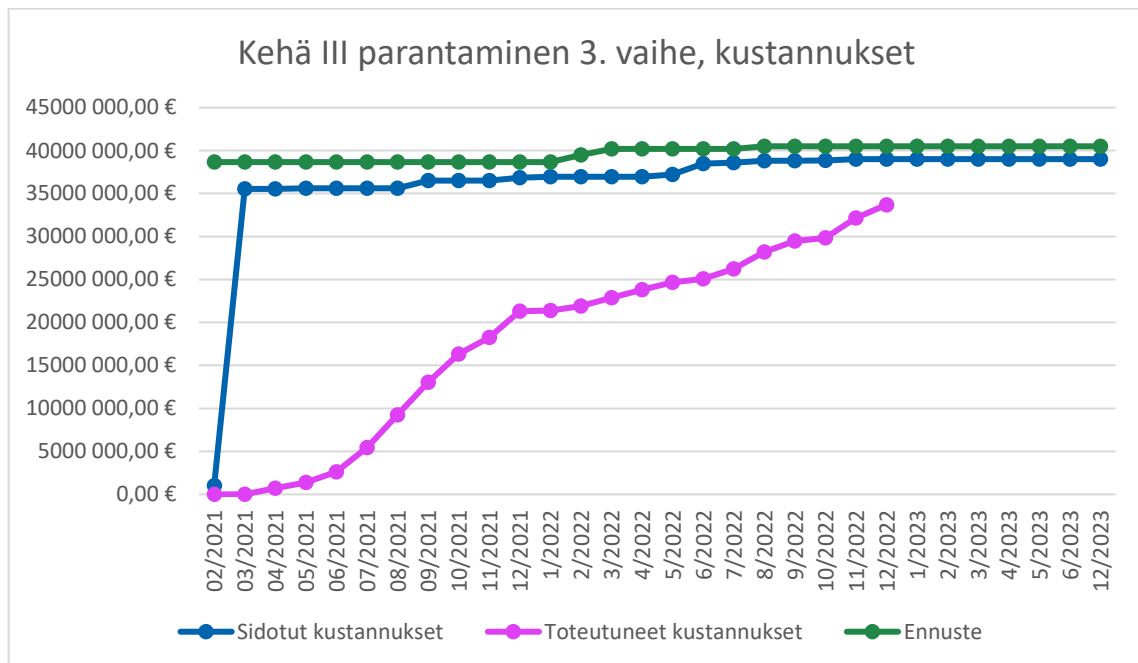

Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 12/2022.



10.1.2023

Väylävirasto Trafikledsverket

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Joulukuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus jouluntoivotuksista
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta
- Facebook-postaus idän ajosuunnan kiertotien poistumisesta Kehä III:lla Vihdintien kohdalla
- Facebook-postaus idän ajosuunnan kiertotien poistumisesta Kehä III:lla Hämeenkylässä
- Facebook-postaus itsenäisyyspäivänä
