
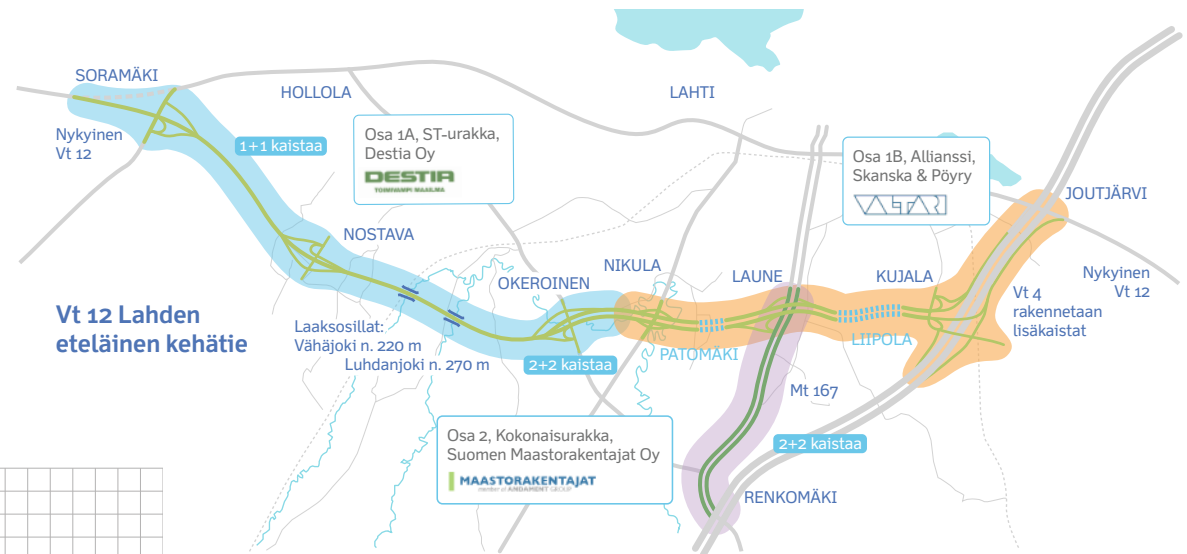


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Aukastilaisuus Jyrkänkadun asukkaille keräsi runsaasti kiinnostuneita
2. Hankkeen Facebook-sivulla on yli 1 000 tykkääjää
3. Ensi viikolla päästään rakentamaan kehätietä!

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,
rakentamisen alusta 330 tapaturmatonta päivää



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla keskityttiin edelleen siltatöihin. Hankaankadun risteyssillalla käynnistyivät valmistelut kannen eristystöitä varten. Kyöstilän alikulkukäytävällä on käynnissä kiertotien rakentaminen nykyisen sillan korvaavan leveämmän sillan rakentamisen takia. Tukiseinätyöt jatkuivat sekä Kangasmäen että Nikkilän alikulkukäytävien kohdalla. Launeen risteyssillan kannen raudoitustyöt jatkuivat. Lisäksi Launeen alueella valmisteltiin parin paalulaatan rakentamista. Launeen alikulkukäytävällä rakennettiin kehäsillan muottia valmiista puuelementeistä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan eristystyön valmistelut
- Kiertotien valmistelevat työt Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla
- Tukiseinätyöt jatkuvat Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävien kohdalla
- Patomäen alikulkukäytävän kehän teline- ja muottityöt
- Launeen risteyssillan kannen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat
- Paalulaattapohjien rakentaminen Launeella
- Liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset

- Launeen alikulkukäytävän muottityöt etenevät



Launeen alikulkukäytävän muottityömaa kevättauringossa.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä kuorittiin pintamaakerrosta kallion päältä kolmen kaivinkoneen voimin sekä tulevan eritasoliittymän että ramppien alueilla. Kalliopinnoilta saadut maa-ainekset on varastoitu eritasoliittymän alueelle hyötykäyttöä varten. Myös Patiokalliolla puhdistetaan yhä kalliopintaa, ja kertyvät maa-ainekset varastoidaan niin ikään myöhempää käyttöä varten. Kuusenalantien ja Tikkakalliontien välinen kiertotie on melkein valmis, vain varsinainen kulutuskerros enää puuttuu. Kiertotien käyttöön otosta tiedotetaan erikseen myöhemmin. Nostavassa jatkuivat vielä koepaalutukset, mutta ensi viikolla päästään jo tekemään varsinaista paalutustyötä. Nostavassa sijaitseva suuri paalulaatta onkin ensimmäisiä paalutuskohteita varsinaisen rakentamisen nyt alkaessa.

Tulevan viikon töitä:

- Kallionkuorinta ja louhintatyöt Soramäessä
- Kallionkuorinta ja louhintatyöt Patiokalliolla
- Tikkakalliontien ja Kuusenalantien välisen kiertotien rakentaminen
- Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu Okeroisissa
- Suunnittelu on käynnissä



Kuvassa kaksi kaivinkonetta kuorii kalliota Patiokalliolla.

Viikon onnistumiset

- Palaveri poliisilaitoksen ja pelastusviranomaisten kanssa 27.3.2018.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla käynnistyivät Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin maatyöt. Tutkimustunnelin luona paljastettiin kalliopintaa ja mitattiin sen korkeusasema. Vesijohdon rakentamisen valmistelevat työt jatkuvat Kujalassa valtatie 4 itäpuolella. Kujalassa on käynnissä myös työmaatien rakentaminen maa-aineksen sijoitusalueelle. Liipolassa Jyrkänkadulla järjestettiin keskiviikkona asukastilaisuus, jossa keskusteltiin muun muassa tunnelin louhintatöistä ja töiden vaikutuksista asuinalueeseen. Asukastilaisuuteen osallistui noin 100 lähialueen asukasta.

Tulevan viikon töitä

- Kujalassa tehdään kantojen poistoa tulevan tien kohdalla
- Tulevan Nikulan eritasoliittymän kohdalla käynnistyvät ramppien rakentamisen vaatimat puustonpoistotyöt
- Liipolassa puuston poisto jatkuu työmaateiden kohdalla

Viikon onnistumiset

- Asukastilaisuus Liipolassa keräsi runsaasti osallistujia



Jyrkänkadun asukastilaisuutta vietettiin talvisessa säässä.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
