

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3


1. Patomäen vanha alikulkukäytävä purettiin
2. ST:n lisäpohjatutkimukset etenevät suunnitellusti
3. Asukastilaisuudet Lahdessa ja Hollolassa viikolla 6

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

Tammikuu 2018: 124

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 274 tapaturmatonta päivää.

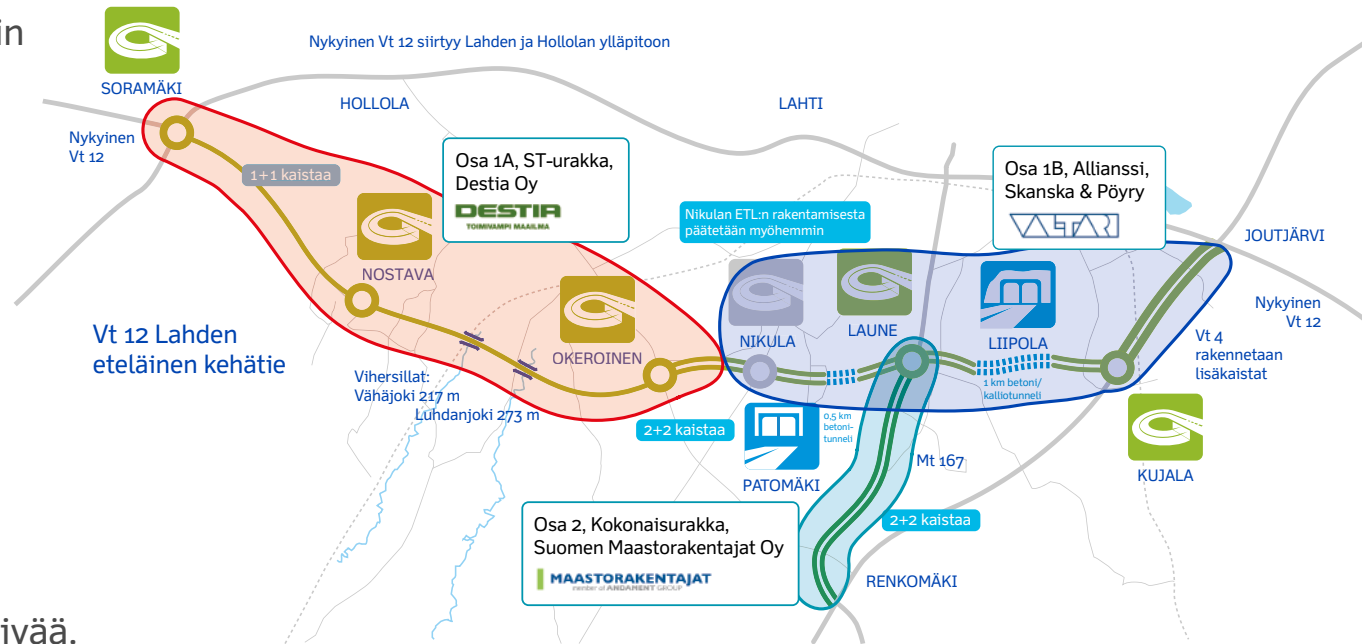

2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

mt167 2+2

syksy 2019

mt167 valmis

kesä

2020 lopussa
Vt12 valmis



2021 viimeistelytöitä

2023 viimeinen päällystekerros

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla töitä tehtiin lumituiskussa. Keskiviikkona otettiin käyttöön jalankulun ja pyöräilyn kiertotie Tasangonpolulla alkavan siltatyömaan vuoksi. Vanha Patomäen alikulkukäytävä purettiin. Launeen risteyssillalla työt etenivät toisen maatuen valulla. Seuraavaksi siirrytään kannen telineiden rakentamiseen. Hankaankadun risteyssillalla raudoitettiin kantta ja aloitettiin uuden alittavan väylän, Hankaankadun, kaivutyöt. Ensi viikolla on tarkoitus valaa kansi. Launeen alikulkukäytävän rakentaminen alkoi ponttiseinän asentamisella kiertotien viereen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillalla ensi viikolla kannen valu
- Orimattilankadun kiertoliittymän länsipuolella Kamuxin edessä valmistellaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyden siirtoa
- Patomäen alikulkukäytävän / Tasangonpolun kaivutyöt
- Launeen risteyssillalla aloitetaan telinetyöt
- Launeen alikulkukäytävän kohdalla aloitellaan kaivutöitä

Viikon onnistumiset

- Patomäen alikulkukäytävä saatiin purettua



Kuvassa käynnissä Patomäen alikulun purku Tasangonpolun kiertotieltä katsottuna.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla ST-roomissa on paneuduttu hankeosan 1A massamääriin ja massojen hallintaan. Vesistöjen tutkimukset alkavat jo helmikuun loppupuolella. Toivotaan, etteivät hankeosan alueella olevat joet ja purot ehdi jäätyä ennen näytteiden ottamista. Lisäpohjatutkimukset ovat loppusuoralla, eikä haastava keli ole hidastanut kairavaunujen etenemistä työmaalla.



Myös toimiston työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Tulevan viikon töitä:

- Vesistötutkimusten valmistelu
- Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
- Suunnittelu on käynnissä
- Väylä- ja siltapuolella valmistellaan hankintoja

Viikon onnistumiset

- Projektitoimisto on viihtyisä ja suurimmat hankinnat sinne on tehty.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on tarkennettu tavoitekustannuslaskelmia suunnittelun edetessä. Rakentamistöiden tarkempaa aikataulusuunnittelua on jatkettu. Allianssin johtoryhmä, johon kuuluu jäsenet jokaiselta allianssiosapuolelta, kokoontui kuulemaan kehitysvaiheen tilannekatsauksen. Valtarilaiset päättivät perustaa oman VeriRyhmän eli verta luovuttavan porukan Punaisen Ristin veripalveluun.

Tulevan viikon töitä

- Aloitetaan pohjaveden alennuskaivojen tekeminen Mäkelänkadun varrella
- Geosuunnittelun työpajat jatkuvat
- Suunnittelu jatkuu eri tekniikka-aloilla
- Ensi viikolla Lahdessa pidettävien talvitiepäivien ekskursion tuo vieraita tutustumaan Valtarin Big Roomiin.

Viikon onnistumiset

- Perustettiin Valtarin VeriRyhmä



Valtarilaiset käärivät hihat hyvän asian puolesta ja perustivat oman ryhmän Punaisen Ristin veripalveluun.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
