



Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Allianssissa siirryttiin toteutusvaiheeseen
2. Yleisötilaisuudet Lahdessa ja Hollolassa
3. Työnaikainen silta Luhdanjoen yli valmistui

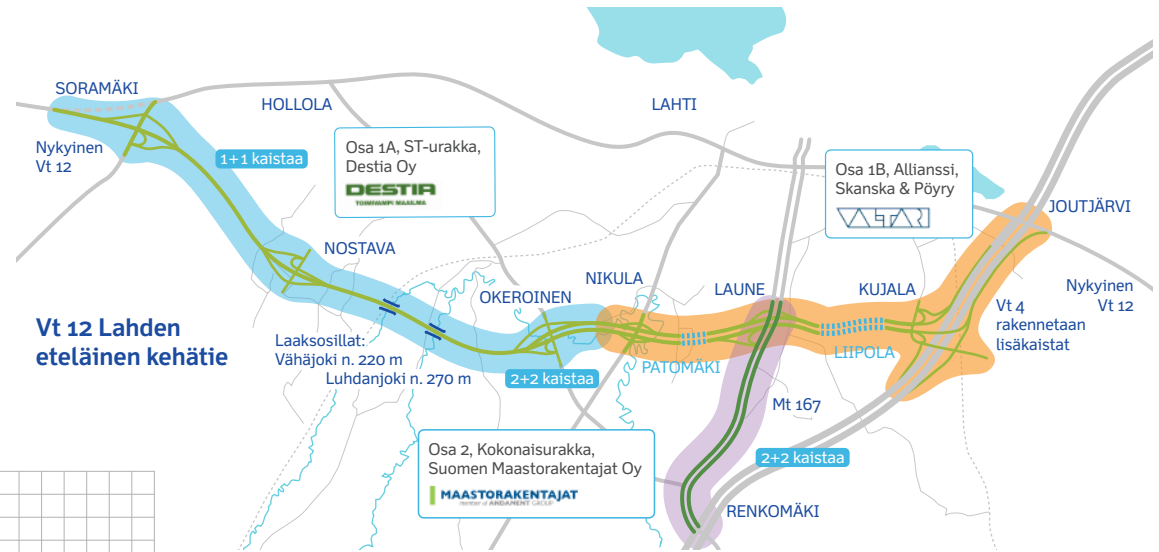

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

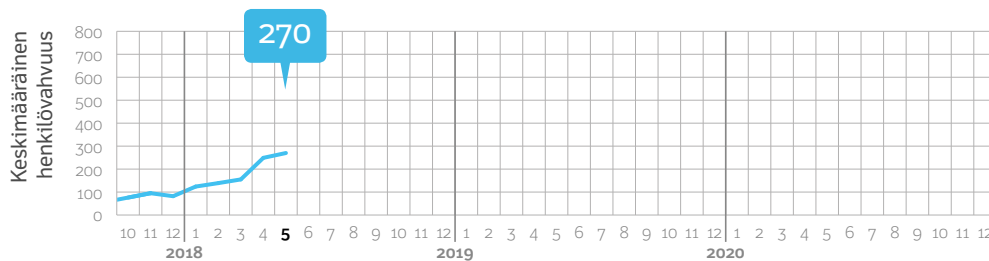

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 393 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Hollolan päässä Luhdanjoen yli kulkeva työnaikainen silta on nyt valmistunut, ja helpottaa työmaaliikennettä mm. Luhdanjoen toisella puolella sijaitseville paalulaatoille. Alueella jatkuvat myös Patiokallion louhinta, maaleikkaukset ja massanvaihto. Soramäessä tehdään töitä louhinnan, louhepenkereiden rakentamisen, maaleikkauksen ja kiertotien rakentamisen parissa. Okeroisissa ovat käynnissä paalutukset, kunnallistekniikan siirtotyöt, maaleikkaus ja louhepenkereiden teko. Uteliaat eläimet ovat tutustuneet työmaahamme seuraten rakentamistouhuja pienen matkan päästä. Työmaalla on tavattu kettuja, peuroja, sammakoita, kyy sekä kesäasuinen, ketterä lumikko.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Murskaustyöt Soramäessä
- Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Paalutukset ja vesihuoltolinjojen siirtotyöt Okeroisissa
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Tikkakallion kiertotiejärjestelyt käytössä

Viikon onnistumiset

- Torstaina pidetty asukastilaisuus Hollolan kunnanvirastolla sekä työnaikaisen sillan valmistuminen Luhdanjoen yli!



Kuvassa rummuntekoa Soramäen alueella.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Liikennevirasto, Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy allekirjoittivat kehätien Lahden pään toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Ensimmäisellä tutkimustunnelilla jatkettiin tunnelilouhintaa. Patomäessä tehtiin pintamaan poistoa ja Ajokadulla jatkettiin johtosiirtotöitä. Kujalassa oli käynnissä Hartwallin vesijohdon suuntaporaus sekä louheen lastaus. Tiistaina Lahden kaupunki järjesti VALTARIN BigRoomissa tilaisuuden Lahden yrittäjille. Keskiviikkona pidettiin asukastilaisuus Liipolan monitoimitalolla, ja torstaina Rambollin väyläsunnittelijat tutustuivat työmaahan ja BigRoomiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ajokadun sulkeminen Ajokadun risteyssillan kohdalla 6.6.2018
- Patomäentien sulkeminen kentän kohdalla 6.6.2018
- Vanhanradankadun päästä lähtevä ulkoilureitti suljetaan Saksalan ja Nikkilän välillä
- Orvokkitien rakentaminen alkaa
- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat
- Ensimmäisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta
- Toisen tutkimustunnelin valmistelevat työt
- Kujalassa aloitetaan paalutus
- Itäisen alikulkuputken asennus Liipolan työmaatien alle

Viikon onnistumiset

- Toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoitus!



Tyytyväisiä ilmeitä toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadun ja Uuden Orimattilantien risteyksessä otettiin keskiviikkoiltana käyttöön tilapäiset liikennevalot. Valojen käyttöönoton ajan poliisi oli ohjaamassa liikennettä. Hanke kiittää poliisia avusta! Aukeankadun risteuksen luona koettiin läheltä piti -tilanne, kun kaukolämmön siirtotöissä nosturiauto kallistui nostotöitä valmisteltaessa. Tilanteessa selvittiin onneksi säikähdyksellä. Orimattilankadun alikulkukäytävällä tehtiin sillan kannen ensimmäinen vesieristyskerros.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävällä valmistellaan kiertotietä
- Aukeankadun risteuksen luona kaukolämmön siirtotöitä
- Launeen risteys sillan kannen jännitystyöt ja paalulaattojen rakennustyöt
- Päällystystöitä Uudenmaankadun oikealla ajoradalla
- Uudenmaankatu suljettu Launeen ylikulkukäytävän purkutöiden vuoksi 5.6. klo 21.30–6.6. klo 7, kiertotie Ajokadun kautta.
- Tilapäisiä kaistojen kavennuksia ja kaistan sulkuja Renkomäen ABC:n kohdalla

Viikon onnistumiset

- Yhteistyö poliisin kanssa liikennevalojen asennuksessa



Kuvassa Nikkilän alikulkukäytävän sillan telinetyöt.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
