
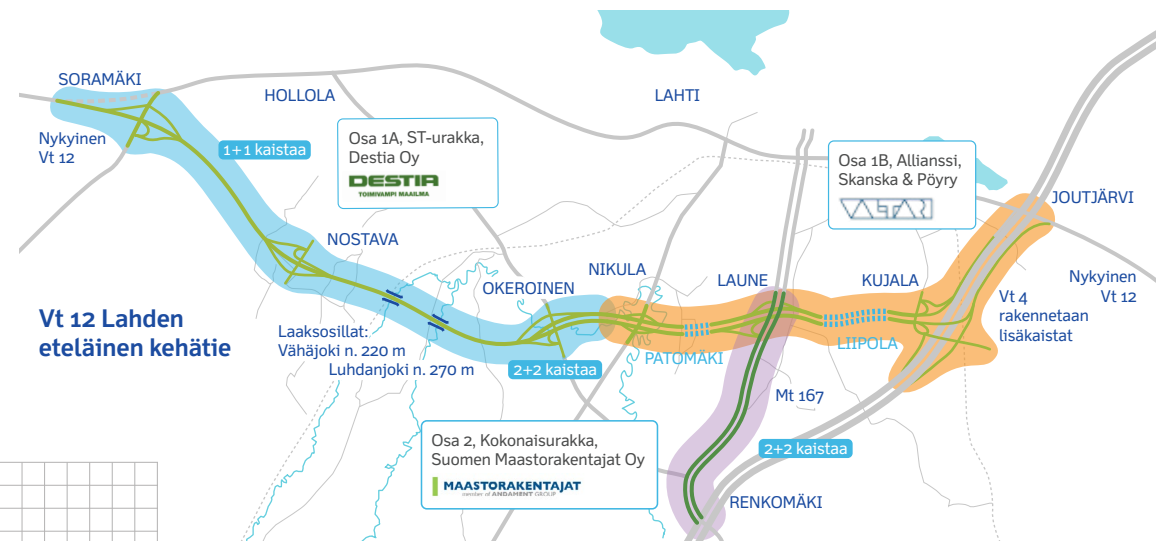


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin louhinta on edennyt tietunnelin louhinta vaiheeseen
2. Uusi Hankaankadun alittava kevyenliikenteen kiertotie saatiin otettua hyvin käyttöön
3. Ensimmäiset paalulaattojen valut käynnistyivät Okeroisissa

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 428 tapaturmatonta päivää.



## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Soramäessä ja Tikkakalliontiellä on tällä viikolla ahkeroitu maaleikkausten, louhepenkereiden ja louhinnan parissa. Patiokallionseudulla tehdään maaleikkauksia, louhintaa sekä louhepenkereitä.

Paalulaattarakenteita - mukaan lukien paalutusta – tehdään Luhdanjoen läheisyydessä sekä Okeroisissa. Paalulaattarakenteet tehdään sienilaattoina, joiden erikoisuus piilee paalun kohdalla olevassa sienirakenteessa. Rakenne aikaansaadaan uudelleen käytettävän neliskulmaisen kartion muotoisen sienimuotin sekä sen ympärille tulevan tiivistetyn kiviaineskerroksen avulla. Sienirakenteella syntyy pohjarakenne, joka keskittää päältä tulevan kuorman tasaisesti paaluille.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä jatkuvat
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten maatyöt jatkuvat

### Viikon onnistumiset

- Vesijohdon ja jäteveden siirtotyöt onnistuivat suunnitellusti Okeroisissa!



Kuvassa sienimuotteja.

## Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla on saatu Orvokkietien maaleikkaukset valmiiksi ja jakavan kerroksen rakentaminen on aloitettu. Patomäen maanleikkaus- ja läjitystyöt ovat jatkuneet. Ajokadulla on tehty asfaltin poistoa. Tälle viikolle suunniteltu Ajokadun risteyssillan paalutustyö siirtyi tulevalle viikolle. Ensimmäisen tutkimustunnelin louhinnat ovat edenneet tietunnelin louhintavaiheeseen. Toisen tutkimustunnelin louhinnat ovat jatkuneet. Kujalassa maanleikkaus ja Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt ovat käynnissä. Hartwallin vesijohtotyöt ovat jatkuneet.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäessä maaleikkaus- ja läjitystyöt jatkuvat
- Patomäen ajoluiskien kaivuutyöt alkavat
- Luhdantaustankadun johtosiirtotyöt alkavat
- Launeen koulun alitusputkien teko alkuviikosta
- Ajokadun risteyssillan paalutustyöt alkavat (siirtyivät viikolla)
- Ajokadun vesijohtotyöt alkavat loppuviikosta
- Orvokkietien jakavan kerroksen rakentaminen ja vesijohtotyöt jatkuvat
- Tietunnelin ja toisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta jatkuvat
- Liipolan tunnelin itäisen suuaukon louhinta ja poraustyöt jatkuvat
- Paalutustyöt Kujalassa jatkuvat
- Vt 4 liikenne pysäytetään tulevan kehätielinjan kohdalla sähkölinjan purkutöiden ajaksi ke 11.7. ruuhka-ajan ulkopuolella. Pysäytys max. 5 min.

### Viikon onnistumiset

- Hankkeella suoritettiin vieraslajikartoitus maastossa. Haitallisia vieraslajeja ei käytetä työmaalla kasvualustana, sillä ne kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa.



Vieraslajikartoitus 5.7.2018.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla töitä on jatkettu sateisessa säässä. Uudenmaankadun eteläpäässä kevyt liikenne siirtyi kulkemaan Hankaankadun risteyssillan alitse, kun Kyöstilän alikulku suljettiin. Myös Aukeankadulla kevyt liikenne siirtyi kiertotielle. Pohjoispäässä Launeen alikulkukäytävälle rakennettiin sääsuoja ja paalulaatan paalutus saatiin valmiiksi. Muualla on tehty raudoitustöitä ja muotin purkuja.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän ABC:n puoleisen kiertotien rakentaminen
- Kangasmäen ja Orimattilankadun alikulkukäytävien rauditus- ja täyttötöyt
- Aukeankadun alikulkukäytävän purkutyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän muotin tuplaus
- Launeen alikulkukäytävän paalulaatan valu ja täyttötöyt
- Launeen risteysillan kannen muotin purku ja vesieristystöyt
- Tulevana uutena liikennejärjestelynä, Kyöstilän alikulkukäytävän ABC:n puoleinen kiertotie otetaan käyttöön

## Viikon onnistumiset

- Launeen alikulkukäytävän paalulaatan paalutuksen valmistuminen



Hankaankadun rakentaminen käynnissä.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
