
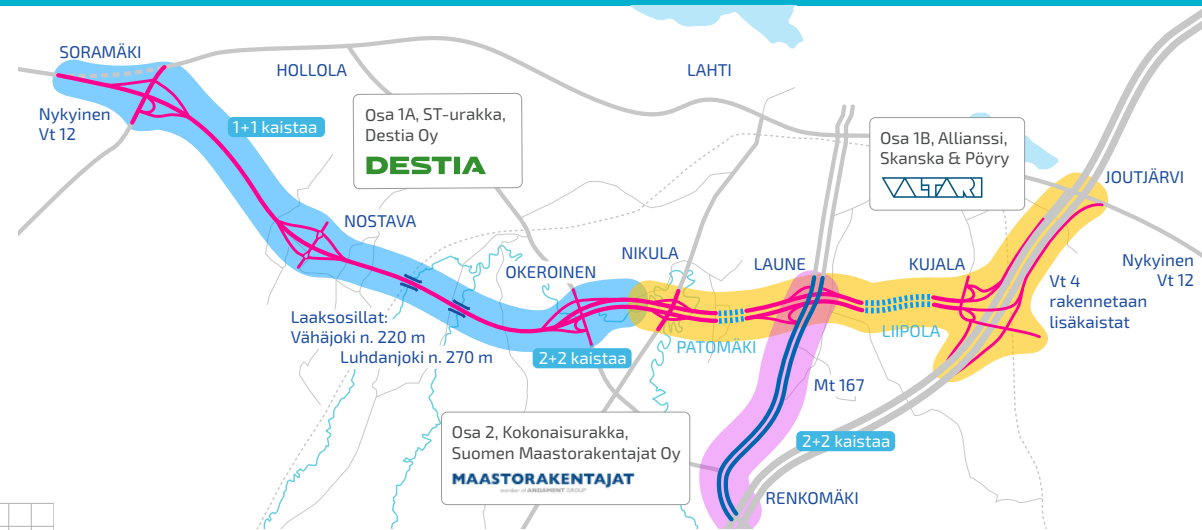


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan muotin purkutytöt ovat edenneet onnistuneesti
2. Luhdanjoen sillan tunkkaus lähestyy jo Nostavantietä
3. Työmaalla vietetään ensi viikolla turvallisuusviikkoa

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

76 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Työt etenevät suotuisissa sääolosuhteissa. Soramäen ja Takamaan alueella olevilla silloilla on käynnissä teline- ja muottityöt sekä muutamalla sillalla muotin purkutöitä. Takamaan paalulaatalla raudoitetaan, muotoillaan pohjia ja paalutetaan, paalutustyöt valmistuvat ensi viikolla. Vähäjoen sillan kannella raudoitetaan ja Luhdanjoen sillalla tehdään teräsrakenteen muottipukitusta. Okeroisissa työt ovat käynnissä kolmella sillalla ja risteyssillan paalujen valaminen on käynnissä. Porvoonjoen toisen sillan muottia puretaan ja toisen sillan raudoitustyöt ovat käynnissä. Valaistus- ja telematiikkatyöt sekä maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Melukivien asennus aloitetaan valtatie 12 varrella, mistä johtuen Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan on alennettu nopeusrajoitus 50km/h, kaistajärjestelyjä sekä liikenteenpysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Valaistus- ja telematiikkatyöt sekä maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella, asfalttipohjan teko aloitetaan Soramäessä
- Takamaalla paalutustyöt sekä paalulaatan rakentaminen käynnissä
- Okeroisten risteyssillan paalujen valaminen
- Luhdanjoen sillan teräsrakenteen muottityöt
- Vähäjoen sillan raudoitustyöt
- Soramäen risteyssillalla siirtymälaatan betonointia

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Valtatiellä 4 on tehty yöaikaan Lotilan risteyssillan telineen purkutöitä. Töitä jatketaan vielä tulevan viikon maanantain ja tiistain välisenä yönä. Nikulan eritasoliittymässä on aloitettu maaleikkaustyöt ja Patomäessä on jatkettu tunnelin rakentamista. Paskurinojan sillalla on tehty paalutustöitä, jotka saadaan valmiiksi ensi viikolla. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on louhittu suuaukkoa leveämmäksi, välitunnelilla on käynnissä anturapohjien ja antureiden rakentaminen. Kujalan eritasoliittymässä on rakennettu telematiikkaa ja siltoja sekä paalulaattoja. Valtatien 4 varressa jatkui louhinta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Valtatiellä 4 Lotilan risteyssillan telineen purkutyöt maanantain ja tiistaina välisenä yönä. Työnaikainen kiertoreitti käytössä ja lyhytkestoisia pysäytyksiä.
- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 minuutin pysäytyksiä
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaustyöt
- Ali-Juhakkalan sillankannen muottityöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Paskurinojan sillan paalutustyöt
- Maaleikkaukset Sokeritoponpolun ja pohjavesikaukalon kohdalla
- Liipolan tunnelin louhinta ja avolouhinta läntisellä suuaukolla
- Liipolan välitunnelilla anturien rakentaminen

Nostavantien läheisyydessä sijaitsevan Luhdanjoen sillan tunkkaus etenee.



VIIKON ONNISTUMISET:
Luhdanjoen sillan teräsrakenteesta 2/3 siirretty.

VIIKON ONNISTUMISET:
Lotilan risteyssillan telineen purkutyöt.

Valtatien 4 ylittävä Lotilan risteyssilta.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työt jatkuivat useassa kohtaa Uudenmaankadun varrella. Viikon aikana jatkettiin luiskien muotoilua, vihertöitä, kiveystöitä ja sadevesilinjojen rakentamista. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tehtiin muutoksia Aukeankadun kiertoliittymään. Kiertoliittymän eteläinen haara siirtyi Uudenmaankadun itälaitaan, ja Aukeankadun alikulkukäytävän läntinen puoli saatiin työn alle vesieristystä varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Vihertyöt ja niiden valmistelu sekä keskisaarekkeen täytöt jatkuvat
- Hulevesilinjoja rakennetaan useammassa kohteessa
- Alikulkukäytävien viimeistelyitä
- Siltojen valaisimien asennus
- Aukeankadun alikulkukäytävällä kannen kuivaaminen vedeneristystä varten

Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla liikenne kulkee uudella reitillään



VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadulla vedeneristystyöt etenevät.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke

 facebook.com/vt12letke

 twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
