
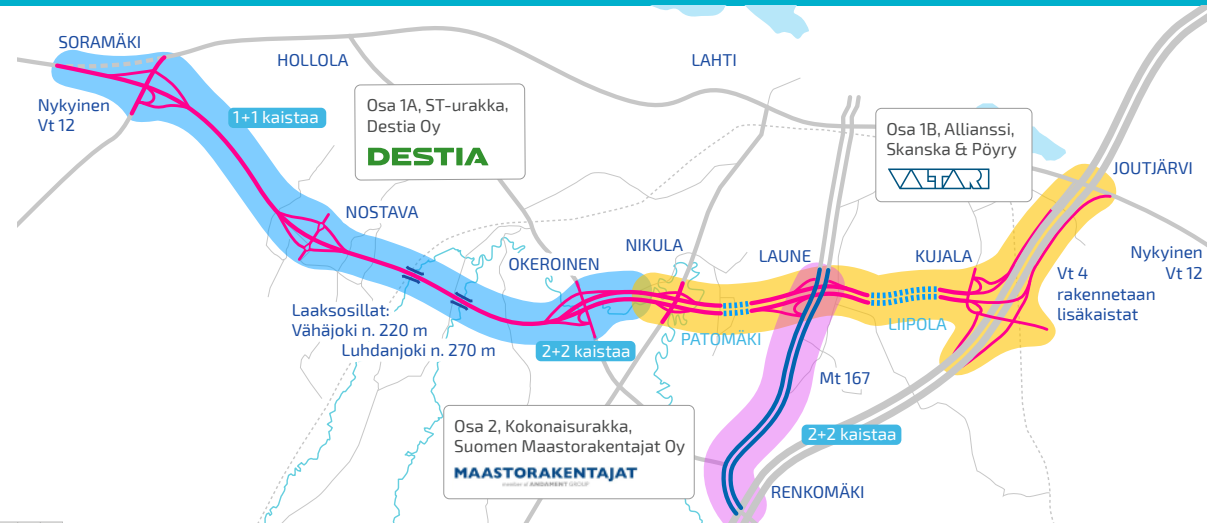


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut hankkeen toinen työtapaturma, jonka seurauksena työntekijä loukkasi jalkansa. Työtapaturmasta aiheutuu arviolta kahden kuukauden poissaolo.
2. Luhdanjoen sillan teräsrakenne on siirretty paikalleen.
3. Lahden pään työmaalla pidettiin naapuritilaisuudet.

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

9 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

#### Tilannekatsaus

Valtatien 12 varrella meluesteen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteyssillalla telineen ja muotin purkutyöt sekä sääsuojan kasaaminen on alkanut. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä ja Vähäjoen sillalla valmistaudutaan ensi viikon valuuun. Nostavantien ylittävän Luhdanjoen sillan teräsrakenne tunkattiin onnistuneesti paikalleen. Okeroisten risteyssillalla telinetyöt jatkuvat. Porvoonjoen silloista toinen saatiin tällä viikolla valettua ja toisen sillan alla olevaa työsiltää puretaan. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella liikennejärjestelyt muuttuvat, etelänpuoleinen ajorata suljetaan ja liikenne siirretään kulkemaan pohjoispuoleiselle ajoradalle, käytössä on yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen risteyssillalla sääsuojan kasaaminen
- Vähäjoen sillan kannen betonointi
- Okeroisten risteyssillalla kannen telinetyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

#### Tilannekatsaus

Tällä viikolla järjestettiin asukastilaisuudet työmaan lähinaapureille Nikkilässä ja Patomäessä. Suunnitelmakarttojen äärellä keskusteltiin käynnissä olevista rakennustöistä ja niiden etenemisestä. Kiinnostusta herätti muun muassa Liipolan ulkoilureittiyhteydet sekä maisemointityöt. Nikulan eritasoliittymässä tehtiin viikolla maaleikkaus- ja louherakennetöitä sekä Ali-Juhakkalan sillan raudoitus- ja muottitöitä. Patomäessä on jatkunut tunnelin rakentaminen. Launeella on rakennettu hulevesilinjaa sekä kaukaloa ja kasvualustan teko on aloitettu työmaa-alueella Starkin vieressä. Orvokkitiellä alkoivat kiveystyöt ja maavallin luiskien muotoilu. Liipolan tunnelissa aloitettiin erikoisrakenteen louhinta ja välitunnelilla on tehty holvimuottia.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus- ja louherakennetyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Orvokkitien kiveyksien teko ja maavallin luiskien muotoilu
- Liipolan välitunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymässä ramppien, Vanhanradankadun ja siltojen rakennustyöt

Nostavantien ylittävän Luhdanjoen sillan teräsrakenne tunkattu paikalleen.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Luhdanjoen sillan teräsrakenne tunkattu paikalleen.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Työmaan asukastilaisuudet.

Asukastilaisuus Launeen koululla.



## Tilannekatsaus

Uudenmaankadun ilme muuttuu katumaisemmaksi viimeistelytyöiden edetessä. Tällä viikolla aloitettiin puiden istutukset keskisaarekkeeseen. Puiden alaosassa oleva säkki auttaa kastelussa puiden kasvuunlähtövaiheessa.

Kiveystyöt ovat edenneet Uudenmaankadulla ja Hankaankadulla, alikulkujen noppakiveystyöt aloitettiin Orimattilankadun alikulusta. Keskeneräisille jalankulun ja pyöräilyn väylille on tehty kerrosrakenteita. Aukeankadun työnaikaisen kiertoliittymän ajosuuntia muutettiin alkuvuodesta, ja yötöinä kohdassa on tehty tulevien liikennevalojen suojaputkituksia. Uudenmaankadulla on lisäksi viimeistelytiekaiteita.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Renkomäen ABC:n risteyksessä kaista-järjestelyjä työvaiheiden mukaan
- Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn väylällä
- Aukeankadun kohdalla liikennevalojen valmistelevia töitä
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt jatkuvat mullan levityksellä ja istutuksilla
- Hulevesipumppaamojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien viimeistelytyöitä
- Kaiteiden asennustyöt
- Jalankulun ja pyöräilyn väylien rakennekerrosten teko

Uudenmaankadulla viimeistellään tiekaiteita.



## VIIKON ONNISTUMISET:

Istutustyöt on aloitettu.

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
