
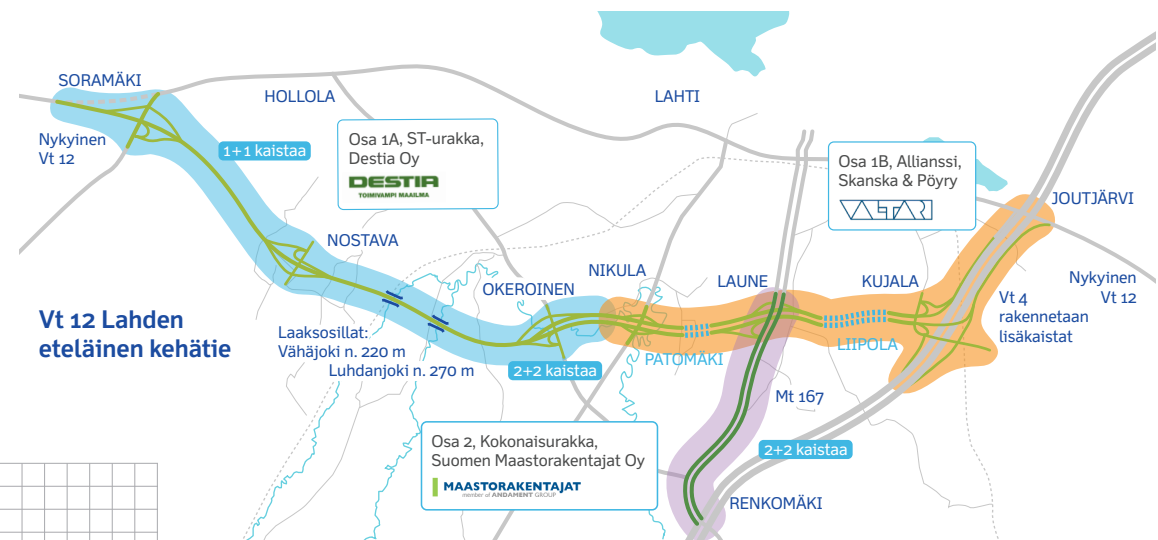


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadun vanhojen alikulkukäytävien purkutyöt saatiin valmiiksi
2. Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotie valmistui
3. Hankkeen länsipäässä betonivalut ovat onnistuneet hyvin

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 442 tapaturmatonta päivää.



## Hankeosa 1A

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla Tikkakalliontien alueella on tehty maaleikkausta ja penkereitä. Luhdanjoen alueella on paalutettu, tehty maaleikkausta ja louhepenkereitä ja Patiokallionalueella on siirretty louhetta ja tehty Vähäjoen ylikulkusillan perustusten töitä.

Asfaltointityöt ovat alkaneet ensi viikolla käyttöön otettavan kiertotien päällystyksellä Okeroisissa. Kiertotien ollessa käytössä, saadaan paalutus sekä monet muut työvaiheet laajennettua nykyisen Ala-Okeroistentien kohdalle. Tällä viikolla Okeroisissa onkin paalutettu useassa kohdassa, ja lisäksi alueella ovat jatkuneet maaleikkaukset sekä louhepenkereiden rakentaminen.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Maanantaina 23.7.2018 otetaan käyttöön lyhyt ajoneuvoliikenteen kiertotie Okeroisissa
- Soramäessä ja Nostavantiellä tehdään louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä jatkuvat louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden rakentaminen
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten rakentaminen jatkuu

### Viikon onnistumiset

- Okeroisten kiertotie on valmis!



Kuvassa juuri päällystetty Okeroisten kiertotie.

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla Ajokadun risteyssillan paalutustyöt on saatu valmiiksi ja Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat on valmisteltu viikonlopun asfaltointia varten. Patomäen tunnelin maatyöt ovat jatkuneet suunnitellusti ja seuraavalla viikolla pääsemme aloittamaan kaivannon tuentojen rakentamisen. Liipolassa tunnelilouhinnat ovat edenneet suunnitellusti.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Nikulan alueella aloitetaan maaleikkaukset
- Maakaasuputkien kaivuutyöt ja johtojensiirtotyöt jatkuvat Patomäessä
- Patomäen kaivannon tuentatyöt aloitetaan
- Orvokkientien jakavan kerroksen rakentaminen jatkuu
- Launeen koulun alueella alkaa väliaikaisen kevyenliikenteen väylän rakentaminen
- Ajokadun risteyssillan anturoiden teko alkaa
- Liipolan tunnelin itäisen suuaukon ja toisen tutkimustunnelin louhinnat jatkuvat
- Liipolan välitunnelin kevennyskaivuut alkavat
- Maanantaina 23.7. Luhdantaustankatu ja torstaina 26.7. Apilakatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä ja kevyenliikenteen kiertotiet otetaan käyttöön.

### Viikon onnistumiset

- Luhdantaustankadun väliaikaisen kevyenliikenteen tien valmistuminen.



Luhdantaustankadun kevyenliikenteen kiertotien pohjat valmiina asfaltointia varten.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu työskentelyä helteisessä säässä töiden keskittyessä uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentamiseen ja viimeisten urakassa uusittavien alikulkukäytävien purkuun. Kuluneen viikon aikana on otettu käyttöön muutamia uusia kiertoteitä. Muualla urakka-alueella on tehty uusien alikulkukäytävien raudoitus- ja ympärystyttötöitä. Nikkilän alikulkukäytävä betonoitiin ja Launeen alikulkukäytävän sääsuoja purettiin, kun silta saatiin vesieristettyä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän kaivu- ja paalutustyöt alkavat
- Kangasmäen alikulkukäytävän kehän muotin tuplaus alkaa
- Orimattilankadun alikulkukäytävän täyttö- ja putkitustyöt alkavat
- Aukeankadun alikulkukäytävän kaivutyöt alkavat
- Nikkilän alikulkukäytävän muotin purku
- Launeen alikulkukäytävän betonirakenteen ulkopuolelle tehtävät maatyöt jatkuvat
- Launeen risteysillan maatumien valua ja vesieristystöitä
- Lisäksi keskitytään uusien kevyenliikenteenväylien rakentamiseen

## Viikon onnistumiset

- Kaikki Uudenmaankadun vanhojen alikulkukäytävien purkutyöt saatiin valmiiksi



Purettu Aukeankadun alikulkukäytävä ja kiertotiet.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
