



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Soramäessä valmistuivat sillankorjaukset ja niiden aiheuttama liikennehaitta poistui
2. Uudenmaankadulla Renkomäen ABC:n risteyksen uudet liikennevalot toiminnassa
3. Mediahuomiota aiheuttanut, louhintojen yhteydessä valtatielle 4 pudonnut lohkare saatiin siirrettyä nopeasti pois tieltä

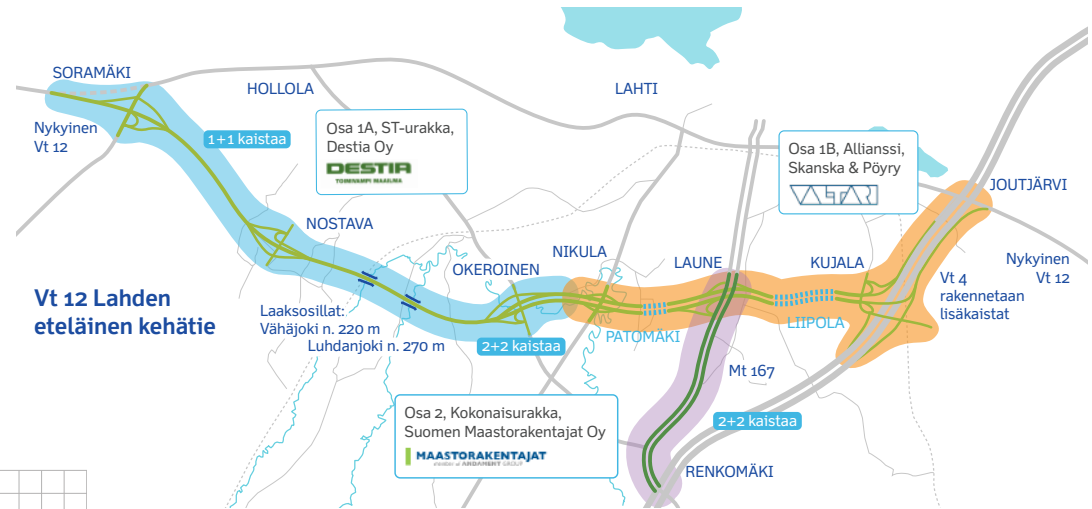

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*, rakentamisen alusta 512 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



Hankeosa 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Hollolan päässä on tällä viikolla valmistunut kaksi merkittävää kohdetta: Ahertajantien sekä Pässinportin korjaussillat. Korjaussiltojen rakentaminen aloitettiin kesäkuun loppupuolella, ja silloilla mm. korjattiin kaiteita, pinta-rakenteita ja kannet asfaltointiin uudelleen. Hienoa nähdä, kun työn alla olleet kohteet valmistuvat! Myös Soramäen murskaustyöt saatiin valmiiksi ja niitä ei ole enää tarkoitus Soramäessä jatkaa. Muualla työt jatkuvat, ja meneillään on mm. maa- ja kalliroleikkausta sekä louhepenkereiden rakentamista. Patiokalliolla tehdään kalliroleikkausta sekä rakennetaan tulevan sillan pilareita, raudoitetaan paaluja ja tehdään valuja. Okeroisissa valmistellaan eritasoliittymän rakentamista, ja siellä on käynnissä paalulaatoilla raudoitus, muotitus ja paalulaatta-pohjien tekeminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä louhintojen takia
- Jotkut työvaiheet vievät enemmän aikaa, ja louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat edelleen Soramäessä, Tikkakallion- sekä Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella
- Takamaalla jatketaan vielä koepaalutuksia

Viikon onnistumiset

- Kaksi korjattavaa siltaa saatiin valmiiksi ja kiertotiet on purettu!



Kuvassa koepaalutukset käynnissä Takamaalla.

Hankeosa 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä on jatkunut tunnelin paalutustyö sekä maakaivutyöt. Launeella tehdään eritasoliittymän louherakennetta ja työmaatietä sillalle. Ajokadun sillan osalta on jatkettu muottitöitä sekä kannen raudoitusta. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla on porattu kalliota ja ensi viikolla kohteissa aloitetaan louhinta. Louhinnat ovat jatkuneet Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella Kujalassa. Kujalassa on jatkettu siltojen rakentamista ja uuden kehätien louherakenteiden tekoa. Murskaustoiminta on lopetettu tältä vuodelta ja jatkuu taas keväällä 2019.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Valtakunnallisena heijastinpäivän aamuna VALTARILAISET jakavat heijastimia Launeen koulun luona.
- Liikennevalot otetaan käyttöön Sokeritoppanpolun kevyenliikenteenväylällä
- Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
- Patomäessä muun muassa maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyöt
- Launeella tehdään eritasoliittymän rampin louherakennetta sekä työmaatietä
- Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan ja suoritetaan ensimmäiset louhintaräjähdykset
- Louhinta sekä louheen kuormaus jatkuvat Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4-tien varrella
- Ajokadulla ja Kujalassa jatkuvat siltojen rakennustyöt

Viikon onnistumiset

- Keskiviikkona valtatielle 4 tippunut kivenlohkare saatiin reippaasti siivottua ja suljettu kaista nopeasti avattua liikenteen käyttöön.



Kuvassa valtatie 4 kohta, josta siivottiin louhinnassa tielle pudonnut kivilohkare.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Hankeosan eteläosassa, Renkomäen ABC:n risteyksessä otettiin käyttöön uudet liikennevalot ja Kyöstilän alikulkukäytävällä siltamuotti saatiin valmiiksi valua varten. Hankeosan pohjoispäässä Aukeankadun alikulkukäytävällä valettiin perustukset. Alikulkukäytävillä tehdään monessa kohtaa ahkerasti töitä ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä valmisteltiin vesieristystöitä. Tulevalla Hankaankadulla rakennettiin ABC:n pään liittymää, ja Launeen päässä asennettiin jalustoja ja suojaputkia valaistusta, liikennevaloja ja telematiikkaa varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Uudenmaankadun-Apilakadun-Launeenkadun risteyksen kohdalla otetaan käyttöön työnaikainen kiertoliittymä tiistaina 2.10. illalla
- Aukeankadun kiertoliittymän ja Launeen kiertotien välillä liikennettä siirretään hieman sivusuunnassa kulkemaan tien länsireunassa.
- Alikulkukäytävillä tapahtuu! Kyöstilän alikulkukäytävällä valetaan sillan kehä, Aukeankadun alikulkukäytävällä aloitetaan telinetyöt, ja Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä
- Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista, pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerrosrakenneiden tekoa sekä melukaiteiden ja tukimuurin asennustöitä

Viikon onnistumiset

- Renkomäen ABC:n risteyksessä otettiin uudet liikennevalot käyttöön.



Kyöstilän alikulkukäytävä valmis valua varten.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
