
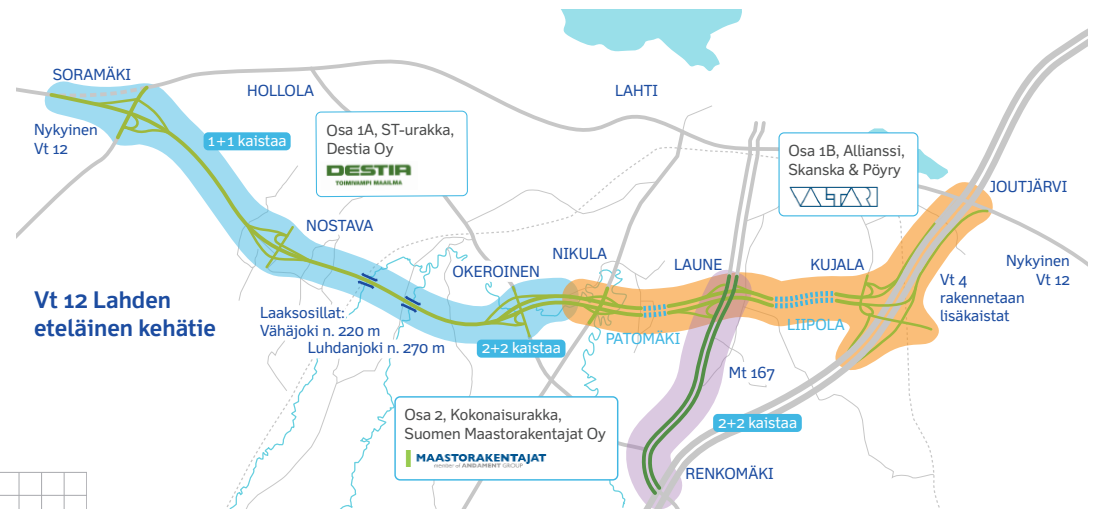


# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Syksy hiipii kylään, silti useita työvaiheita käynnissä kehätielinjalla
2. Kyöstilän alikulkutunneli valettu, enää yksi silta valamatta Uudenmaankadulla
3. Liipolan tunnelilouhinta etenee hyvin

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0\*,  
rakentamisen alusta 519 tapaturmatonta päivää.

\* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## Hankeosa 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Soramäessä on tällä viikolla valmisteltu tulevia kiertotiejärjestelyitä ripeää tahtia. Soramäessä on lisäksi käynnissä kallioleikkaukset, louherakenteen muotoilut ja luiskatyöt. Takamaalla on käynnissä maaleikkaukset ja louhepenkereiden tekeminen. Patiokalliolla louhitaan ja tehdään kallionlujitustöitä, Vähäjoensillalla rakennetaan sillan anturoita ja pilareita. Okeroisissa on käynnissä telematiikkaan ja valaistukseen liittyvät työt, lisäksi alueella tehdään louhepenkereitä ja maaleikkausta. Ala-Okeroisten sillan kannella on käynnissä raudoitustyöt.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Tikkakalliontien läheisyydessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

### Viikon onnistumiset

- Syksyinen sää on suosinut ja työmaa on edennyt joutuisasti.



Kuvassa Vähäjoensillan pylväitä kohoaa korkeuksiin.

## Hankeosa 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla valtakunnallisena heijastinpäivänä VALTARILAISET olivat jakamassa heijastimia Launeen koulun luona. Innokkaita heijastimen ottajia oli paljon ja samalla heitä muistuteltiin heijastimen käytön tärkeydestä. Kuluneella viikolla saavutettiin yksi Patomäen tunnelin merkkipaaluista, kun ensimmäiset tunnelin kattorakenteessa käytettävät TT laatat (pitkä esijännitetty teräsbetonielementti) valettiin. Launeella on tehty uuden kehätien louherakennetta ja Ajokadun sillalla ovat jatkuneet muotti- sekä kannen raudoitustyöt. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla sekä välitunnelin kohdalla on porattu ja louhittu. Louhintaa on vielä jatkettu Liipolan liikennetunnelissa ja Kujalassa siltojen rakentamista.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Työmaa-alueen pohjoispäässä tehdään uusia liikennejärjestelyjä valtatie 4 lisäkaistojen rakentamista varten ja 60 km/h rajoitusalue lisääntyy n. kilometrin pohjoisen suuntaan menevillä kaistoilla
- Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
- Patomäessä kaivetaan maata ja maassa olevia paaluja esiin
- Launeella tehdään maaleikkaustöitä
- Liipolan liikennetunnelin louhinta sekä louheen kuormaus ja läntisen suuaukon sekä välitunnelin poraus ja louhinta jatkuvat
- Kujalassa jatketaan louheen lastausta ja louherakenteiden tekoa
- Ajokadulla ja Kujalassa jatkuvat siltojen rakennustyöt

### Viikon onnistumiset

- Työmaan siltapaikat siistejä ja tavarat järjestyksessä!



Patomäen kattorakenteessa käytettävän TT laatan numeron 1 valu käynnissä.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Säätilan muuttuessa päivä päivältä syksyisemmäksi, töitä valmistuu vähitellen. Kyöstilän alikulkutunnelin kehä betonoitiin kuluvalle viikolla ja Aukeankadun alikulkutunnelikin etenee ihan mukavasti. Launeen liikennevaloliittymä Apilakadun / Launeenkadun risteyksessä muutettiin kiertoliittymäksi, jotta päästään rakentamaan Uudenmaankadun liitosta kehätien ylittävälle Launeen risteysillalle.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän kehän muotin purku
- Kangasmäen alikulkukäytävän vesieristystyöt
- Launeen & Patomäen & Nikkilän alikulkukäytävillä rakennetaan kaiteita
- Launeen risteysillalla päällystystöitä
- Väylärakentamisen osalta rakennetaan mm. kantavaa kerrosta Launeen päässä ja lisäksi vaahtolasikevennyksiä, valaistusta sekä kehätien liikenteenohjausjärjestelmän kaapelointien suojausputkituksia

## Viikon onnistumiset

- Kyöstilän alikulkutunnelin kehän betonointi.



Kyöstilän alikulkutunneli betonoitiin kuluvalle viikolla.

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
