



# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Launeen uusi, tulevan kehätien ylittävä silta otettiin liikenteelle
2. 5.11 alkaen Vt 4 Kujalan kohdalle siltatyömaan alituksen korkeusrajoitus
3. Ala-Okeroisten sillan kannen jännitystyöt onnistuivat

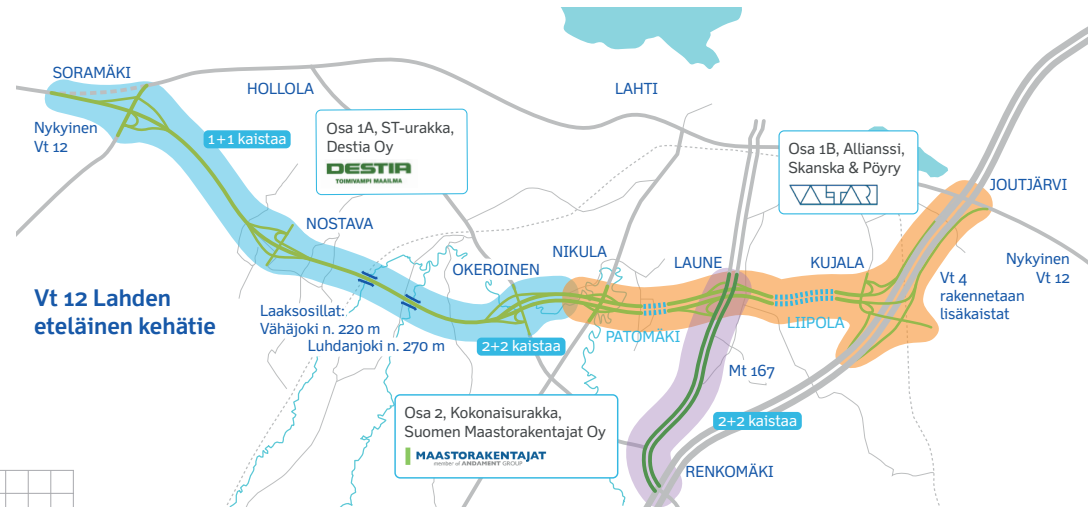

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0\*,  
rakentamisen alusta 547 tapaturmatonta päivää.

\* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## Hankeosa 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

#### Tilannekatsaus

Maanrakennustyöt ovat käynnissä miltei koko tielinjan alueella, mutta tällä hetkellä työt painottuvat Takamaalle. Takamaalla tehdään massanvaihtoa, paalutetaan sekä louhitaan kalliota. Myös tulevan yksityistien rakentaminen on käynnissä työmaan kulkuyhteyksien parantamiseksi. Soramäessä valmistellaan tulevan sillan tukien louhintaa sekä rakennetaan penkereitä kohti Takamaata. Okeroisissa tehdään valaistukseen ja telematiikkaan liittyviä töitä. Silloilla on käynnissä anturoiden ja pilareiden rakennustöitä ja vähän aikaa sitten valettu Ala-Okeroisten sillan kansi jännitettiin.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

#### Viikon onnistumiset

- Ensimmäiset sillan kannen jännitystyöt onnistuivat.



Kuvassa tielinjalla tapahtuu. Patiokalliolta itään tehdään töitä mm. kaivinkoneilla, paalutuskoneella ja kuorma-autoilla.

## Hankeosa 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

#### Tilannekatsaus

Tällä viikolla aloitettiin Ali-Juhakkalan sillan paalutustyöt. Lisäksi Nikulan eritasoliittymän alueella on rakennettu työmaatietä. Patomäessä saatiin viikon aikana pontitus valmiiksi ja maakaivutöitä jatkettiin sekä Patomäessä että Launeella. Launeella on jatkettu työmaatien tekoa, ja maa- ja kiviainesten kuljetus aloitettiin Uudenmaankadun yli. Ajokadulla on tehty sadevesiviemärintiä tulevan monitoimitalon kohdalla ja Ajokadun risteyssillalla on tehty sääsuojaa ja sillan kannen jännitys. Louhinta on jatkunut Liipolan tunnelissa sekä välitunnelin kohdalla. Kujalassa on jatkettu muun muassa siltojen sekä paalulaattojen rakentamista. Vt 4 varrella uusien liikennejärjestelyiden rakentaminen jatkuu.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla korkeusrajoittimien (4,4 m) asennus, ensimmäisen risteyssillan telineaukkojen sekä kaistan rakennustyöt
- Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
- Ali-Juhakkalan sillan paalutus
- Patomäen tunnelin anturoiden rakentaminen alkaa
- Ajokadun risteyssillan valumuotti puretaan
- Liipolan työmaatietä louhitaan sen loiventamiseksi
- Liipolan tunnelin louhinta jatkuu ja välitunnelilla tehdään maaleikkaus ja louheenlastaustöitä

#### Viikon onnistumiset

- Ali-Juhakkalan sillan paalutustöiden aloittaminen



Ali-Juhakkalan sillan paalutus

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Launeen alueella tehtiin runsaasti viimeistelytyötä: päällystyksiä, tiemerkin-  
töjä, melukaiteiden ja valaistuksen asennusta. Perjantaina liikenne siirrettiin  
kulkemaan uusien rakennettujen siltojen päältä. Se mikä ohikulkijalle näyttää  
yhdeltä sillalta, sisältää tosiasiaa kolme siltaa: Launeen risteyssillan,  
Launeen alikulkukäytävän ja Patomäen alikulkukäytävän.  
Aukeankadun kohdalla valmisteltiin liikenteen siirtoa Nikkilän alikulkukäy-  
tävän päälle kerrosrakenteita tekemällä ja kaiteita asentamalla. Vastaavia  
työtä tehtiin myös Orimattilankadun kohdalla sijaitsevan Kangasmäen alikul-  
kukäytävän kohdalla.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeella alkaa kiertotien purku ja pohjoiseen johtavan ajoradan rakennustyöt Apilakadun päässä
- Säiden salliessa tehdään muutoksia Uudenmaankadun ajolinjoissa välillä Renkomäen ABC – Ajokatu
- Sään salliessa myös Aukeankadun ajolinja siirtyy pois lyhyeltä kiertotieltä
- Kyöstilän alikulkukäytävällä jatketaan vesieristystöitä
- Orimattilankadun risteyksessä rakennetaan liikennevalojen putkituksia ja jalustoja
- Päällystystöitä tehdään useassa kohtaa
- Muina maarakennustöinä mm. vesijohdon ja hulevesiviemärin asennusta sekä rakennekerrosten tekoa

### Viikon onnistumiset

- Liikenne siirretty pois kiertotieltä Launeella!



Launeen sillan länsireuna avattiin liikenteelle perjantaina 2.11.2018.

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-  
vampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja  
elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-  
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen  
ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt  
maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät  
keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
