
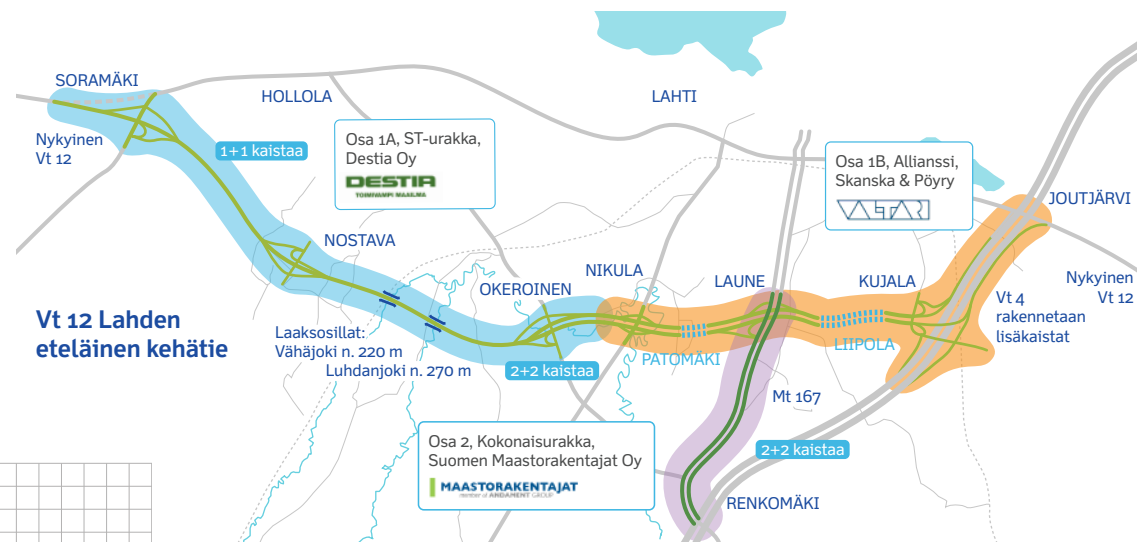


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Lotilan risteyssillan paalutus
2. Jalankulun ja pyöräilyn väylien valmistuminen Uudenmaankadulla ja Launeen koulun tienoolla
3. Sää on suosinut rakentamista

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,
rakentamisen alusta 463 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Työt ovat nyt käynnissä lähes koko uuden kehätien linjalla. Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien silloilla tehtiin asfaltointia. Okeroisissa jatkettiin paalutuksia ja tehtiin maaleikkausta, louhepenkereitä, paalu-laattojen raudoituksia sekä työsiltaarakenteita. Ala-Okeroisten sillan paalutus valmistui. Patiokalliolla, Tikkakalliontien läheisyydessä sekä Soramäessä tehtiin louhepenkereitä, maaleikkausta ja pintamaan poistoa sekä louhittiin kalliota. Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäiset anturat saatiin valettua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät uudet liikennejärjestelyt Soramäessä
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten työt jatkuvat
- Murskaus alkaa Soramäessä
- Ala-Okeroisten sillan sekä Vähäjoen ylikulkusillan välitukien pilarityöt alkavat

Viikon onnistumiset

- Työmaaliikenne kulkee tulevaa tielinjaa Okeroisista Nostavantielle
- Ensimmäiset anturoiden valut Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillalla



Kuvassa Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäisenä valmistunut antura.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä jatkuivat maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä kaivannon tuentatyöt. Orvokkitiellä, Ajokadulla sekä Orvokkietien ja Sokeritopankadun välisellä jalankulun ja pyöräilyn reitillä tehtiin tien rakennekerroksia ja asfaltointia. Launeen koulun ympäristössä valmisteltiin liikenne- ja muita järjestelyjä. Liipolassa jatkuivat liikennetunnelin sekä toisen tutkimustunnelin louhinnat. Tunnelin itäisellä suuaukolla lastattiin louhetta ja tehtiin poraustöitä. Vt 4:n varrella paalutettiin Lotilan risteyssillan perustuksia ja aloitettiin louhintatyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Orvokkitie avattu liikenteelle
- Patomäessä maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä kaivannon tuentatyöt jatkuvat
- Liipolan liikennetunnelin louhinta jatkuu
- Liipolan välitunnelin tuentatyöt
- Liipolan tunnelin itäisen suuaukon poraus ja louhinta
- Murskauslaitoksen toteuttaminen Liipolan tunnelin itäiselle suuaukolle
- Louhintatyöt Vt 4:n varrella jatkuvat. Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Viikon onnistumiset

- Lotilan risteyssillan paalutus



Lotilan risteyssillan paalutustyöt käynnissä Vt 4:n varrella.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Viikon aikana viimeisteltiin uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, eli tehtiin valaistus- ja kaideasennustöitä sekä tiemerkinntöjä. Patomäen alikulkukäytävällä raudoitettiin ja valettiin siirtymälaattoja. Siirtymälaatat ovat laattamaisia rakenteita, joilla estetään sillan ja siihen liittyvän penkereen yhtymäkohtaan syntyviä painumia. Muualla tehtiin täyttötöitä sekä seuraavia työvaiheita valmistelevia töitä, kuten paalutus pohjien täyttöä ja siltojen muuttien purkua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan pumppaamon asennus
- Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaattojen muotti- ja raudoitustyöt
- Kangasmäen alikulkukäytävän muotin purku- ja täyttötöyt
- Aukeankadun alikulkukäytävän paalutustyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän täyttötöyt
- Launeen alikulkukäytävän siirtymälaattojen rakentaminen
- Launeen risteyssillan vesieristys- ja täyttötöyt ja liikuntasauam-laitteiden asennus
- Patomäen alikulkukäytävän sääsuojan asennus ja vesieristystöyt

Viikon onnistumiset

- Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien viimeistely



Kangasmäen alikulkukäytävän muotin purkutyöt käynnissä.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
