
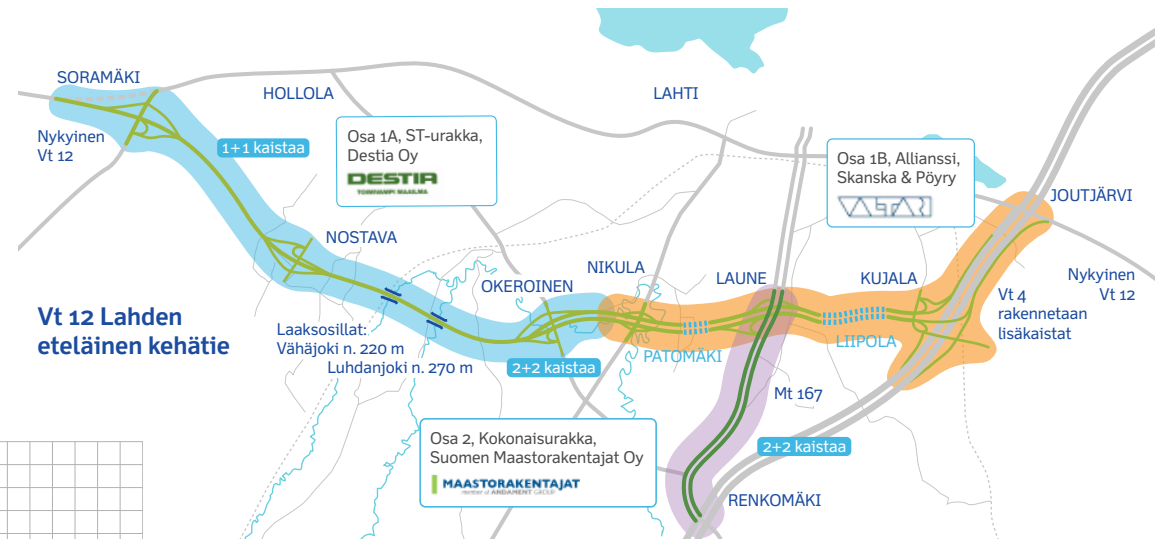


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadun kaikki paalutukset on saatu valmiiksi
2. Valaistuksen rakentaminen on aloitettu Launeen koulun lähellä ja Uudenmaankadulla
3. Siltatyöt ovat toden teolla käynnissä koko kehätien linjalla

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 477 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus


Tällä viikolla Okeroisten päässä tehtiin työsiltojen maatöitä, kuivatuksia sekä telinepohjia, Vähäjoen ylikulkusillalla puolestaan pilareiden muotituksia, anturan valuja sekä paalutuksia. Paalutukset ovat tältä erää päättyneet, mutta jatkuvat toki tuonnempana. Paaluja on nyt lyöty maahan puolentoista maratonin verran eli n. 60 kilometriä. Koko hankeosalla tehtiin maaleikkauksia ja louherakenteita. Tikkakalliontiellä työllistivät vesihuollon siirtotyöt ja Soramäessä murskattiin kiviaineksia kehätien rakennekerroksiin käytettäväksi.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden ja pilareiden teko Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella
- Murskaus jatkuu Soramäessä

Viikon onnistumiset

- Sillat alkavat hiljalleen nousta maanpinnasta ylöspäin, ensimmäisiä siltapilareita on valettu

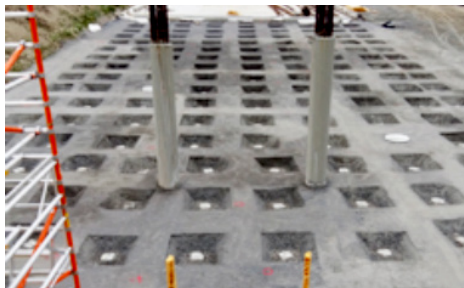

Kuvassa näkyy sienilaatan pohjaa ja siltapaaluja.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Nikulan tulevan eritasoliittymän alueella käynnistettiin työt Porvoonjoen uoman siirtoa varten. Alueella rakennetaan työmaateitä, joiden valmistuttua aloitetaan uuden joenuoman kaivutyöt. Patomäessä jatkettiin johtosiirtotöitä sekä kaivannon tuentatöitä. Valaistuksen rakentaminen alkoi Orvokkitiellä ja Launeella tehtiin kehätien maaleikkaustöitä. Louhinnat jatkuivat Vt 4:n varrella, Liipolan liikennetunnelissa ja tunnelin itäisellä suuaukolla, jossa myös murskattiin kiviainesta. Siltojen rakentaminen eteni sekä Ajokadulla että Kujalassa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
- Porvoonjoen uoman siirtotyöt jatkuvat
- Patomäessä kaivannon tuentatyöt jatkuvat
- Liipolan liikennetunnelin louhinta ja välitunnelin tuenta- ja kaivutyöt jatkuvat
- Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla lastataan louhetta ja murskataan kiviainesta
- Louhintatyöt Vt 4:n varrella
- Sillanrakennustyöt Ajokadulla ja Kujalassa

Viikon onnistumiset

- Ajokadun risteyssillan telinetyöt pääsivät alkuun



Porvoonjoen uoman siirron valmistelevat työt ovat käynnissä.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla töitä tehtiin varsin vaihtelevassa säässä. Syksyn alkuun saatiin asennettua valaisinpylväät Orimattilankadulta aina Aukeankadulle saakka, ja ensi viikolla on tarkoitus ottaa valaistus käyttöön. Paalutukset ovat valmistuneet koko hankeosalla, ja täyttötöitä tehtiin Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä. Launeen risteyssillalla jatkettiin vesieristystöitä ja päätyjen täyttöö. Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaatan raudoitustyöt ovat valmistumassa ja ensi viikolla raudoitetaan anturoita.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan pumppaamon asennus
- Kyöstilän alikulkukäytävän anturoiden raudoitus ja valu
- Kangasmäen alikulkukäytävän täyttötöyt
- Aukeankadun alikulkukäytävän hulevesiviemärien, salaojien ja terässuojaputkien asennustyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän siirtymälaattojen teko ja täyttötöyt
- Launeen alikulkukäytävän siirtymälaatan valu
- Launeen risteysillan kannen vesieristystyöt, päiden täyttötöyt ja liikuntasaumalaitteen hitsaus
- Patomäen alikulkukäytävän vesieristystyöt

Viikon onnistumiset

- Paalutukset saatiin valmiiksi



Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaatan raudoitustyöt ovat valmistumassa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
