
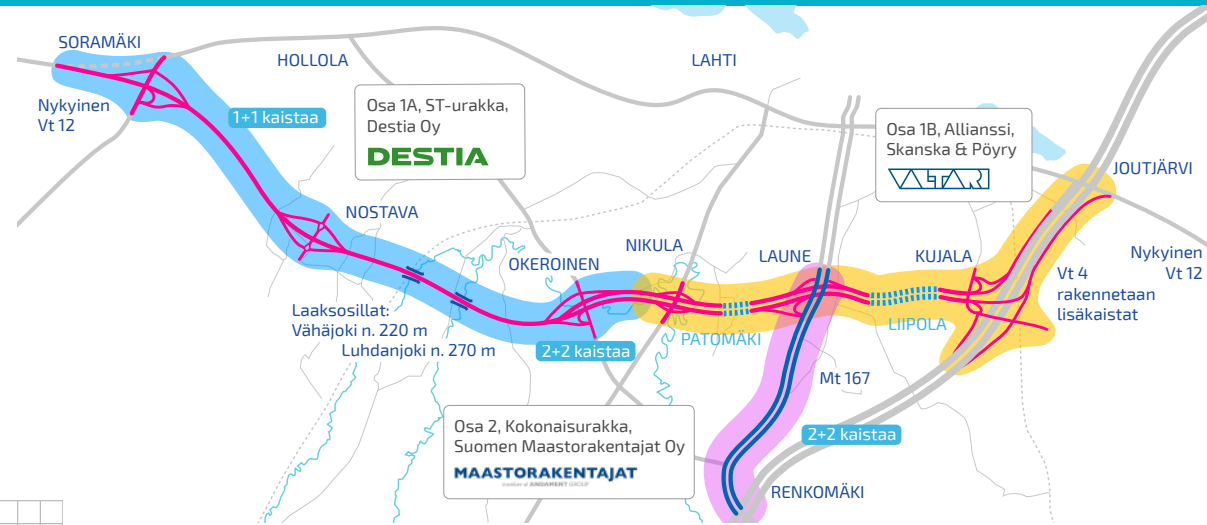


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Viikkotiedote saa jatkuvasti hyvää palautetta, tämä on 100. viikkotiedote
2. Luiskien viimeistelytyöt etenevät hienosti Hollolan urakassa
3. Lepolan ylikulkusillan reunapalkki valettiin viikko etuajassa

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

52 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Työt sisältävät louhintaa ja Riihimäentien liikenne pysäytetään aina louhinnan ajaksi. Nostavassa risteyssillan teline- ja muottityöt etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina ja kansia kuivatetaan, myös muottien purkutytöt ovat jatkuneet. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä. Luiskien viimeistelytyötä on tehty koko hankealueella töiden edetessä, luiskia muotoillaan ja mullataan, myös siemenlinko on ollut tällä viikolla työmaalla ruohonsiemeniä kylvämässä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintaa Riihimäentien (Kt54) läheisyydessä, töistä aiheutuu lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä Riihimäentiellä
- Paassillantiellä (Riihimäentien liittymässä) alkavat keskisaarekkeen muutostyöt
- Louhintaa Takamaalla
- Luhdanjoen sillan muottia puretaan, josta aiheutuu liikennejärjestelyjä Nostavantiellä, toinen ajokaista suljetaan ja liikennettä tullaan pysäyttämään
- Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
- Kiveystöitä Okeroisissa
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

## HANKEOSA 1B

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tiistaina vietettiin valtakunnallista heijastinpäivää ja VALTARIlta oltiin jakamassa heijastimia koululaisille ja muille tiellä liikkujille Launeen koulun edustalla. Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus ja paalujen katkaisu risteyssillan ja ramppisiltojen kohdalla. Patomäessä on tehty pohjaveden suojausta, maaleikkauksia sekä rakennettu salaojia, hulevesilinjaa ja telematiikkaa. Patomäen tunnelissa on tehty holvien laudoitusta ja raudoitusta ja jatkettu kannen vesieristystöitä. Liipolan läntisessä kalliotunnelissa on tehty reunaelementtien pohjia ja verhourakennetta. Tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla käynnissä ovat seinien ja holvien laudoitus ja raudoitus sekä valutyöt. Kujalan eritasoliittymässä valettiin Lepolan ylikulkusillan reunapalkki.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa vt 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutus- ja rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja mullan seulonta
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
- Louheen lastaus valtatie 4 varrella

Luiskia viimeistellään. (Kuva: Seppo Kujanen)



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Luiskien viimeistely-  
työt etenevät hienosti.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Lepolan ylikulku-  
sillan reunapalkin  
valu saatiin tehtyä  
viikko etuajassa!

Heijastimien jakoa Launeen koulun edustalla.



## HANKEOSA 2

# Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Urakan eteläpäässä Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus jatkui. Venetsian risteyksessä Ajokadulla on tehty rakennekerrosten vaihtoa. Ajokadulla alkuvuokasta tehdyt päällystystyöt epäonnistuivat osin sääolosuhteiden vuoksi, joten ne joudutaan tekemään uudelleen. Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla hulevesityöt jatkuvat. Patometsänkadulla tehtiin päällystystöitä. Aukeankadun risteyksessä saatiin lisää kaistoja käyttöön ajoratamerkintöjen valmistumisen myötä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ABC:n risteuksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
- Jalankulun ja pyöräilyn väylä pysyy suljettuna välillä Ajokatu-Aukeankatu, kiertoreitti joko Ajokadun tai Luhdan-taustankadun kautta
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Kuivatuksen rakentamista Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus
- Päällystystöistä mm. Ajokadulla
- Kiveystöitä

Hulevesityötä Aukeankadun alikulkukäytävän luona.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Aukeankadun risteyksessä saatiin lisää kaistoja käyttöön.

## LYHYESTI

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
