
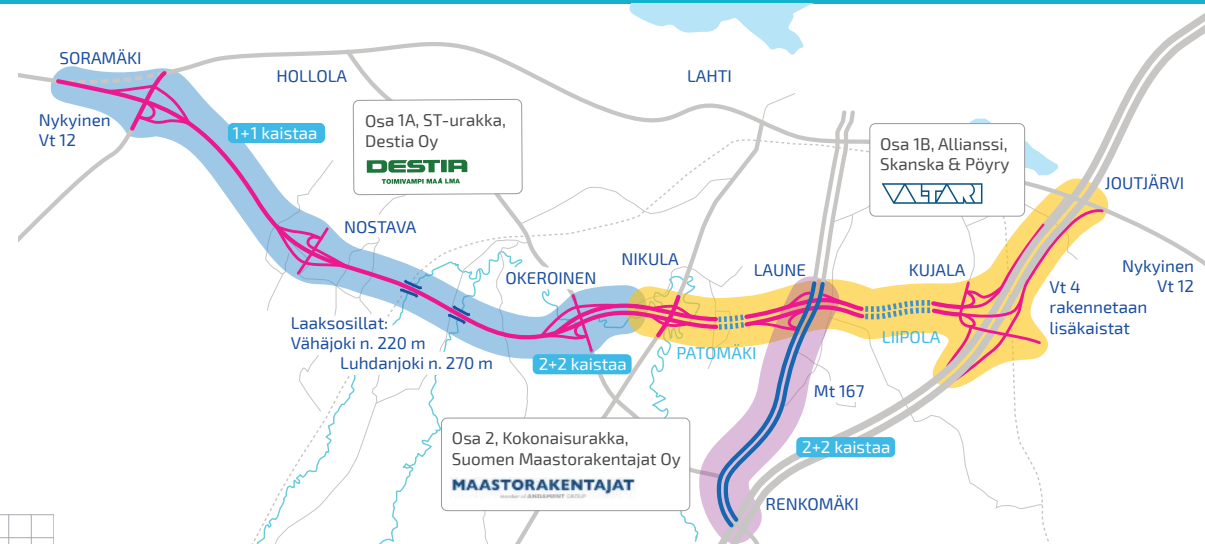


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Ensi viikolla yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2. ja Lahdessa 6.2.
2. Runsas lumi teettää paljon lumitöitä myös työmaateillä
3. Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitaoulla

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 638 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä rakennetaan tiivistä tahtia Soramäen risteyssillan alusrakenteita sekä kannen telineitä. Soramäen alikulkusillan kohdalla tehdään parhaillaan maanrakennustöitä, ja sillan rakentaminen käynnistyy lähiviikkoina. Vähäjoensillalla rakennetaan junaradalle suojakehikkoa ennen teräsrakenteen tunkkausta radan yli. Luhdanjoen sillalla tehdään perustuksia, pilareita, muotti- ja raudoitustöitä sekä rakennetaan tunkkauspetiä, eli korkeaa pengertä, jonka päältä tämänkin sillan teräsrakenne saadaan tunkattua - eli siirrettyä paikoilleen. Okeroisissa maanleikkaukset ovat loppusuoralla, ja Porvoonjoen sillan kannella raudoituskoukut, eli surrikoukut, viuhuvat – kannen raudoitustyöt ovat alkaneeet.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä
- Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patio-kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Vähäjoensillan alusrakenteet ovat valmiina sillan teräsrakenteen tunkkausta varten!

VIIKON ONNISTUMISET:

Vähäjoensillan alusrakenteet ovat valmiina sillan teräsrakenteen tunkkausta varten!

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla työmaateiden kunnossapito on onnistunut rankoista lumisateista huolimatta. Johtosiirtotyöt Helsingintien länsipuolella ovat valmistuneet ja siirtotöitä jatketaan Helsingintien itäpuolella. Kukonkosken sillan luona on tehty stabilointipohja ensi viikolla alkavaa pilaristabilointia varten. Pilarien muotti ja raudoitustyöt ovat olleet käynnissä Ali-Juhakkalan sillalla ja sillan luona on jatkettu paalutusta. Patomäessä ovat jatkuneet maaleikkaustyöt sekä Patomäen tunnelin seinien ja anturoiden laudoitus ja raudoitustyöt. Launeen eritasoliittymässä on rakennettu hulevesilinjaa. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla jatkuivat poraus, avolouhinta sekä louheen lastaustyöt. Kujalassa uuden Vanhanradankadun kohdalla on tehty louherakenteita, vesihuoltojärjestelmää sekä asennettu telematiikkakaivoja ja valaisinjalustoja. Valtatiellä 4 on aloitettu uusien helistinportaalien (korkeusrajoittimien) rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
- Pilaristabilointi Kukonkosken sillan luona
- Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
- Patomäessä maaleikkaustyöt ja tunnelin anturoiden ja seinien laudoitus, raudoitus ja betonointityöt
- Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla jatkuu poraus ja louhinta, välitunnelin kohdalla maaleikkaustyöt ja liikennetunnelin osalta louhinta
- Valtatien 4 helistinportaalien rakentaminen
- Pipon alikulkusillan paalutustyöt

Saimaan ammattikorkeakoulun ekskursioryhmä tutustumassa Liipolan tunneliin.

VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaateiden kunnossapito onnistunut lumisateista huolimatta.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työmaa on vielä pääosin talvitaulla. Käynnissä on ollut hulevesiviemärin rakennustyöt Kyöstilän alikulkukäytävällä. Muuten on keskitytty ensi kesän töiden työsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla rakennetaan hulevesiviemäriä
- Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla valmistellaan työnaikaisia tukiseiniä hulevesipumppaamon rakentamista varten

Hulevesiviemärin rakennustöitä Kyöstilän alikulkukäytävän luona.



VIIKON ONNISTUMISET:
Kesän 2019 töiden
suunnittelu etenee.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)
