


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Orvokkitien maavallien istutetut lehtipuut saivat kuorikatteen uudella puhallustekniikalla.
2. Hollolan hankeosan tielinjan massalouhinnat ovat valmistuneet.
3. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut viides työtapa-turma, jonka seurauksena työntekijä loukkaantui lievästi. Työtapa-turmasta aiheutuu arviolta neljän päivän poissaolo.



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

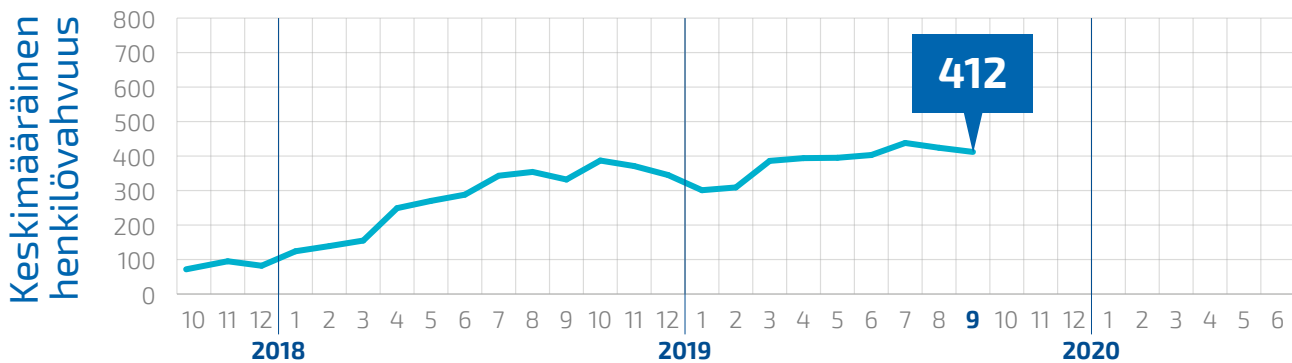

Turvallisuus

Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapa-turmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.



tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla ja kaidetoita tehdään koko tielinjalla. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt on saatu valmiiksi. Luhdanjoensillan kannen eristystyöt ovat käynnissä. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinetyöt aloitettiin. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä. Okeroisten risteyssillalla on aloitettu kannen päällystystyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
- Okeroisten alueella mm. päällystystöitä, kaideasennuksia, kiveystöitä sekä liikennemerkkien ja opasteiden asennusta
- Soramäessä Riihimäentien vierellä jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen
- Paassillantiellä (Riihimäentien liittymässä) käynnissä keskisaarekkeen muutostyöt
- Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella


Okeroisten alueella useita rakennustöitä käynnissä.



VIIKON ONNISTUMISET:

Tielinjan massalouhinnat valmistuneet.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

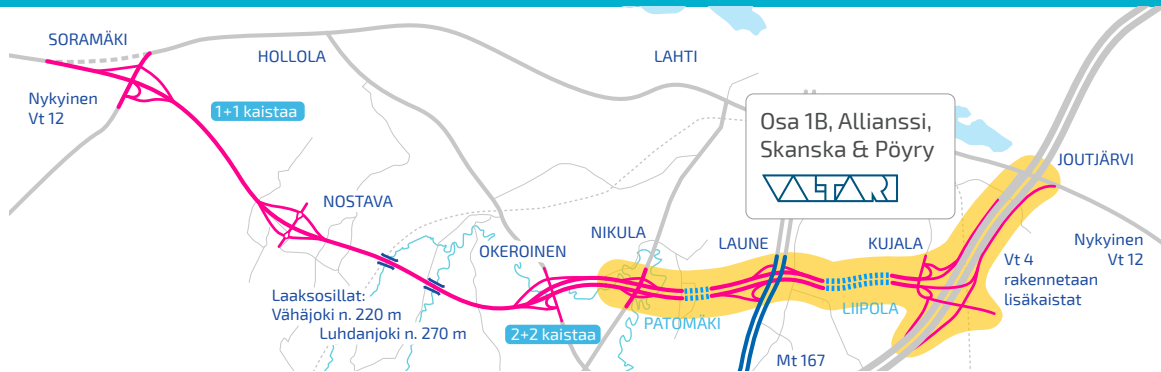

Tilannekatsaus

Tällä viikolla valmistuneen Kukonkosken sillan paalutus- ja siltatyöt ovat jatkuneet putki-paalujen katkaisulla. Nikulan ramppisillalla on aloitettu sillan raudoitustyöt, jonka lisäksi Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkauksia tielinjalla ja rampilla aloitettu vaahtolasikerroksen rakentaminen. Nikulan risteyssillalla on valettu anturoita ja päätielinjalla on rakennettu telematiikkaa ja valaistusta. Ali-Juhakkalan sillan ja Porvoonjoentien välissä meluvalli on saatu valmiiksi. Patomäen tunnelilla tehdään viimeisiä tunnelin holvivaluja. Launeella on suoritettu meluvallin puuistutuksia ja niiden kuorikatteen levitys puhaltamalla. Päätien kiilaukset sekä kantavan kerroksen rakentaminen etenevät eteläiselle ajoradalle. Liipolan tunnelissa rakennetaan betonitunneleita ja kalliotunnelissa jatkuu vesi- ja lämpöeristerakenteen teko. Kujalassa on aloitettu risteyssillan valumuottien purku sekä vanhan valtatie 4 asfalttipinnan jyrsinät.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla öisin sillan muotin purun ja asfalttoinnin vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt




Kuorikatteen levittäminen Orvokkitiellä.

VIIKON ONNISTUMISET:

Kuorikatteen levittäminen uudella puhallustekniikalla.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

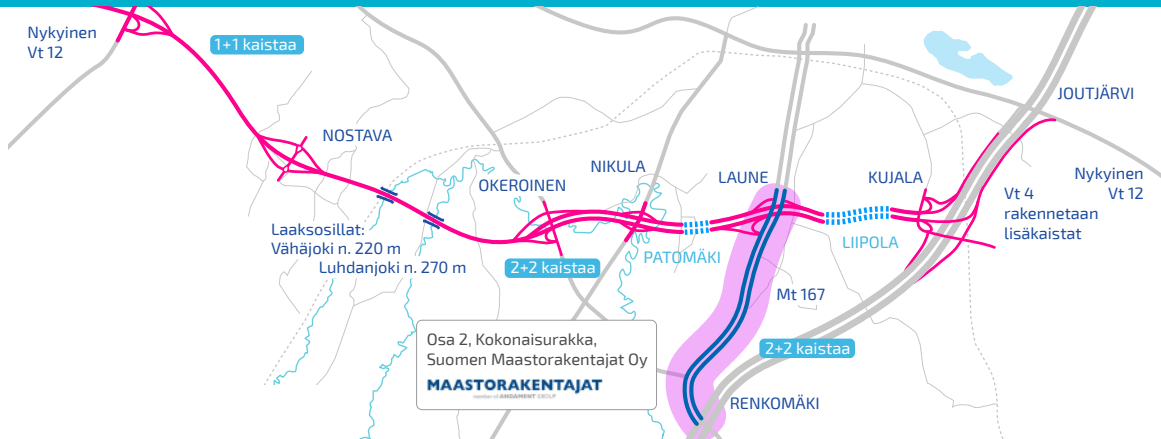

Tilannekatsaus

Kuluvalla viikolla tehtiin hulevesitöitä Aukeankadun kulmalla sekä jatkettiin Simolanmutkassa rakenteiden alta löytyneen rikkoutuneen hulevesilinjan korjaamista. Päälystystöitä tehtiin Hankaankadun risteyssillalla, pysäkeillä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Viimeiset puuttuneet portaalit asennettiin Aukeankadulle ja Patometsäkadulle, ja näin kyseisen risteuksen liikennejärjestelyt selkeytyivät. Kiveysten viimeistelyä tehtiin useassa kohtaa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kohdekohtaisia liikennejärjestelyjä ja kaistansulkuja työvaiheiden etenemisen mukaan
- Simolanmutkan reunakivi- ja asfaltointityöt (säävaraus)
- Päälystystöitä Ajokadulla ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä (säävaraus)
- Hulevesitöitä jatketaan Aukeankadun alikulkusillan läheisyydessä
- Viimeistelyitä ja siivousta koko urakka-alueella



Aukeankadun opasteportaalit

VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki portaalit on nyt asennettu.

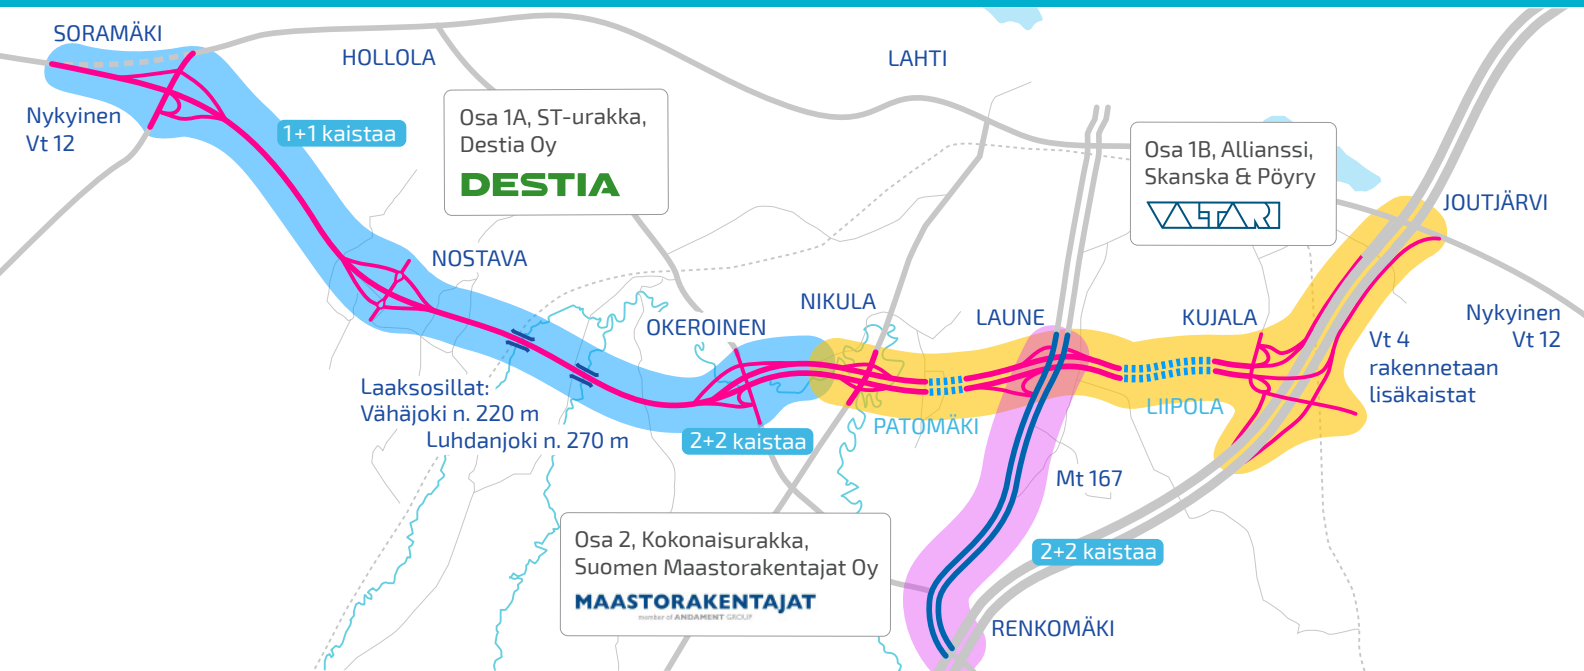

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
 puh. 029 534 3600
 janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
 puh. 029 534 3563
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)
