


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. ST-urakan projektitoimistolle on löydetty tilat
2. Allianssin mittaus- ja näytteenottotyöt moottoritiellä valmistuivat
3. Liikenne Uudenmaankadun työnaikaisissa kiertoliittymissä soljuu hyvin

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.

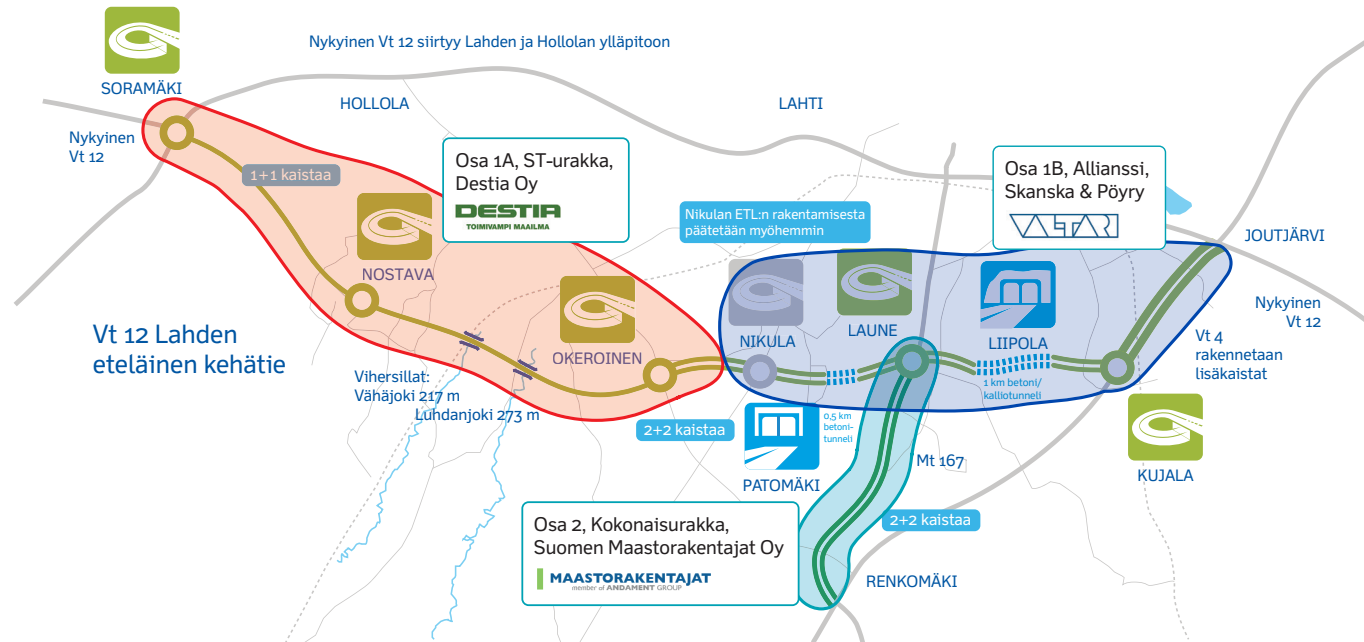

2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis



2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työmaalla työt etenevät useassa kohtaa. ABC:n kohdalla on levitetty ajorataa lopulliseen leveyteen, ja samalla purettiin käytöstä poistettu kevyen liikenteen väylä. Hankaankadun risteyssillalla on edetty sillan telinetöihin. Launeen risteyssillan alueella tehdään paalulaattojen, välipalkin ja maatuen muotitus-, raudoitus- ja valutöitä. Paalulaattoissakin riittää vielä paalutettavaa. Aukeankadun tulevaisuudessa alittavan Nikkilän alikulkukäytävän rakentaminen on käynnistynyt maanleikkaustöillä. Seuraavaksi asennetaan kaivannon työnaikaista tukemista varten tarvittavat pontit. Orimattilankadun työnaikaisessa kiertoliittymässä siltapaikkojen täytöt etenevät ja kaivantojen työnaikaisia tukiseiniä on purettu. Kangasmäen alikulkukäytävän töiden edetessä Uudenmaankadun liikenne siirretään kulkemaan uuden sillanosan päältä, jotta myös loppuosa sillasta päästään uusimaan. Suotuisia säitä odotellessa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Silta- ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
- Kangasmäentien alikulkukäytävän täytöt ja asfaltointi, säävarauksella
- Aukeankadulla lyhyt kiertotie käytössä vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi
- Aukeankatu-Alavankatu -alueella voi olla työmaaliikennettä kevyen liikenteen väylillä kunnallisteknisten töiden takia

Viikon onnistumiset

- Liikenne Uudenmaankadun työnaikaisissa kiertoliittymissä soljuu hyvin



Silta s1 Renkomäen ABC:n kohdalla.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Urakoitsija on aloittanut työsuunnittelun ja jo tarjousvaiheessa aloitettu rakennussuunnittelu jatkuu mm. pohjarakenteiden osalta. Urakoitsija on hoitanut työmaan perustamiseen liittyviä asioita. Projektitoimistolle löydettiin tilat läheltä työmaata, ja vuokrasopimuskin saatiin allekirjoitettua. Lisäksi suunniteltiin mm. työmaan turvallisuutta. Puuston poiston tarjoukset saadaan viikolla 49, puuston poistoon liittyvät rajamerkinnot on tehty. Urakka-alueelta poistettavissa rakennuksissa on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitukset.

Tulevan viikon töitä

- Puuston poiston tarjousten käsittely
- Rakennussuunnittelu
- Työmaatoimiston perustaminen

DESTIA
TOIMIVAMPI MAAILMA

Viikon onnistumiset

- Projektitoimistolle saatiin hyvät tilat sopivan matkan päästä työmaalta


Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Viikon kuluessa valtatiellä 4 tehtiin päällysteporauksia vanhan päällysteen paksuuden selvittämiseksi ja lisäksi otettiin kivinäytteitä, jotka lähetettiin edelleen tutkittavaksi kiviaineselvitystä varten. Lisäksi Launeen koulun alueelle rakennettiin työmaatie myöhemmin tarkentuvana ajankohtana tehtäviä tärinä- ja melumittauksia varten. Mittauksilla selvitetään koululle kehätien rakentamisen aikana mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Hakkuutyöt ovat käynnistyneet Porvoonjoen ylittävän Kukonkosken sillan ympäristössä. Avoimet ovet -tapahtuma Valtarin Big Roomissa keskiviikkona keräsi mukavasti osallistujia.

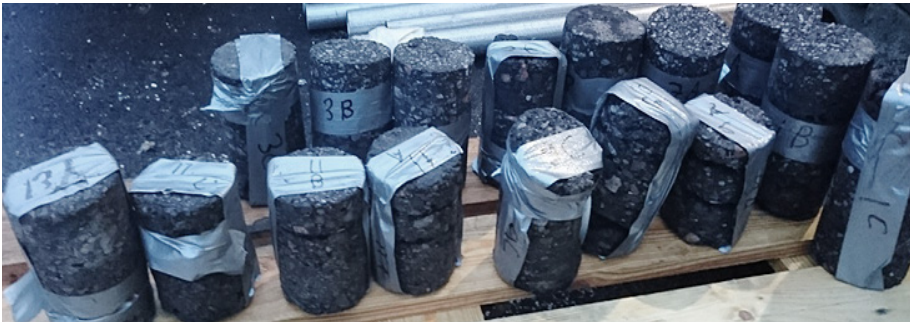

Kuvassa päällystenäytteitä valtatieltä 4.

Viikon onnistumiset

- Mittaus- ja näytteenottotyöt valtatiellä 4 valmistuivat

Tulevan viikon töitä

- Siltpaikkojen maisemasuunnittelu käynnistyy

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
