
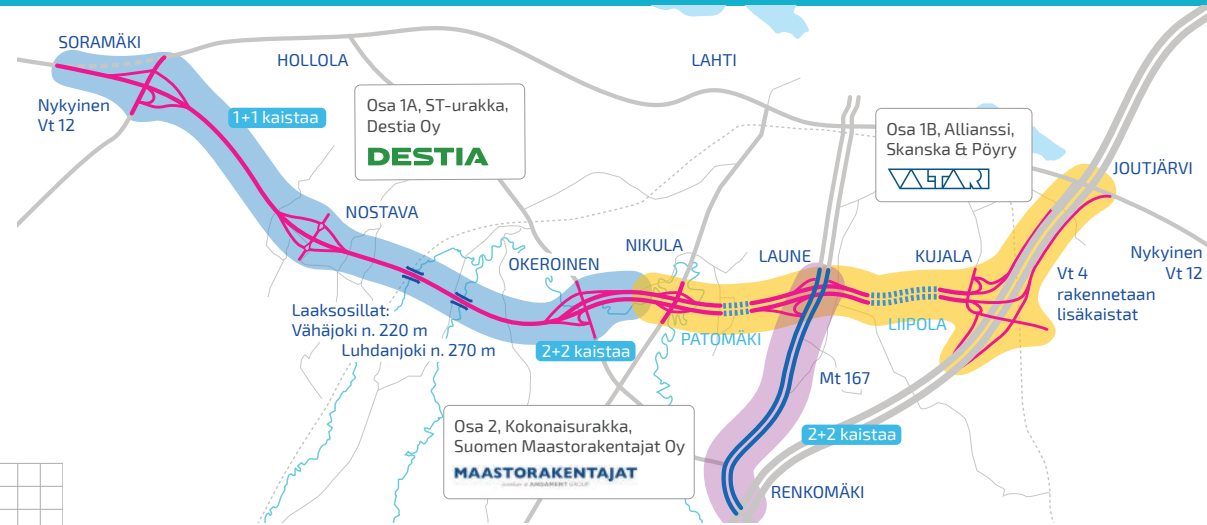


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Ensi viikolla yleisötilaisuudet Hollolassa 17.9. ja Lahdessa 18.9.
2. Soramäen eritasoliittymän meluste saatiin asennettua
3. Valtatien 4 uudet liikennejärjestelyt otettiin käyttöön sujuvasti

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, elokuu: 2,8*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

51 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on purettu vanhaa kiertotietä ja uusi melueste on saatu asennettua. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitellusti. Murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän ja Tikkakallion aluetta on päällystetty, Nostavan risteyssillan telinetyöt ovat alkaneet ja Tikkakallion tien risteyssillan pilarit on valettu. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla ovat muotin purkutyöt käynnissä. Okeroisissa on päällystetty sekä tehty kiveystöitä uudessa Ala-Okeroistentielle rakennettavassa kiertoliittymässä. Soramäen eritasoliittymä otettiin muutama viikko sitten yleisen liikenteen käyttöön ja nyt onkin miellyttävä huomata, kuinka hyvälle alue näyttää, kun luontokin on alkanut vihertää.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen eritasoliittymän alueella kaistajärjestelyjä
- Luhdanjoen sillalla muotin purkutyöt käynnissä, purkutöitä tehdään Nostavantien kohdalla, josta aiheutuu liikenteenpysäytyksiä
- Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
- Hirviایدan asennustyöt Soramäki-Takamaan alue
- Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
- Okeroisten risteyssillalla muotin purkutyöt sekä sääsuojan asennus käynnissä
- Ala-Okeroisten alueella päällystys- ja kiveystyöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)


Tilannekatsaus

Siltojen perustusten paalutukset ovat jatkuneet Nikulan eritasoliittymän ja Kukonkosken alueella. Nikulan ramppisillan työsillan teko jatkuu vielä seuraavalle viikolle. Patomäen betonitunnelin kannen vedeneristämisen valmistelevat työt on aloitettu ja telematiikkakeskusten kytkentä on suoritettu tällä viikolla. Pohjavesisuojausien teko Launeella ja Patomäessä jatkuu ja tällä viikolla on aloitettu tekemään betonikaukalon ja bentoniittimattorakenteen liitoksen rakentaminen. Kujalassa jatkuu ramppien luiskien viimeistely- ja kivityöt. Kujalan risteyssillan alueella valmistellaan pohjia betonipumppausautoille ja sillan kannen raudoitukset jatkuvat. Valtatiellä 4 tehtiin liikennejärjestelyitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Valtatien 4 liikennejärjestelyt siltatöiden vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Ali-Juhakkalan sillan vedeneristystyöt alkavat ensi viikolla
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt ja työsillan teko jatkuu
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
- Siltojen päätytyöt jatkuvat

Soramäen eritasoliittymää.

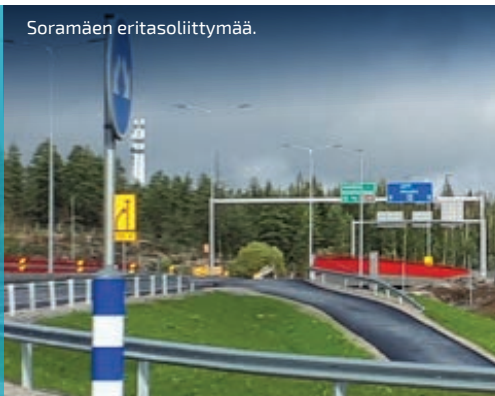

VIIKON ONNISTUMISET:
Soramäessä
luonto vihertää.

VIIKON ONNISTUMISET:
Valtatien 4 uudet
liikennejärjestelyt
otettiin käyttöön
sujuvasti.

Kujalan risteyssillalla viimeistellään raudoitusta ja valmistaudutaan sen jälkeen alkaviin valuihin.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin Aukeankadun risteysalueella päällystettyä, ja risteyksessä lisää kaistoja käyttöön. Lisää kaistoja saatiin käyttöön myös Venetsian risteyksessä. Aukeankadun eteläpuolella tehtiin ajoradan levennystä. Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Viimeistelyitä tehtiin mm. Hankaankadulla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ABC:n risteuksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
- Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus jatkuu
- Korjaus- ja viimeistelytyöiden työsuunnittelu ja aikataulutus

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)

Ajokadun risteys Venetsian ylikulkusillalta katsottuna.

VIIKON ONNISTUMISET:
Aukeankadun risteyksessä saatiin lisää kaistoja avattua.
