
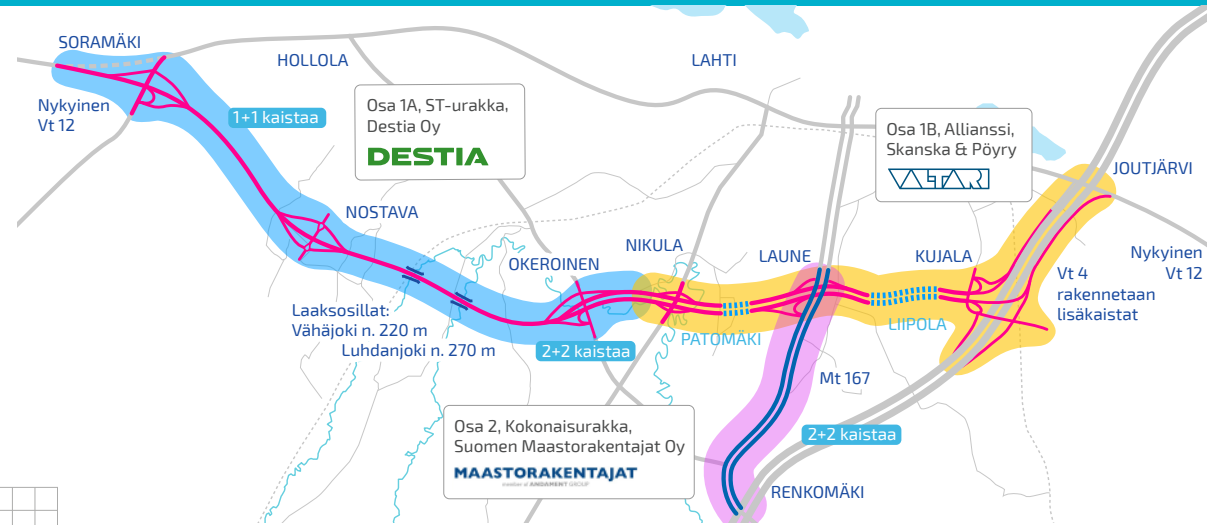


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Yleisötilaisuudet keräsivät kiinnostunutta yleisöä
2. Työnaikaiset kaistajärjestelyt purettu Soramäessä
3. Elokuussa sattuneesta lievästä tapaturmasta on myöhemmin aiheutunut lyhyt poissaolo

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, elokuu: 3,7*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

38 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän alueella liikennejärjestelyt ovat muuttuneet siten, että kaistakapasiteetti on nyt kokonaan käytössä pois lukien kehätielle itään johtavien kaistojen sulkujärjestelyt. Kyseiset järjestelyt puretaan vasta, kun kehätie otetaan kokonaisuudessaan liikenteelle. Takamaan ja Nostavan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitellusti. Murskaustyöt on saatu päätökseen Takamaalla, Nostavan eritasoliittymän ja Tikka-kallion alueita on päällystetty ja Nostavan risteyssillan telinetyöt jatkuvat. Takamaan alikukukäytävä valettiin tällä viikolla, eli kaikki valtatie 12 suuntaiset sillat on nyt valettu. Hankeosalla on vielä neljä valtatie ylittävää siltaa valamatta. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla on aloitettu meluesteen asennustyöt ja muotin purku. Okeroisten risteysillalla on tehty telineen ja muotin purkutöitä ja sillan sääsuoja on asennettu. Uudessa Ala-Okeroistentielle rakennettavassa kiertoliittymässä on päällystetty ja tehty kiveystöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Luhdanjoen sillalla Nostavantien kohdalla muotin purkutyöt käynnissä, josta aiheutuu liikenteenpysäytyksiä
- Ala-Okeroistentielle kiertotiejärjestelyjä
- Louhintaa Riihimäentien (Kt54) läheisyydessä sekä Takamaalla
- Päällystystyöt jatkuvat Tikka-kallion alueella ja Vähäjoen sillalla
- Vähäjoen sillan muotin purkutyöt radan kohdalla
- Ala-Okeroisten kiertoliittymässä kiveystyöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Takamaan alikukukäytävä valettu.



VIIKON ONNISTUMISET:
Hankeosan kaikki valtatie 12 suuntaiset sillat on valettu.

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla oltiin mukana Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen asukastilaisuudessa kertomassa VALTARin osuuden rakennustöiden etenemisestä. Nikulan eritasoliittymässä valmistui Nikulan risteyssillan paalutuspedit ja paalutustyöt päästiin aloittamaan. Siltojen paalutustyöt Nikulassa kestävät vielä noin kolmen viikon ajan. Nikulan ramppi-sillalla jatkettiin työsilan rakentamista ja Ali-Juhakkalan sillalla päätytyttöjen tekoa. Pohjavedensuojaustyöt ovat jatkuneet Patomäessä sekä Launeella. Patomäen tunnelissa on tehty holvivaluja ja kannen vesieristys on ollut käynnissä. Kujalan eritasoliittymässä on rakennettu valaistusta, asfaltoitu katua ja rampeja sekä tehty kiveystöitä läntisessä pisaraliittymässä. Valtatie 4 varrella on ollut käynnissä louheen lastaus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla siltatöiden vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt ja työsilan teko jatkuu
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
- Kujalan risteyssillan kannen valu
- Louheen lastaus valtatie 4 varrella

Siltatyöt käynnissä Nikulan eritasoliittymässä.



VIIKON ONNISTUMISET:
Nikulan risteyssillan paalutuspedien valmistuminen.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tienkäyttäjää häirinneitä liikennejärjestelyjä on pyritty vähentämään tälläkin viikolla. Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Päälylystystöitä tehtiin Orimattilankadulla ja jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Hankaankatu on valmistumassa, kadun avaus odottaa yläpuolisen risteyssillan reunapalkin pinnoitustyön valmistumista.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ABC:n risteuksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
- Jalankulun ja pyöräilyn väylä suljettu välillä Ajokatu-Aukeankatu, kiertoreitti joko Ajokadun tai Luhdantaustankadun kautta
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Kuivatuksen rakentamista mm. Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla
- Risteysalueiden päälylystystöitä
- Jalankulun ja pyöräilyn väylien viimeistelyä
- Kiveystöitä
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus ja reunapalkin pinnoitus



Vartio-ojan Paskurinojaan yhdistävä Venetsian putkisilta

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
