
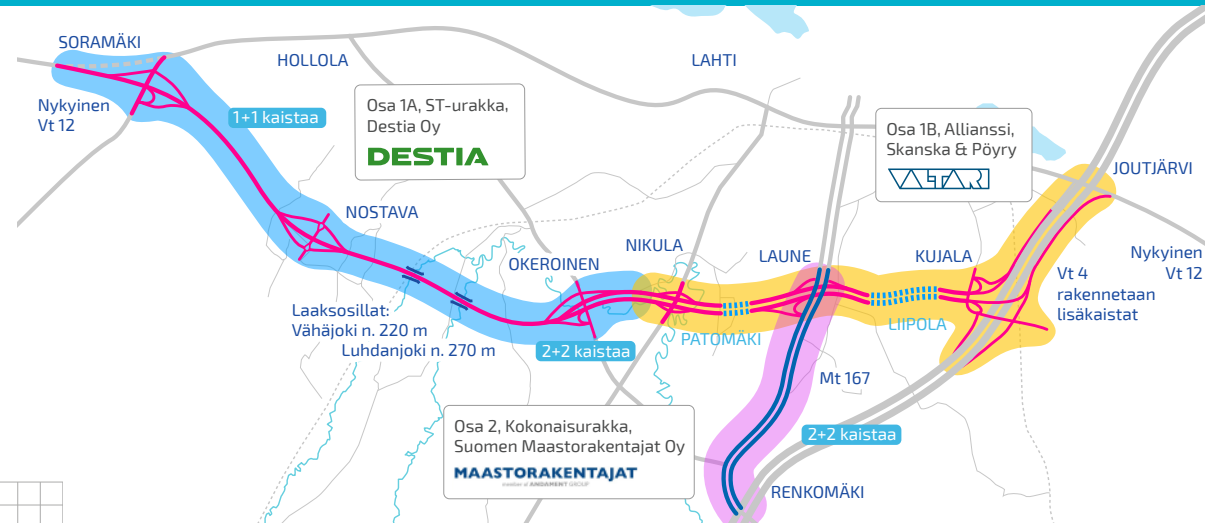


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Syksy on saapunut ja työt etenevät hyvää tahtia
2. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla
3. Patomäen tunnelin valut sujuvat aikataulussa

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

59 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina, kansia kuivatetaan ja eristetään. Luhdanjoen sillan muotin purkutyöt ovat jatkuneet Nostavantien kohdalla. Töistä johtuen liikennettä on pysäytetty ja toinen ajokaista on suljettu. Kiveystöitä tehdään uudella rakennettavalla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä, lisäksi melusteita on asennettu. Riista-aidan asennustyöt ovat jatkuneet työmaalla hyvällä tahdilla, työt ovat alkaneet Soramäestä ja etenevät kohti Okeroista.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Luhdanjoen sillan muottia puretaan, josta aiheutuu liikennejärjestelyjä Nostavantiellä, toinen ajokaista on suljettu ja liikennettä pysäytetään ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Ala-Okeroistentiellä kiertotiejärjestelyjä
- Paassillantiellä (Riihimäentien liittymässä) käynnissä keskisaarekkeen muutostyöt
- Soramäessä Riihimäentien vierellä kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen
- Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
- Louhintaa Takamaalla
- Kiveystöitä Okeroisissa
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus. Nikulan ramppisillalla on tehty telineen muottitöitä ja käynnissä on ollut myös paalujen katkaisu ja raudoitus. Patomäessä jatkuvat pohjavedensuojaustyöt sekä telematiikkaputkituksien ja hulevesilinjan teko. Patomäen tunnelilla on muun muassa valettu siipimuureja ja holveja. Launeella on jatkettu kasvualustan seulontaa sekä tehty maaleikkauksia ja louherakenteita. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla on rakennettu seiniä ja holveja. Läntisessä kalliotunnelissa on asennettu reunaelementtejä ja tehty verhousrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on tehty louherakenteita ja luiskien viimeistelyä sekä rakennettu telematiikkaa ja valaistusta. Kujalan risteyssillalla aloitettiin muotin purku.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla siltatöiden vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutus- ja rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja mullan seulonta
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
- Louheen lastaus valtatie 4 varrella

Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla.



VIIKON ONNISTUMISET:

Riista-aidan asennustyöt etenevät hyvällä tahdilla.

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen valut sujuvat aikataulussa.

Valut etenevät Patomäen tunnelilla.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työt Hankaankadun risteyssillan vesieristeiden korjauksen parissa jatkuivat tälläkin viikolla. Kyseisen sillan alittavan Hankaankadun avaaminen liikenteelle lähenee päivä päivältä, kun kuluneella viikolla tehtiin kadun ajoratamaalaukset. Uudenmaankadulta poistui viikon mittaan päällystekynnyksiä, kun liittyisiin päällystettiin uusia pintoja Patometsänkadun, Ajokadun ja Uuden Orimattilantien -liittymissä. Aukeankadun alikulkukäytävän läheisyydessä jatkettiin hulevesitöitä edellisviikon tapaan.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankatu avataan yleiselle liikenteelle
- Jalankulun ja pyöräilyn yhteys avataan takaisin liikenteelle välillä Aukeankatu-Ajokatu
- Hankaankadun risteyssillan kannen vesieristyksen korjaus valmistuu ja liikennejärjestelyt ko. työhön liittyen puretaan viikon mittaan
- Hulevesitöitä jatketaan Aukeankadun alikulkusillan läheisyydessä
- Viimeistelytöitä ja siivousta koko urakka-alueella

VIIKON ONNISTUMISET:

Liittyisiin saatiin uutta päällystettä useassa kohtaa rakennettavaa osuutta.

Hulevesiviemärin päähän rakennettua eroosiosuojausta.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
