


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Patomäen tunnelilla läntisen suuaukon otsapalkki on saatu valettua onnistuneesti
2. Lintulantiellä jatketaan sillan paalutusta
3. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut kuudes työtaturma, jonka seurauksena työntekijä loukkaantui alaraajaan.



## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

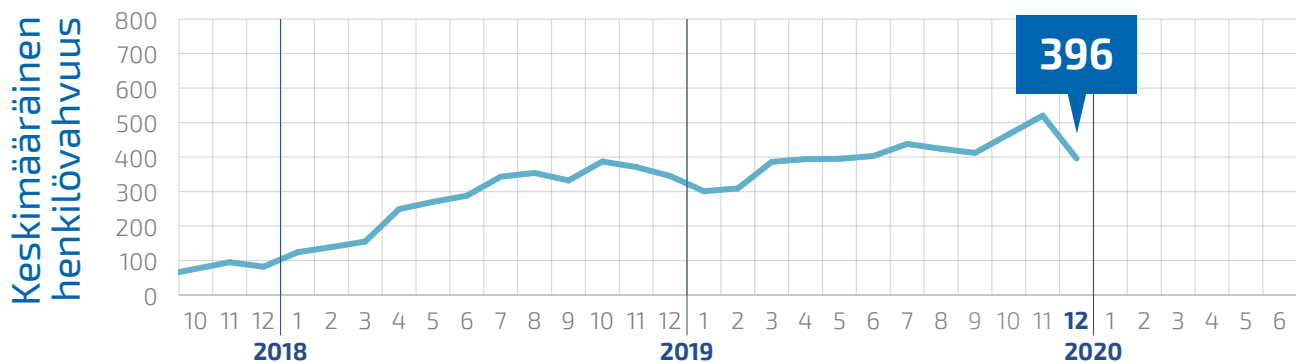

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, joulukuu: 3,5\*

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.



tapaturmatonta päivää  
(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



## Tilannekatsaus

Patiokallion risteyssillan telinetyöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteyssillan paalutustyöt jatkuvat ja ne saadaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Lintulantiehen liittyvän yksityistien uudelleen linjaus on käynnissä. Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen ja telematiikan putkityöt.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu
- Lintulantiehen liittyvän yksityistien rakentaminen
- Patiokallion risteyssillan telinetyöt
- Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt




Kuvassa portaalin jalustat odottavat vielä paikalleen asennusta.

### VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki hankeosan portaalin jalustat on asennettu.

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

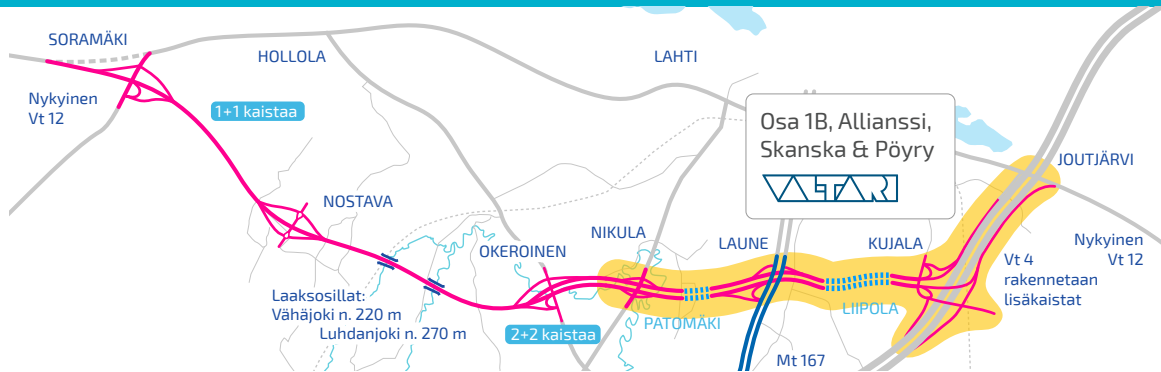

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäen tunnelilla on onnistuneesti saatu valettua läntisen suuaukon otsapalkki. Tunnelissa on jatkettu pohjaveden suojausta sekä palolevyjen asennusta ja tunnelin ulkopuolella salaojien ja täyttöjen tekoa. Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin maaleikkauksia. Kukonkosken sillan A-kannella on käynnissä raudoitustyöt ja B-kannella muotin purku. Nikulan risteyssillalla on tehty teline- ja muottitöitä. Launeella ovat jatkuneet luiskien täyttöjen teko sekä liikenteenohjauksen jalustojen asennustyöt. Liipolan tunnelissa käynnissä ovat yhdyskäytävien rakentaminen ja tekniikan asentaminen. Välitunnelin kohdalla rakennetaan kallioliittymiä ja kaulusrakennetta ja läntisellä suuaukolla on ollut käynnissä seinien, holvien ja kauluksen valutyöt.


## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys valtatie 4 yli
- Erikoiskuljetusten reitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen



Patomäen läntisen otsapalkin valu valmistuu.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Patomäen läntisen otsapalkin valu!

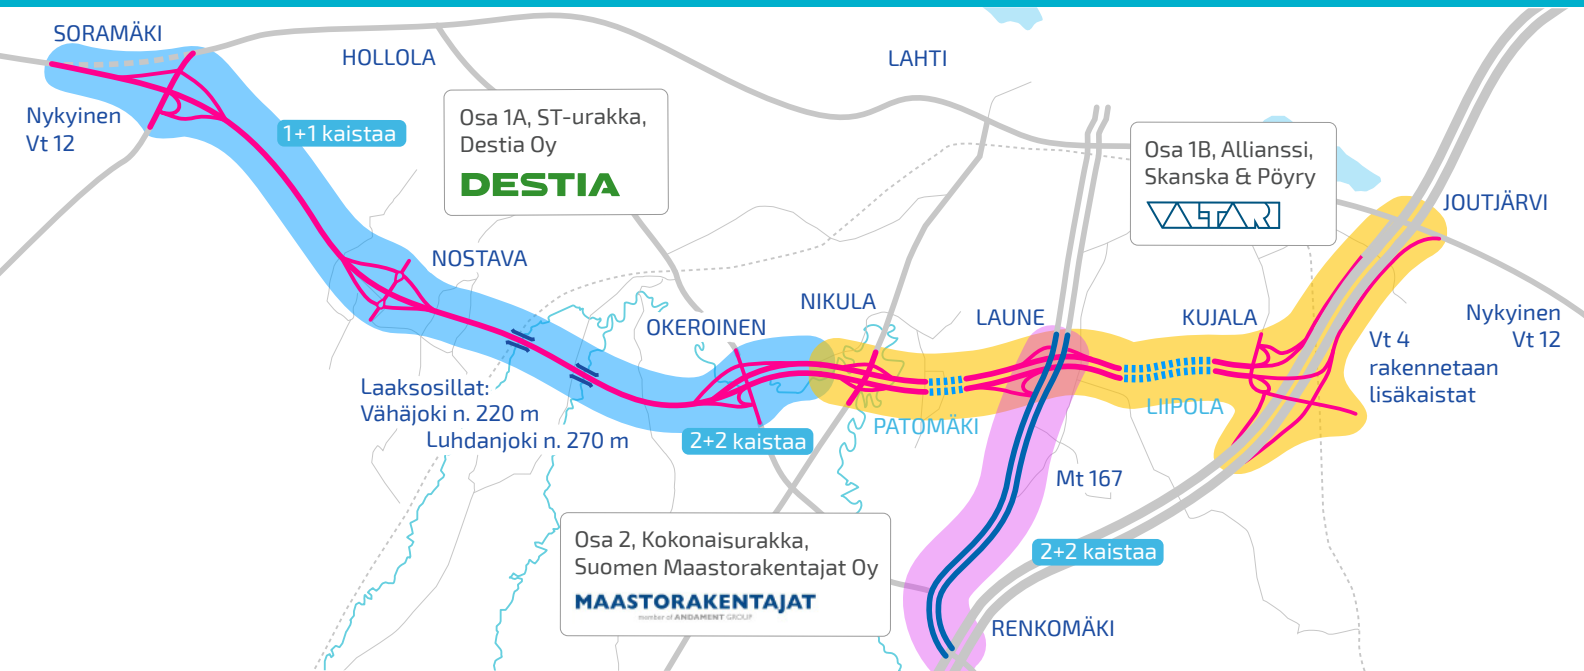

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keuhällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keuhällä 2018.

### Lisätiedot

#### Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä  
 puh. 029 534 3600  
 janne.wikstrom@vayla.fi

#### Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä  
 puh. 029 534 3563  
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](http://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)
