



Kupittaa-Turku-ratahanke raportit

Kupittaa-Turku-ratahanke raportit

Yhteenveto

Esteloki

Riski

TTT & MVR

Kustannukset

Kustannukset tilaajittain

Tilausrivit

Toteutunut laskutus/kk

Aikataulut ja työmäärät

Aikataulut Gantt

Tehtäväaikataulu

Kustannukset aikatauluista

Kum. kustannukset aikataului...

Project Online

Lieviä työtapaturmia	Vakavia työtapaturmia	TTT	MVR	Maastotyötunnit	Aikataulujen tuntimäärä	Aikataulujen valmiusaste
0	0	0	97	8459	99.69K	48.26 (0.00 to 100.00)

Riskimatriisi

Vaikutus	Ei seurauksia	Lieviä tai vähäisiä	Vakavia tai merkittäviä	Suuria	Erittäin suuria
Todennäköisyys					
Erittäin yleinen			2		
Yleinen		2	5	6	
Satunnainen		8	9	2	
Harvinainen		1	13	6	
Erittäin harvinainen			1		

Esteitä


Tilassa	Myöhässä	Havaittu	Kesken	Korjattu
Tekniikkalaji				
GEO				1
Muut			1	5
Rata				6
Taitorakenne				1
Turvalaite				5

Aikataulujen kustannukset toimeksiantotyypeittäin

Toimeksiannon tyyppi	Ennuste	Ansaittu	Toteutunut	%Valmis
Rakentaminen				43.80
Suunnittelu				27.75
Yhteensä				36.67

Aikataulujen työtuntien määrä

Suunnittelu	70.27K
Rakentaminen	29.42K

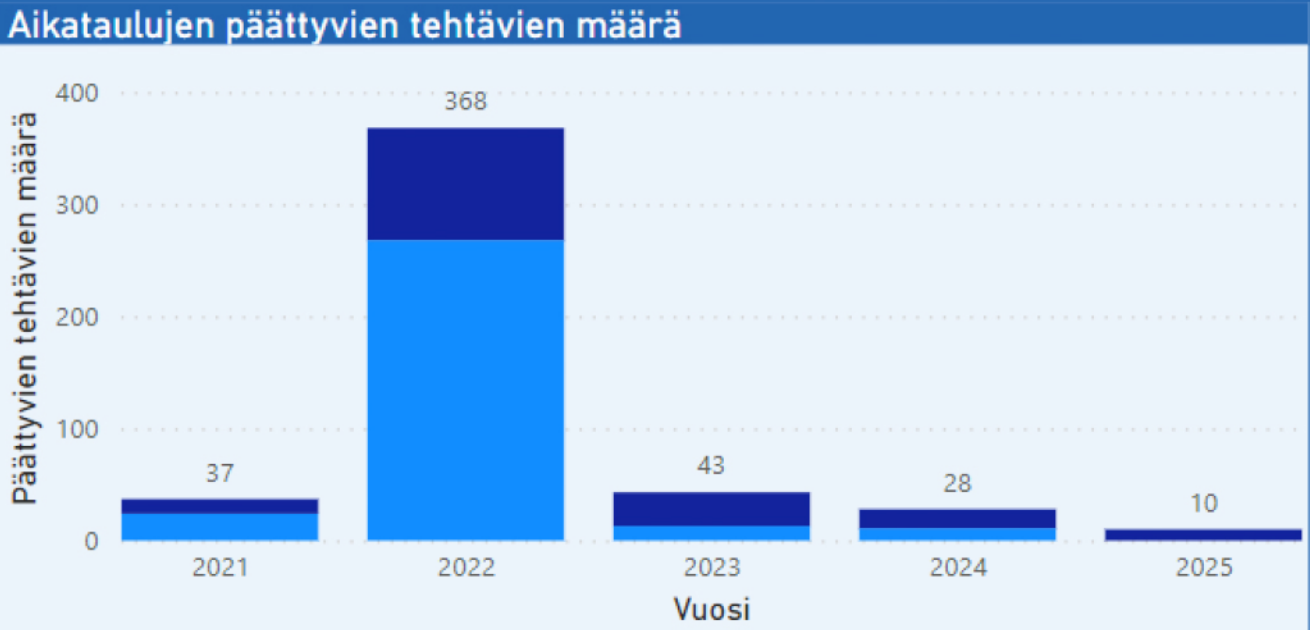

Kustannukset tilaajittain

Tilaaja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Yhteensä
Turku							
Ennuste							
Sidottu							
Toteuma							
VR							
Ennuste							
Sidottu							
Toteuma							
Väylä							
Ennuste							
Sidottu							
Toteuma							
