

Espoon kaupunkirata, AU3 Koivuhovi–Espoon keskus

Urakoitsija: Destia Oy

12.3.2023



Vöylävirasto
Trafikledsverket



ESKA AU3 LYHYESTI

- **Koko nimi** Espoon kaupunkirata, alueurakka 3
 - **Asiakas** Väylävirasto
 - **Urakoitsija** Destia Oy
 - **Aikataulu** 3/2024 – 8/2027
 - **Sopimussumma** noin 80 M€
 - **Sopimusmalli** Kokonaisurakka
 - **Sijainti** Koivuhovi–Espoon keskus
-
- Urakassa rakennetaan 4,5 kilometriä uutta kaksoisraidetta, sekä korjataan 4,5 km olemassa olevaa kaksoisraidetta, korjataan ja rakennetaan yhteensä yhdeksän siltaa. Hankkeen yhteydessä kehitetään myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä alueella, sekä rakennetaan melusuojuuksia.
 - Hanke tukee kestävien liikkumismuotojen käytön lisääntymistä pääkaupunkiseudulla.



RATAKATKOT



Väylävirasto
Trafikledsverket


Kevään katkot:

Su 4.5. 04:00 – ma 5.5. 04:00 SU 18.5. 04:00 – ma 19.5. 04:00

Su 25.5. 04:00 – ma 26.5. 04:00 To 29.5. 04:00 pe 30.5. 04:00

Kesäkatko:

Ma 23.6. 02:00 – Ma 28.7. 04:00

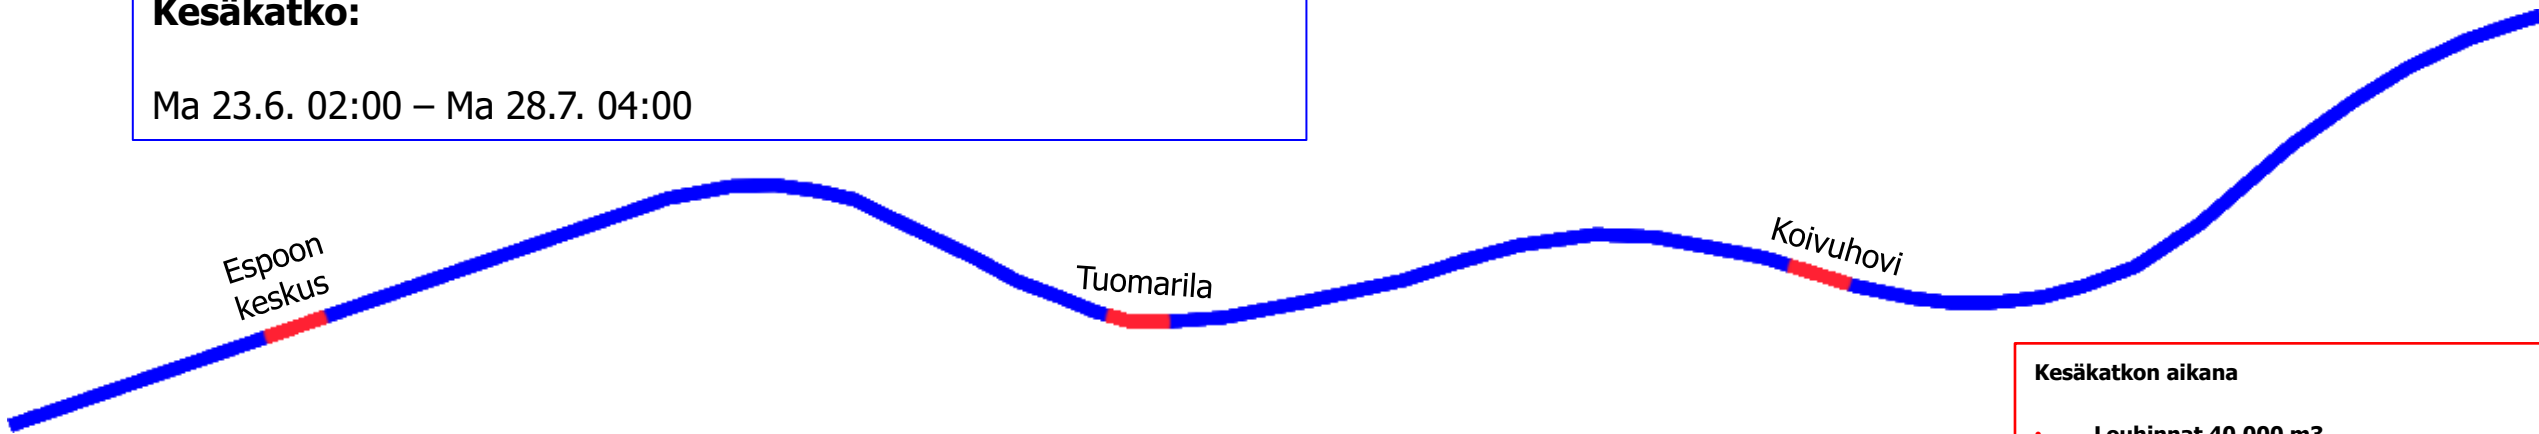

Kesäkatkon aikana

- Louhinnat 40 000 m³
- Paalutus 44 000 m
- Maanajoa 80 000 m³
- Ratarakenteiden maa-aines 100 000 tn
- Raidesepeli 25 000 tn
- Sähköratapylväät 40 kpl
- Purettavaa raidetta 5 km

SYKSYN RATAKATKOT

Su 31.8. 04:00 – Ma 1.9. 04:00 24h

La 6.9. 04:00 – Ma 8.9. 04:00 48h

La 13.9. 04:00 – Ma 15.9. 04:00 48h

Su 21.9. 04:00 – Ma 22.9. 04:00 24h

La 27.9 04:00 – Ma 29.9. 04:00 48h





Merkittävimvät työvaiheet kevät/kesä 2025

- Jalankulun ja pyöräilyn palautus Kaupunginkallion sillalle kevään 2025 aikana
- Louhintaa kesäkatkon aikana, arviolta 8 työvuorooa
- Ratarakenteet



**ESPOON VÄYLÄ-
ESPOON KESKUS 4.3.**

Kesäkatkossa

- louhinta ja murskaus
- paalulaatan paalutustyöt, jotka jatkuvat myös syksyllä.

Vilkas työmaaliikenne kesäkatkon aikana



KIRKKOJÄRVI 4.3.

- Kirkkojärventiensillan korjaus: silta suljetaan 1.5.–31.10.2025 väliseksi ajaksi.
- Tarkemmat yksityiskohdat tiedotetaan myöhemmin



KIRKKOJÄRVI 4.3.

Kesäkatkossa

- Kuvan kallioalueen louhinta loppuun kesäkatkon aikana



Kesäkatkossa

- Rata-alueen stabilointi
- Vilkas työmaaliikenne

Syksyllä

- Baanan rakentaminen
- Baana- ja ratasillan rakentaminen
- Aseman liityntäpysäköinnin stabilointi > liityntäpysäköinti pois käytöstä kesäkatkon alusta 2025–syksyyn 2026



- Louhintaa kevään ja kesän aikana, katkoissa ja niiden ulkopuolella.
- Asema-alueen rakentaminen



KOIVUHOVIN ASEMA 4.3.

Kesäatkossa

- Paalulaatan rakentaminen
- Kunnallistekniikka
- Louhintaa, työn kesto arviolta kaksi viikkoa
- Ratarakenteet



KOIVUHOVI 4.3.

Kesäkatkossa

- Alikulkusillan tunkkaus kesä 2025
- Paalulaatan rakentaminen

Muuta

- Palokunnankujan sulku maalis–toukokuu 2025 HSY:n paineviemärin ja vesijohdon rakentamisen vuoksi.
- Louhintaa kevään, kesän ja syksyn aikana tarvittaessa.





Väylävirasto
Trafikledsverket
